

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.: 84174
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: p-f-l@hotmail.com



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 5114253
Voorl. verslagnr.:
Datum: 22/02/2019

Klant / Opdrachtgever:
PFL
BLD SYLVAIN DUPUIS 213 BOITE 16
1070 ANDERLECHT

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: Aard installatie:: bestaande Type lokalen: woning
Plaats onderzoek: Huis T'KINTSTRAAT 80 OPWIJK 1745
Aard onderzoek: Kies een item. Volgens AREI Art.: 86/271/271bis
Datum onderzoek: 22/02/2019 Volgende binnen 300 maand of vóór 29/02/2044 Onderzoeker: DHALLUIN KEVIN
Eigendom van: Ciacimmo - Rimbart T'kintstraat 80 Opwijk 1745
Installateur: Pfl Bld Sylvain Dupuis 213 boite 16 Anderlecht 1070
B.T.W.: - ID-kaart: - Uitgereikt te: - Datum: -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - Teller nr.: 1258671 Stand I: 66472 kWh Stand II 38063 kWh
Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: Isolatieplaat:
Dienstspanning: 1 x 220V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut. 2p 40A Schak.: alg.diff.schak.
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: aantal geleiders: doorsnede: mm²
Aardelektrode: type: baren sectie: 16 mm² spreidingswaarde: 22 Ohm
Diff. schak.: algemene: 4p 40A/300mA is verzegeld met loodje: nvt bijkomende diff.: 4p 40A/300mA
Werking testknop: in orde Controle foutlus: in orde Algemene isolatieweerstand: 35 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde
Beschrijving installatie - toestellen: ☐ zie schema in bijlage ☐ ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ verlichting ☐
☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 16
6 x Aut 2p 16A 8 x Aut 2p 20A 2 x Aut 2p 32A

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken


N Bij een keuring "verkoop wooneenheid" volgens AREI art. 276 bis dienen verkoper en koper verplichtingen na te komen. Lees meer hierover via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2018/Informatienota_overdracht_eigendom.pdf

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd **uiterlijk op hoger vermelde datum**, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,


D. Halluin
De Agent-onderzoeker

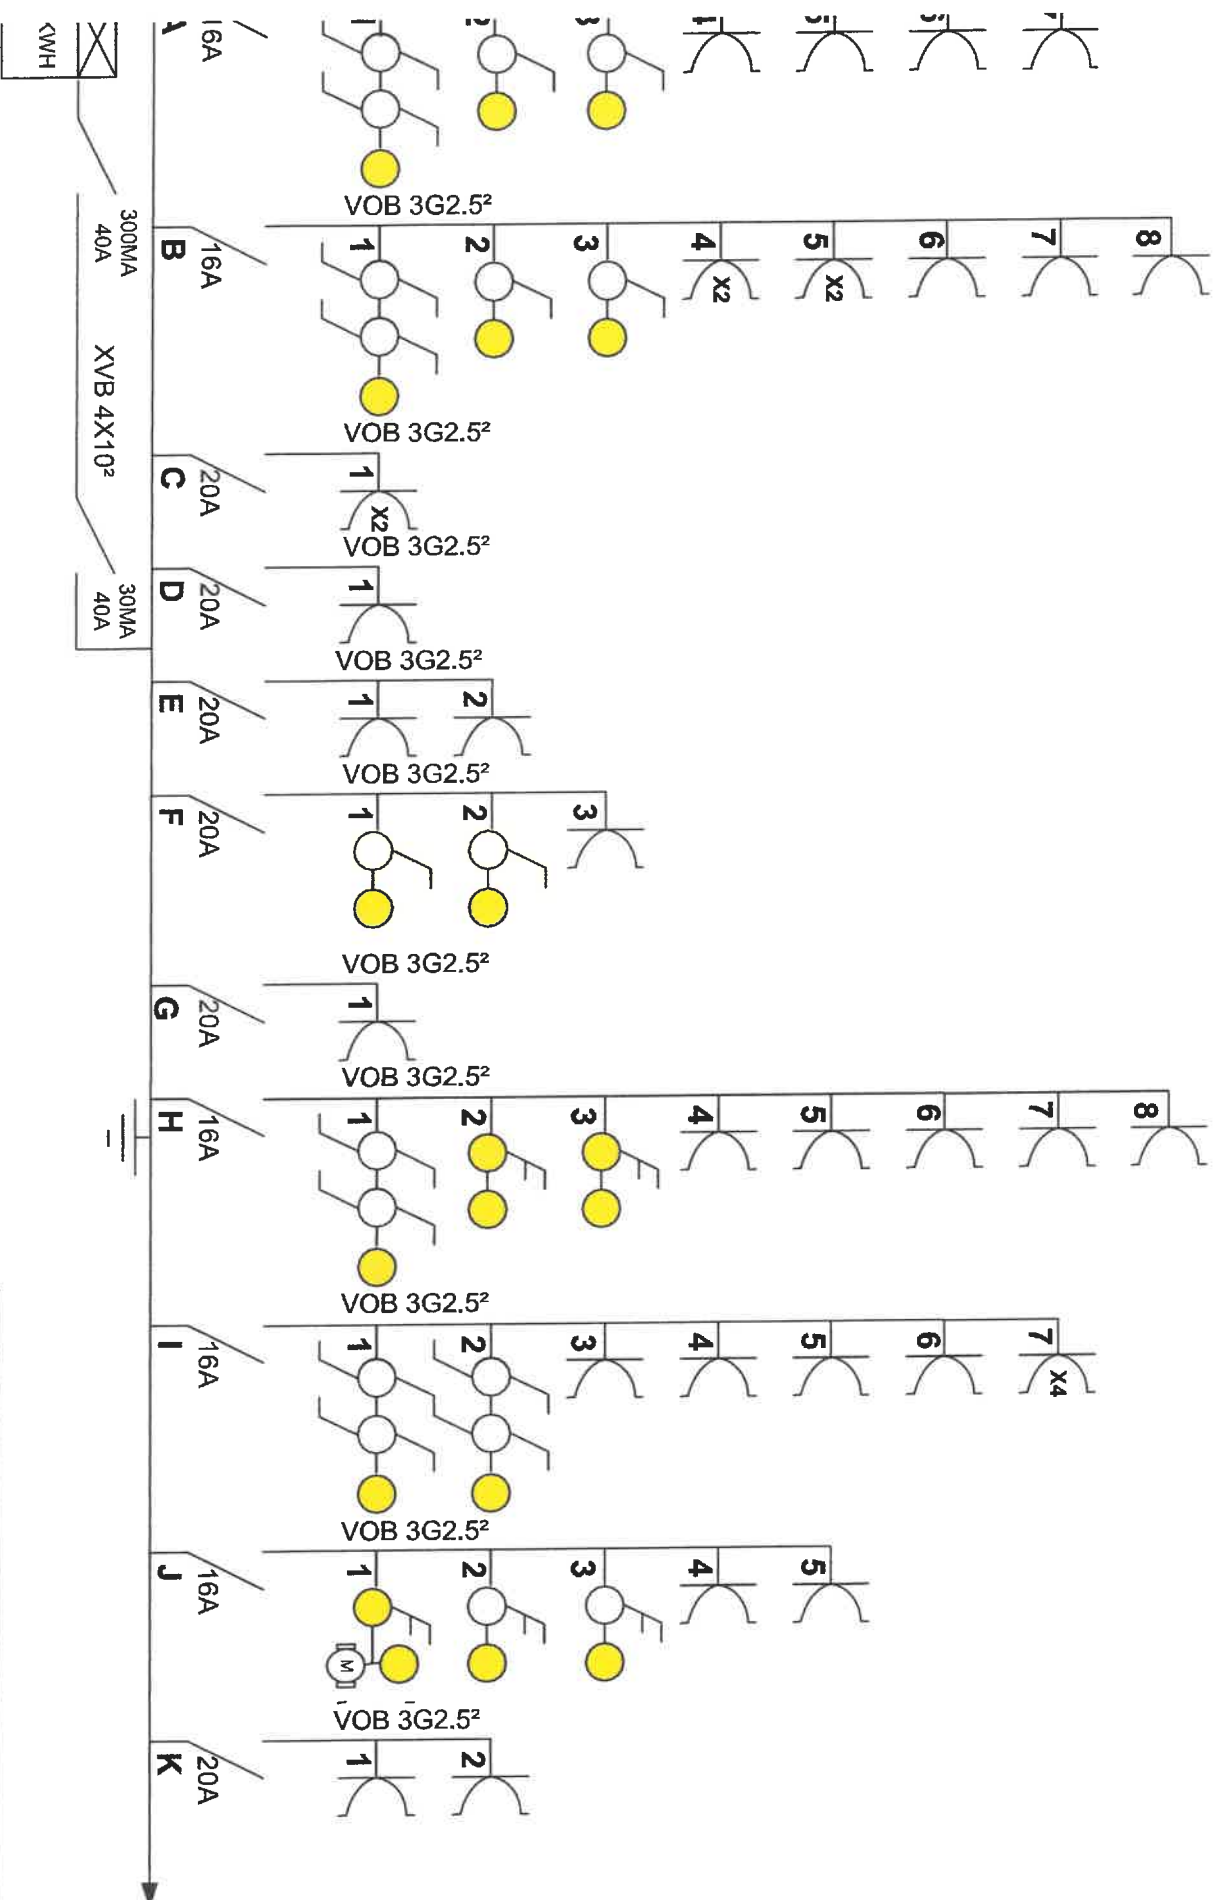

CIANCIMINO - RIMBERT
T'KINTSTRAAT 80
1745 OPWIJK



P.F.L. SPRL
ELECTRICITE GENERAL
-INSTALLATION ELECTRIQUE
-DEPANNAGE RAPIDE
-ENTRETIEN BATIMENT
-PARLOPHONE-VIDEOPHONIE
asm : 0479/ 61-66-00

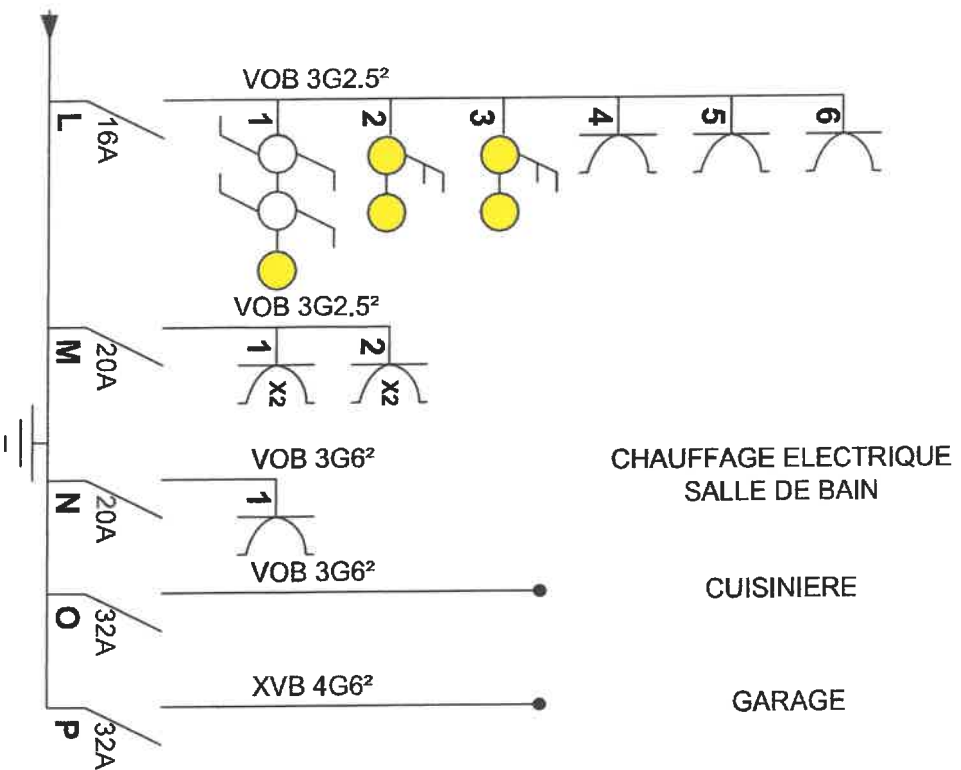

CIANCIMINO - RIMBERT
T'KINTSTRAAT 80
1745 OPWIJK

P.F.L SPRL
ELECTRICITE GENERAL
-INSTALLATION ELECTRIQUE
-DEPANNAGE RAPIDE
-ENTRETIEN BATIMENT
-PARLOPHONE-VIDEOPHONE
asm : 0479/ 61-66-00



P.F.L. SPRL
ELECTRICITE GENERAL
-INSTALLATION ELECTRIQUE
-DEPANNAGE RAPIDE
-ENTRETIEN BATIMENT
-PARLOPHONIE-VIDEOPHONIE
gsm : 0479/ 61-66-00

CIANCIMINO - RIMBERT
T'KINTSTRAAT 80
1745 OPWIJK

ETAGE 1

