

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.:
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: 0485 51 15 53
e-mail: jessie.foubert1980@gmail.com



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

ProKo.: LS13
Verslagnr.: 4858955
Voorl. verslagnr.:
Datum: 17/05/2017

Klant / Opdrachtgever:
FOUBERT JESSIE
Rozenlaan 24 bus 2
2630 AARTSELAAR

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: Aard installatie:: verkoop wooneenheid Type lokalen: appartement
Plaats onderzoek: ROZENLAAN 24 BUS 2 AARTSELAAR 2630
Aard onderzoek: controlebezoek Volgens AREI Art.: 86/276bis/278
Datum onderzoek: 17/05/2017 Volgende binnen 300 maand of vóór 31/05/2042 Onderzoeker: FITEN SVEN
Eigendom van: -
Installateur: -
B.T.W.: - ID-kaart: - Uitgereikt te: - Datum: -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - Teller nr.: - Stand I: - Stand II: -
Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: niet geplaatst Isolatieplaat: nvt
Dienstspanning: 3x400V+N Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: teco Schak.: aut.maatsch.
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 6 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 6 mm²
Aardelektrode: type: pennen sectie: 16 mm² spreidingswaarde: 6 Ohm
Diff. schak.: algemene: 4p 40A/300mA is verzegeld met loodje: nvt bijkomende dif.: 4p 40A/30mA
Werking testknop: in orde Controle foutlus: in orde Algemene isolatieweerstand: 84 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: nvt
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 2 Aantal eindstroombanen: 11

ZIE SCHEMA

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken


I GEEN

BESLUIT


De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd **uiterlijk op hoger vermelde datum**, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,


De Agent-onderzoeker

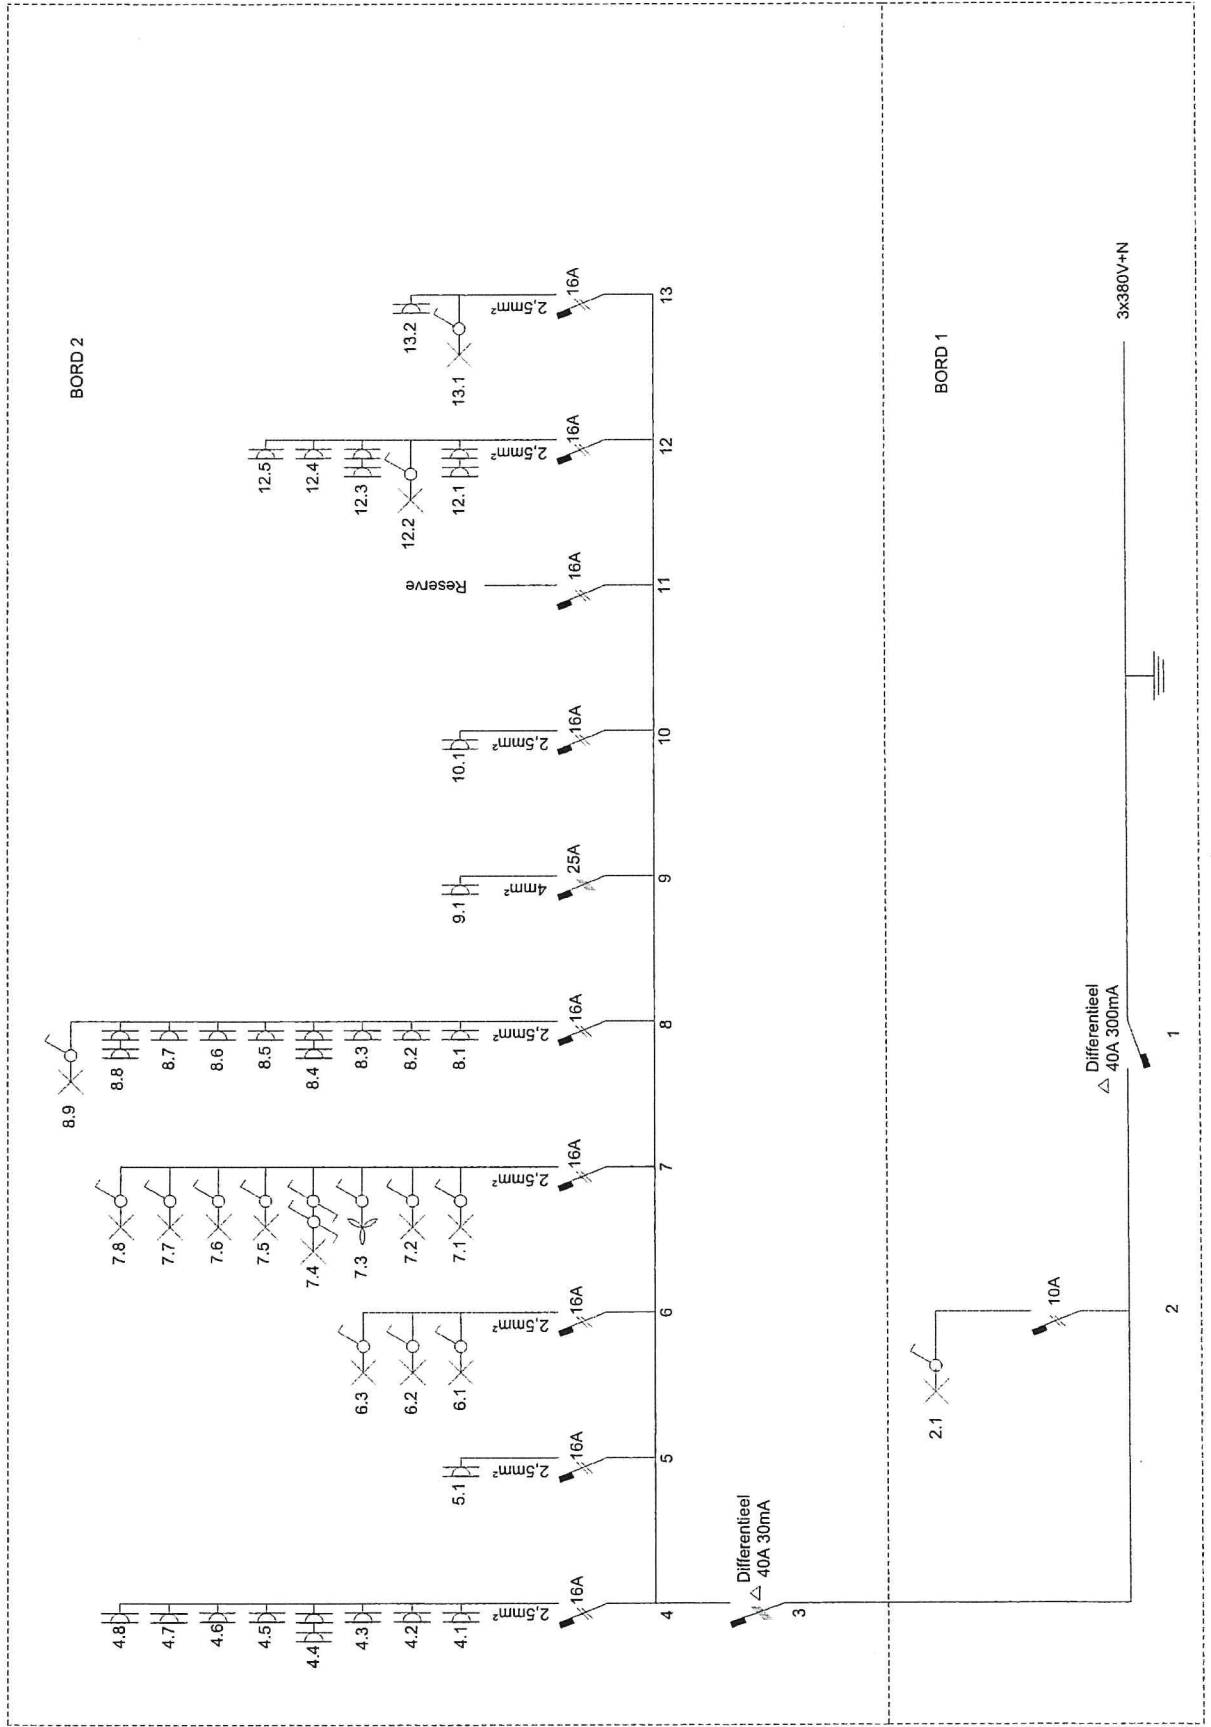

Situatietekening Rozenlaan 24, 2630 Aartselaar 1ste verdiep
 Electriciteitswerken Patrick Verbeeck
 Laarhofstraat 127, 2627 Schelle
 BTW: BE0871.746.324
 Tel: 0486/ 50 63 04

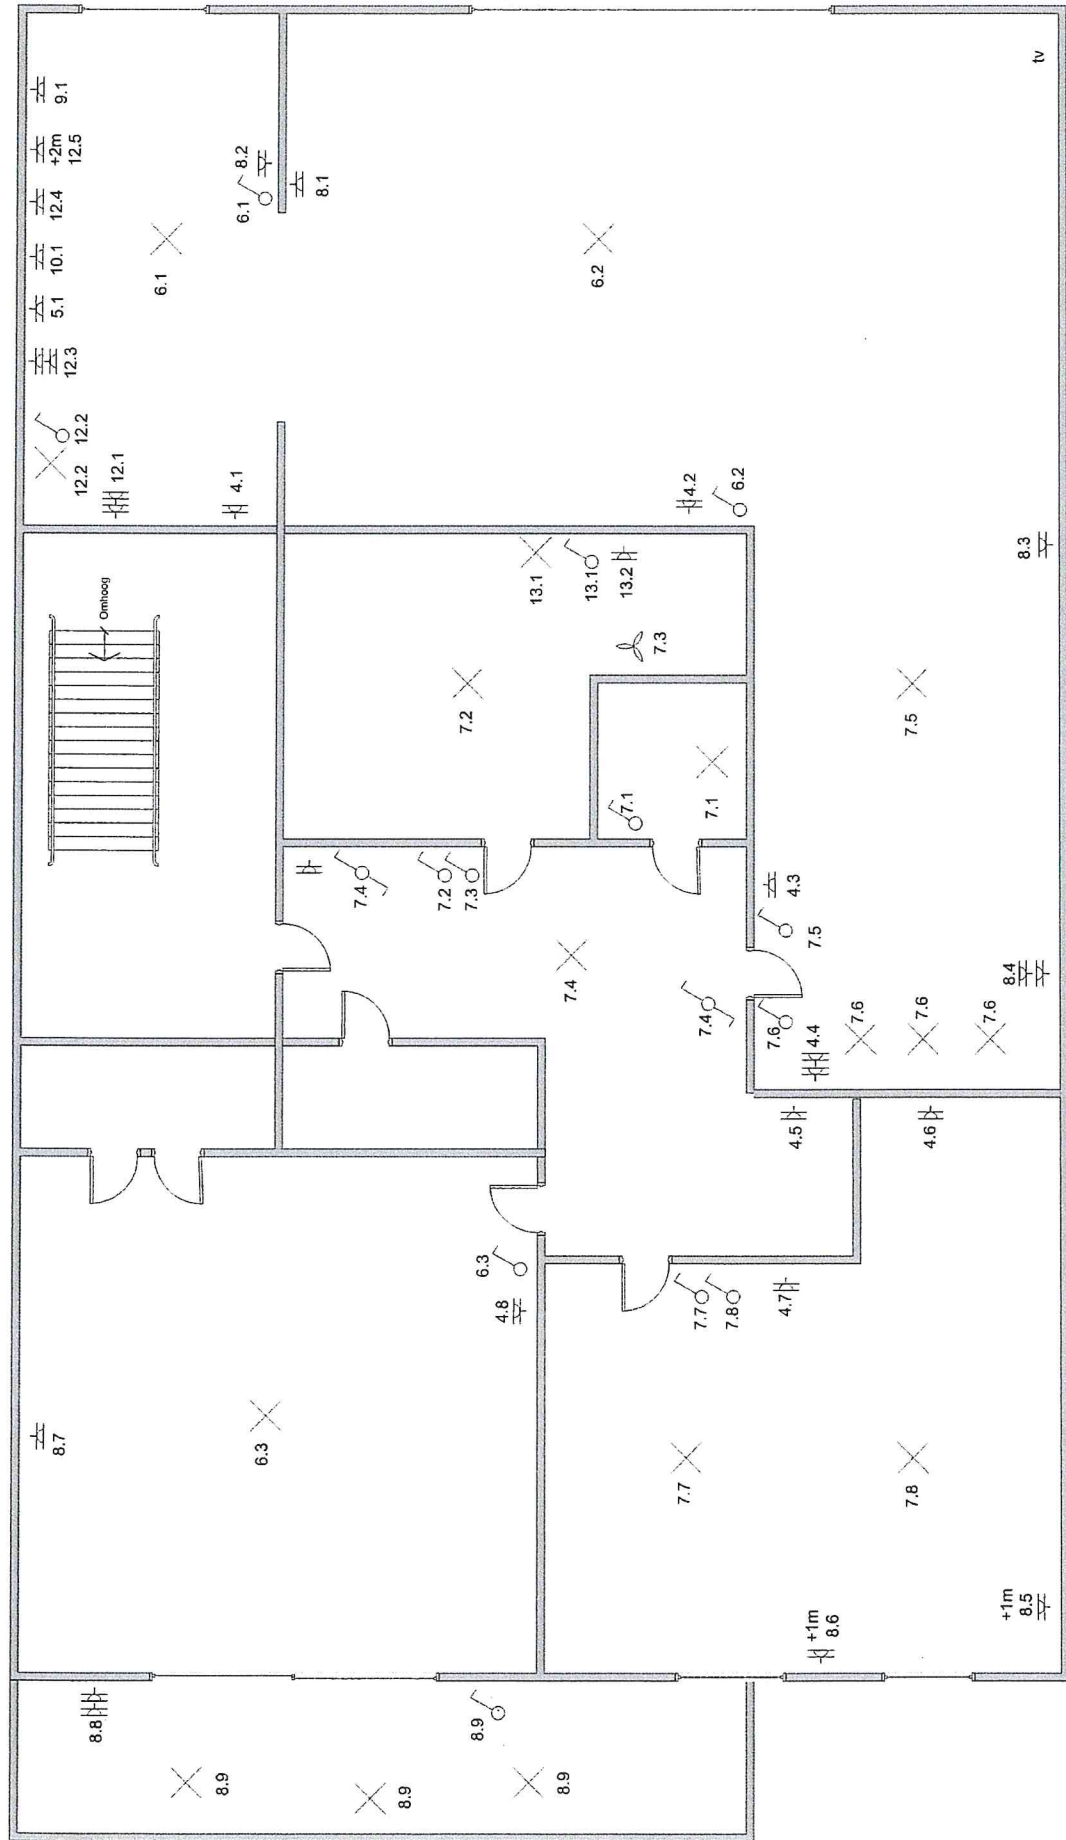

Eendraadsschema Rozenlaan 24, 2630 Aartselaar 1ste verdiep
 Electriciteitswerken Patrick Verbeeck
 Laarhoistraat 127, 2627 Schelle
 BTW: BE0871.746.324
 Tel: 0486/ 50 63 04

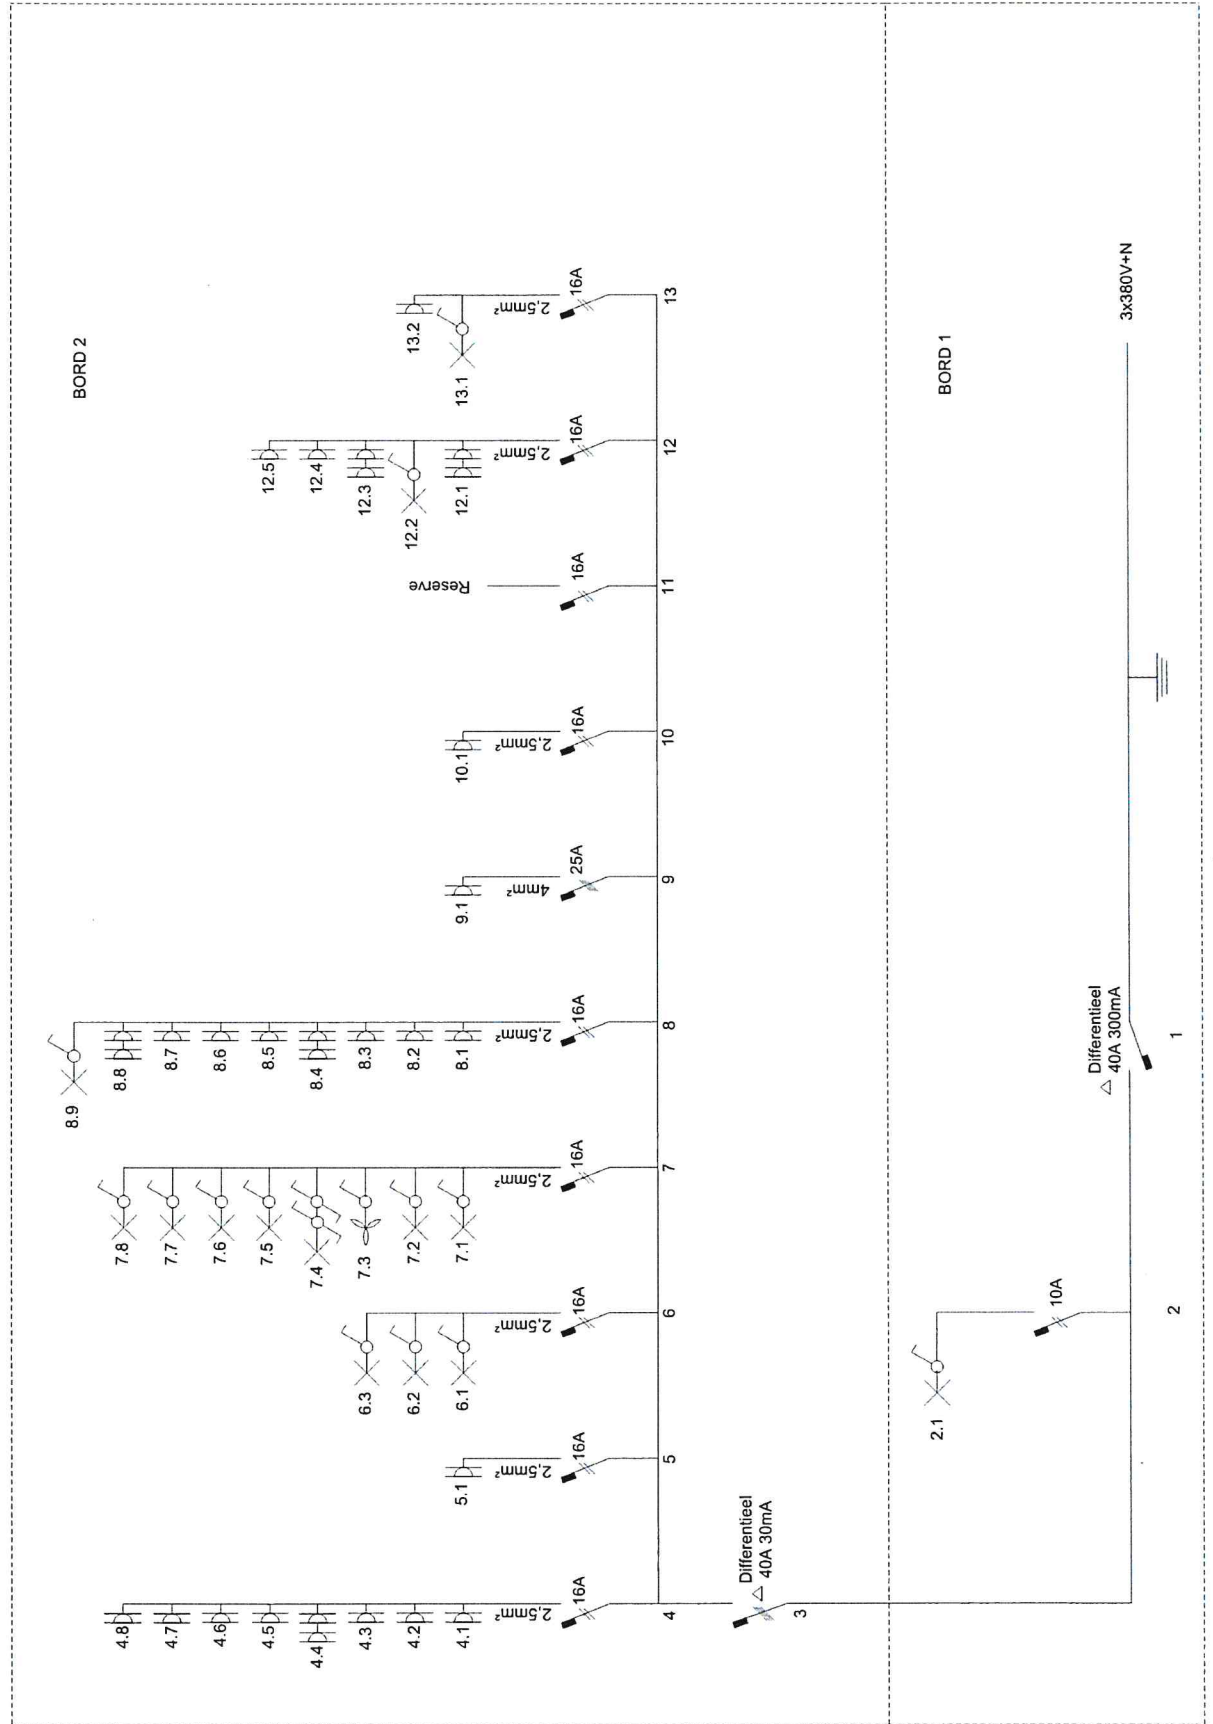

W: BE0871.746.324



[illegible]

Fiten Sven
GSM 0496/290 077
sven.fiten@ocb.be
www.ocb.be

iv
