

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 19/11/2018 Inspecteur: Yves Pelgrims Mentor: Installateur: Teodor Nistor
ID-label: B.T.W. nr.: BE 837 511 559 IK. nr.:
Merk en type meettoestel: Fluke 1653B Serie Nr.: 1779013

Plaats van het onderzoek:

Straatnaam Cruyslei
Huisnummer 33 2de
Postcode 2100
Gemeente Deurne
Type appartement

Eigenaar:

Naam Teodor Nistor
Straatnaam Cruyslei
Huisnummer 33
Postcode 2100
Gemeente Deurne

EAN : 54

Teller Nr.: -

Aard onderzoek:

Gelijkvormigheidsonderzoek van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens AREI artikels 270 en 86.

Netbeheerder: EANDIS Spanning: 1~230V Meter / bord verbinding: 10 mm² Max beveiliging: 40 A
Aantal borden: 1 Aantal kringen: 12 Isolatie: 62 MΩ
Aardelektrode: Horizontaal in de grond ingegraven metalen geleider(s) RE: 6.3 Ω

DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

I _Δ (mA)	I _n (A)	I _n - andere (A)	I _{Δt}	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22.5kA2s (3000A)	A	12		
30	40		22.5kA2s (3000A)	A	11		

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm ²)
zie schema					
Visueel nazicht (algemeen)	☒ OK ☐ NOK	Directe aanraking	☒ OK ☐ NOK	Indirecte aanraking	☒ OK ☐ NOK
Aansluitingen	☒ OK ☐ NOK	Correcte schema's	☒ OK ☐ NOK	schema in bijlage door Acag vzw	☒
Equipotentiale verbindingen	☒ OK ☐ NOK	niet van toepassing	☒ in afwachting		
Continuïteit	☒ OK ☐ NOK	Verlichting / toestellen	☒ OK ☐ NOK ☐ NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

O2 Geen inbreuken vastgesteld.

O12 De elektrische installatie staat niet onder spanning. De goede werking van de differentieels kon niet getest worden.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 19/11/2043
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.
- ☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.
- ☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 4

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Yves Pelgrims

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI

- Het verslag dient te worden opwaard in het dossier van de elektrische installatie
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Bij ongeval overkomen van personen en te wijten rechtsreeks of onrechtsreeks aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegeleed te worden aan de FOD economie, KMO, middenstand en Energie – Algemeen, directie energie, afdeling gas – elektriciteit

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie


www.aceg.be


02 / 880.88.90


BE06 7340 3288 4322 - BTW BE0839 866 481

Stappenplan voor een installatie die conform is

Step 1	Step 2	Step 3	Step 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele notities	Indien u belangrijke uitbreidingen doet aan uw installatie, laat opnieuw keuren	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 15/11/2043	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

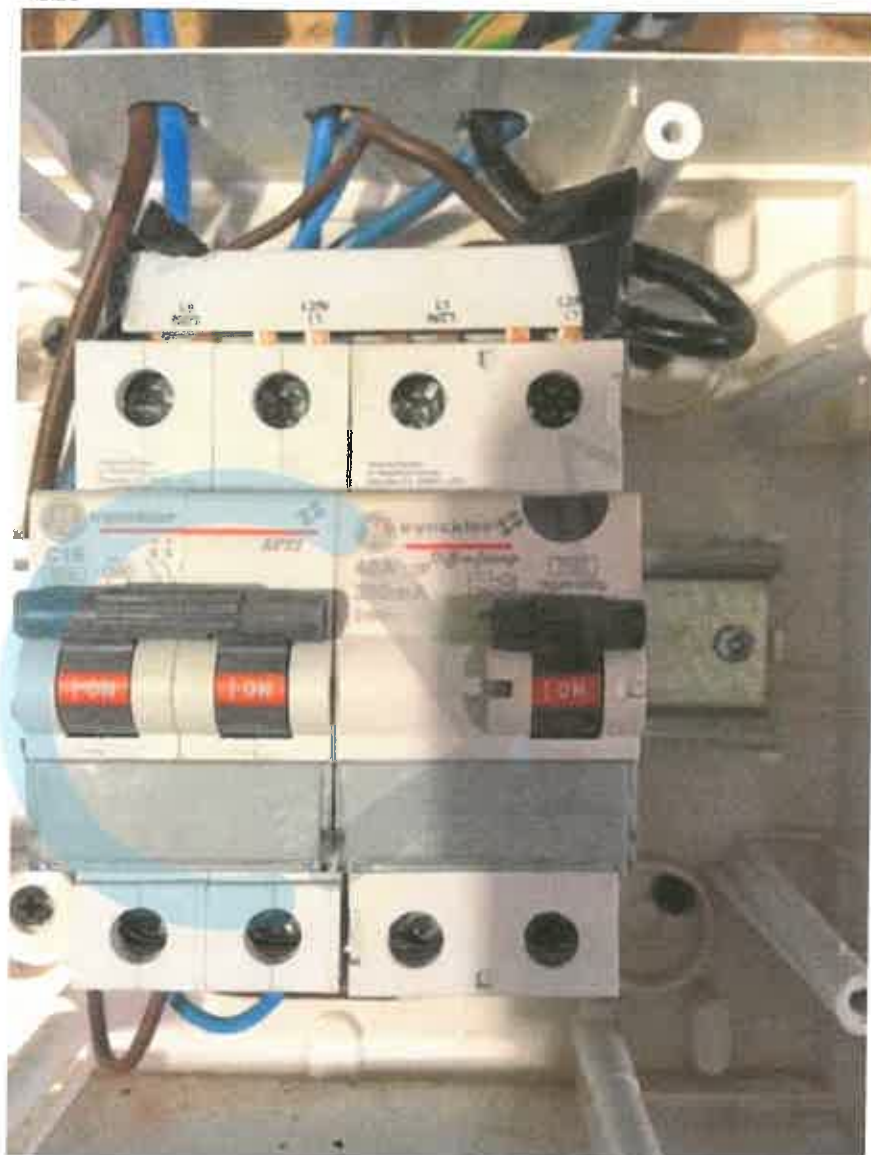

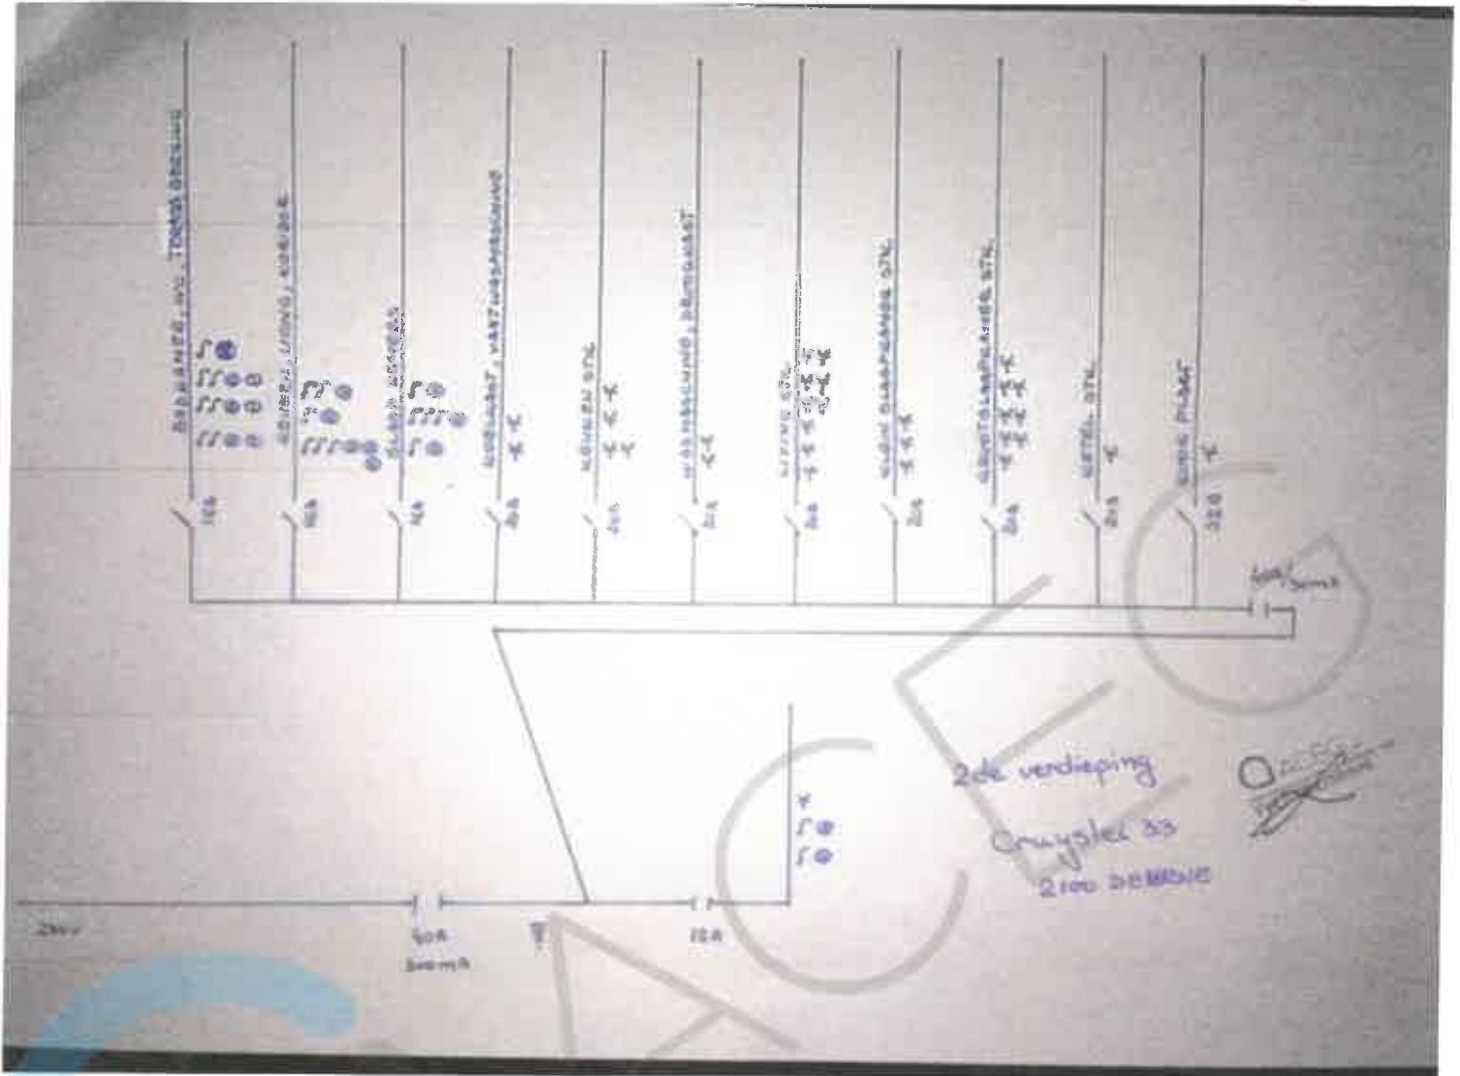

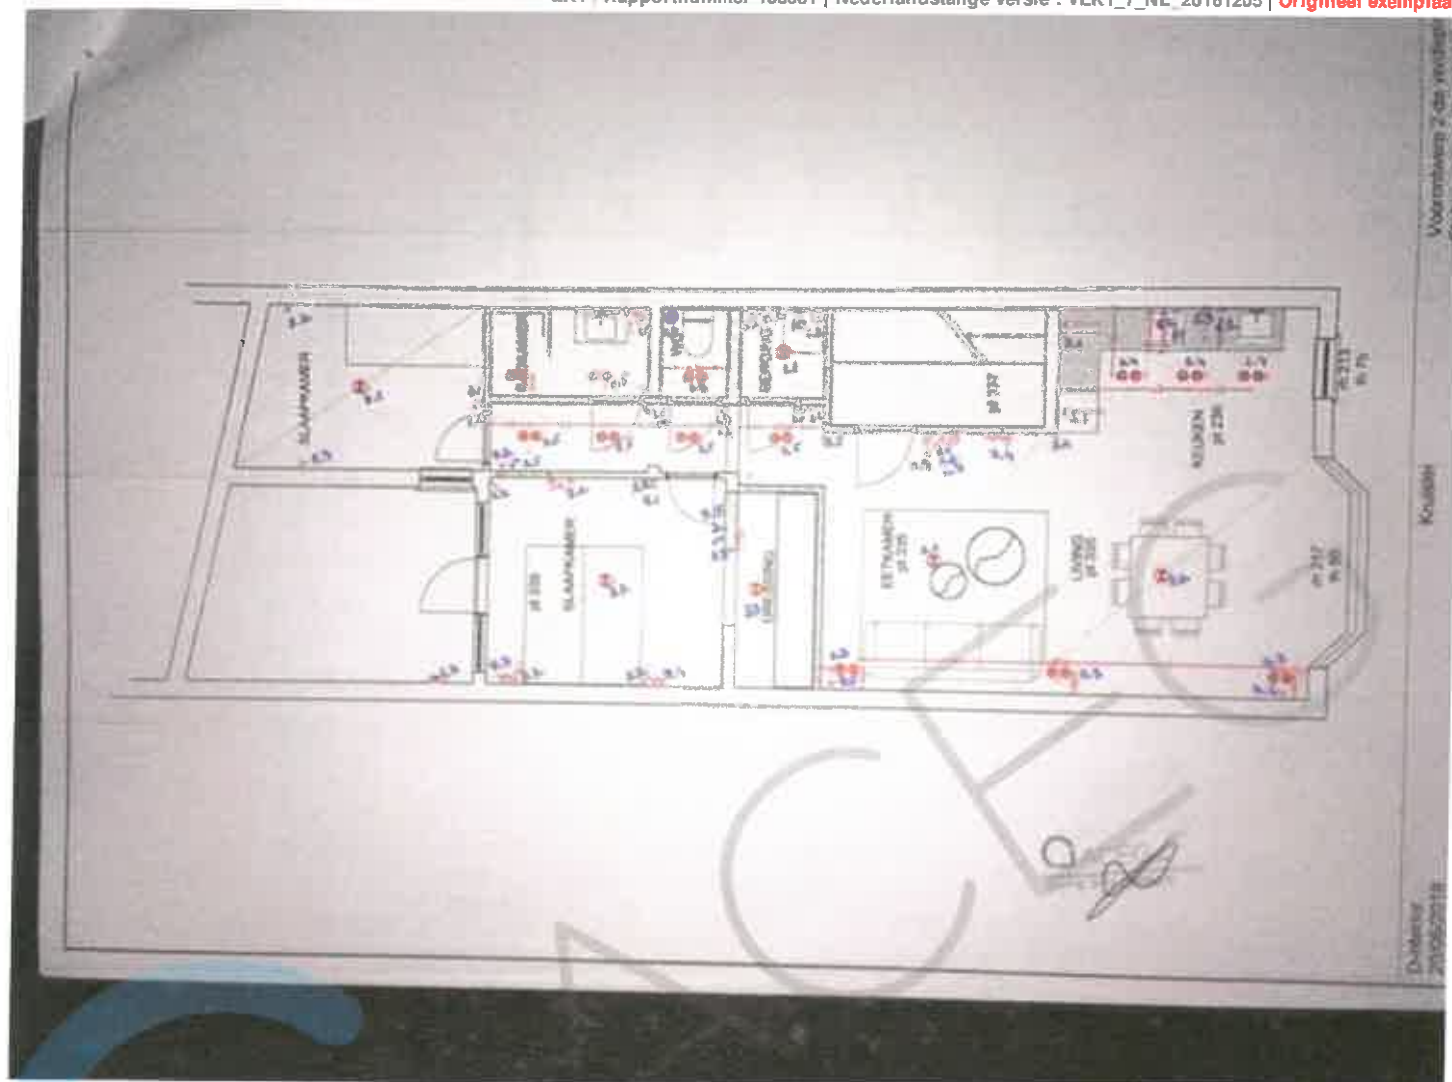

Cruyslei 33, 2100 Deurne
2de verdieping

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12

1. Badkamer, wc, knop 16 A
2. Keuken, living, koridon 16 A
3. Slaapkamers 16 A
4. Koelkast en vaatwasmachine stb. 20 A
5. Keuken stb. 20 A
6. Wasmachine en droogkast stb. 20 A
7. Living stb. 20 A
8. Klein slaapkamer stb. 20 A
9. Groot slaapkamer stb. 20 A
10. Ketel stb. 20 A
11. Kookplaat stb. 32 A
12. Differentieel 40A/ 30mA


17/03/2016
