

**VINÇOTTE vzw**Erkend Controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
BTW: BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Verslag nr.:

60798.357/16

- ☒ Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent
☐ Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde
☐ Noordersingel 23, 2140 Antwerpen
☐ Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux

Tel: +32 9 244 77 11
Tel: +32 2 674 57 11
Tel: +32 3 221 86 11
Tel: +32 81 432 611

gent@vincotte.be
brussels@vincotte.be
antwerpen@vincotte.be
gembloux@vincotte.be



N 312561

Resi code: 17

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken:

Installatie:

Eigenaar of beheerder:

Naam, voornaam: <u>de Groene Hand</u>	Naam, voornaam: <u>Mr. Alexandra</u>
Ident. Kaart nr.: <u>435.584339</u>	Adres: <u>L. I. Exploratie 5, 1904</u>
BTW nr.: BE <u>435.584339</u>	Post nr. + Stad: <u>8660 De Pann</u>
	Tel.: <u>1</u>

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

☐ Art 270	☐ ingebruikname	☐ wijziging	☐ uitbreiding	☒ Art 86	☒ Art 271 bis	☒ ① Woonenheid
☐ Art 271	☐ mobiel	☐ tijdelijk	☐ controle	☐ Art 87	☐ Art 278	☐ ② Huishoudelijke werkeenheid
☐ Art 276	☐ periodiek	☐ controle	☐ verkoop van een woonenheid	☐ Art 88	☐ Art	☐ ③ Gemeenschappelijke delen
☐ Art 276bis	☐ verzwaaring	☐ verkoop van een woonenheid	☐ Art	☐ Art	☐ Art	☐ ④ Werkeenheid

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdelers	EAN	☒ EAN niet meegedeeld	☐ kWh meter niet geplaatst
Gegevens installatie	kWh meter nr.: <u>04638697</u>	meterstand dag: nacht: Bescherming aansluiting (A): ☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☒ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100 ☐	
Beschrijving installatie	Ontworpen voor U _N : ☐ 230 V ☐ 3x230 V ☒ 3N400 V	Type aardelektrode: ☐ aardingslus ☐ pen / baar	
	Maximale nominale stroom (A): ☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☒ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100 ☐	☐	
	Voedingsleiding hoofdbord: <u>4</u> X <u>10</u> mm ² - Type: <u>X V0</u>		
	Algemene differentieelstroominrichting: <u>40 A / 300 mA</u>	Aantal borden: <u>2</u>	Aantal eindstroombanen: <u>5+4</u>
	<u>40 A / 300 mA (helder) teller 534909 (40A)</u>		

Metingen - testen - controles - verzegeling:

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	☐ Toestellen	☒ Materieel	☒ >/doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand: <u>4.7</u> Ω	☒ Algemeen isolatieniveau: <u>0.5</u> MΩ	☐ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☒ Test diff.		
Differentieelstroominrichting: ☒ was verzegeld ☐ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	☐ Nihil
Inbreuken Bestaande installatie	☐ Nihil
Opmerkingen	☐ Nihil

geen inbreuken vastgesteld

Visum DNB of aangestelde:

Besluit(en):

- ☐ De nieuwe installatie voldoet ☒ De bestaande installatie voldoet
- ☐ De nieuwe installatie voldoet niet ☒ De bestaande installatie voldoet niet
- aan het AREI. ☒ door hetzelfde erkend organisme (*).

Agent bezoeker:

Naam: Fom DelaureAgent nr.: 3955 Datum: 29.7.2019Bijlage(n): ☒ Situatieschema(s): 1☒ Eëndraadsschema(s): 2

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.


- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.

- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.

- Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

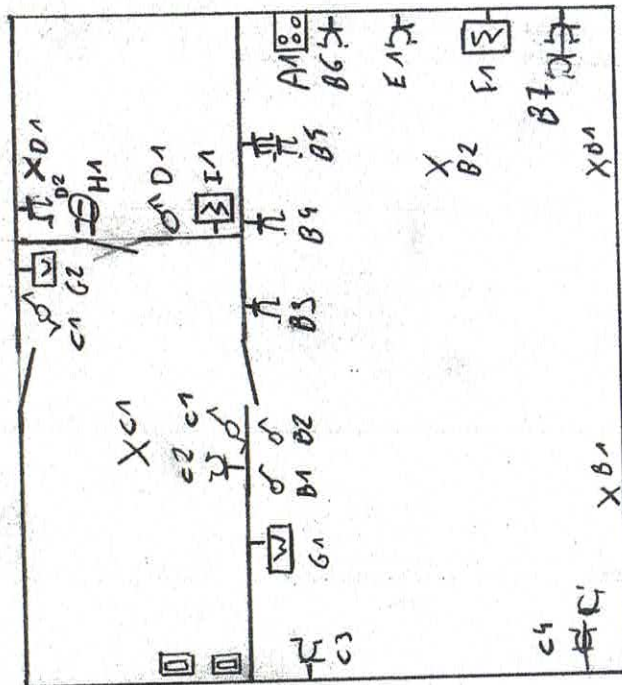

29/7/79




Plaats van de elektrische installatie

RES. ALEXANDRA APP. 0904
LEOPOLD 1 ESPLANADE 5
8660 DE PANNE

Installateur
Elektro Service De Groene Hond bvba
Kasteelstraat 62 - 64
8660 De Panne
Tel.: 058 41 58 66 GSM: 0475 718 253
e-mail: degroenehond@telenet.be
BTW BE 0435 584 339



p. 2/2
Situatieschema
3 x 400V + N ~ 50Hz

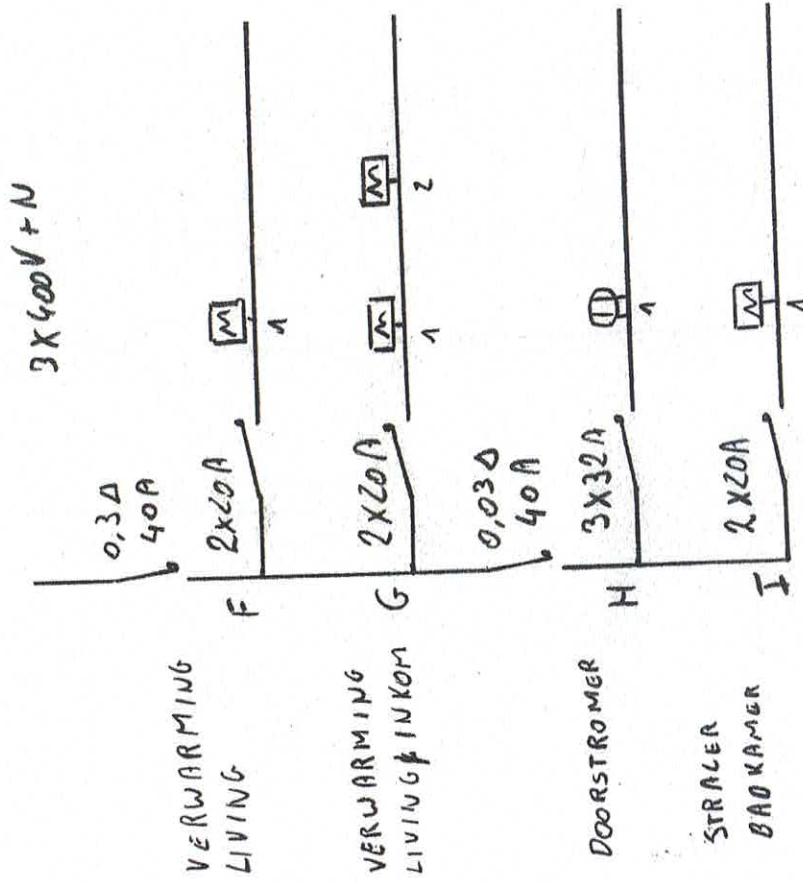

29/7/79



Plaats van de elektrische installatie


RES. ALEXANDRA APP. 0904
LEOPOLD 1 ESPLANADE 5
8660 DE PANNE

Installateur
Elektro Service De Groene Hond bvba
Kasteelstraat 62 - 64
8660 De Panne
Tel.: 058 41 58 66 GSM: 0475 718 253
e-mail: degroenehond@telenet.be
BTW BE 0435.584.339



p. 2/2
Situatieschema
3 x 400V + N ~ 50Hz

3 x 400V + N

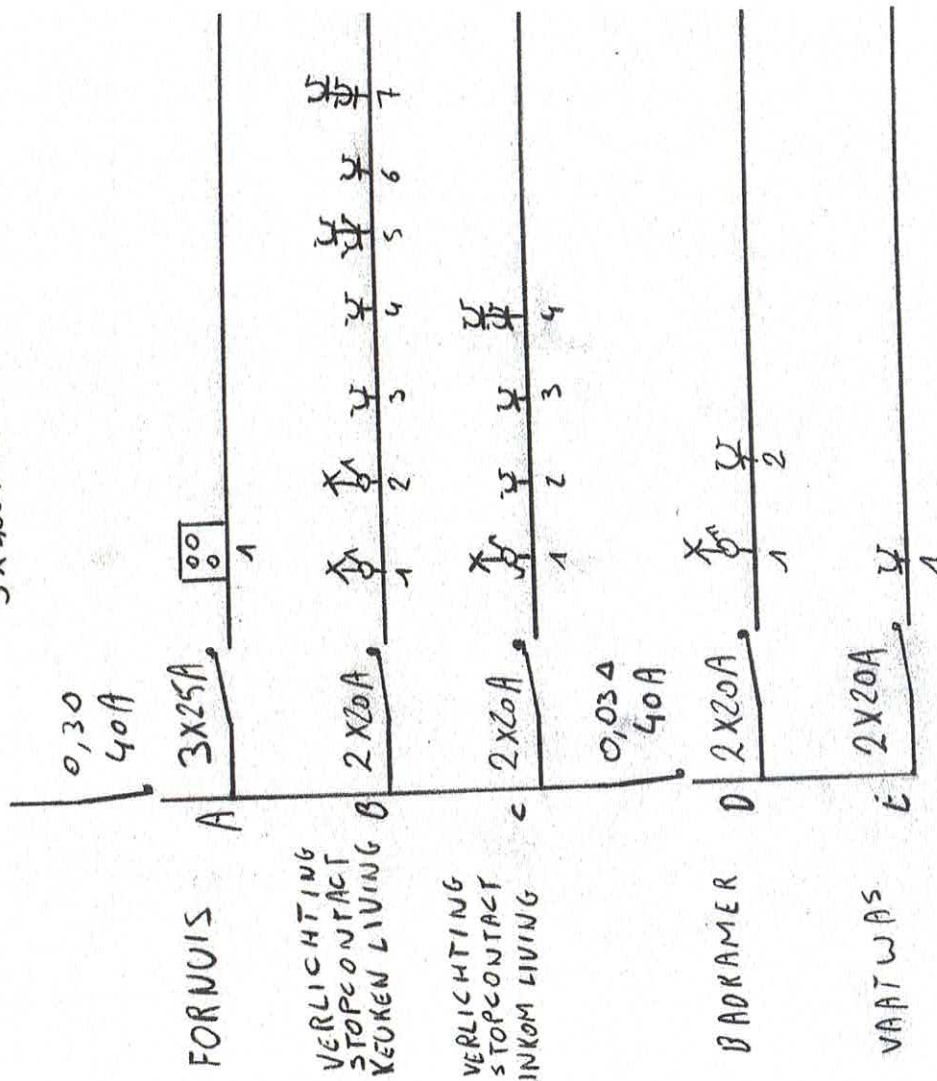

17X 29/7/19



Plaats van de elektrische installatie

**RES. ALEXANDRA APP. 0904
LEOPOLD 1 ESPLANADE 5
8660 DE PANNE**

Installateur
Elektro Service De Groene Hond bvba
Kasteelstraat 62 - 64
8660 De Panne
Tel.: 058 41 58 66 GSM: 0475 718 253
e-mail: degroenehond@telenet.be
BTW BE 0435.584.339



p. 2/2
Situatieschema

3 x 400V + N ~ 50Hz
