

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 10le006 of 10le008 op basis van de hieronder vermelde voorschriften.

Uw controle werd uitgevoerd door BTV VZW, kantoor BTV Antwerpen, Van der Sweepstraat 3, 2000 ANTWERPEN
T: 03 216 28 90, E: btv.antwerpen@btvcontrol.be

Verslagnummer:	0292-161221-04	Datum van het onderzoek :	21/12/2016
		Extra controle datums	

ALGEMENE GEGEVENS:

ADRES INSTALLATIE : JEMABO NV
LANGE LEEMSTRAAT 223 bus 201
2018 ANTWERPEN

Visualisatie van de installatie

EIGENAAR : JEMABO NV
Adres : LANGE LEEMSTRAAT 223
2018 ANTWERPEN

OPDRACHTGEVER : VAN DER SPIEGEL
Adres : HANENDREEF 95
2930 BRASSCHAAT

INSTALLATEUR : VAN DER SPIEGEL
Adres : HANENDREEF 95
2930 BRASSCHAAT

BTW of IK :



EAN :	Teller nr.	te plaatsen	Index :
-------	------------	-------------	---------

ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN:

Aard installatie :	Nieuwe Installatie /	Type der Lokalen :	Appartement
Begin werken fundering:	Voor 01/10/81	Elektrische installatie :	Na 01/10/81
Aansluiting spanning :	3x230V	AREI art. :	86
Voedingskabel hoofdbord :	XVB 4 x 10 mm ²	Bescherming van de aansluiting :	aut 40 max A
Type van de aardelektrode:	Pennen	Alg. schakelaar: type :	4p 40A/300mA
Aantal borden :	1	Aantal eindstroombanen :	8
Uitwendige invloedsfactoren :		Schema :	TT

ONDERZOEK:

Controlebezoek volgens : AREI art. 270,
Aard van het onderzoek : Gelijkvormigheidsonderzoek

METINGEN:

RA:	22 Ohm	RI tot	10 MOhm
-----	--------	--------	---------

BESCHRIJVING:

Zie eendraadsschema en situatieschema in bijlage.

ADS 40 / 300

1 X 4PC32

3 X 2PC20

1 X 2PC16

DIFF 40 / 30

2 X 2PC20

1 X 2PC16 i

VASTGESTELDE INBREUKEN

Geen

NOTA'S

- 1 De verlichtingstoestellen zijn nog niet (allemaal) geïnstalleerd.
- 2 De keuken is nog niet geplaatst.

Besluit

De installatie is conform.

De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld.

De ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 21/12/2041 (art. 271 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De agent-onderzoeker,

0292 MARC VERSCHUERE

voor De Directeur,



UITGEVOERDE CONTROLES

Tijdens het controleonderzoek van huishoudelijke installaties (art. 271)

- a) de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's;
 - b) de controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrisch materieel in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeelborden,...;
 - c) de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking;
 - d) de controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting;
 - e) de controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom van minimum 2,5 maal de gevoeligheid van het apparaat;
 - f) de controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse 1
 - g) de visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen;
 - h) de visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Behoudens inbreuken, wordt de overeenstemming bevestigd tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS, HUURDERS

- a) de verplichting het proces-verbaal van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie samen met de ééndraadschema's en de situatieplannen;
- b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;
- c) de verplichting de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit;
- d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Betekenis van de nota's: betreffen gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader van onderzoek vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens.

WELKE STAPPEN NEMEN ALS INSTALLATIE CONFORM IS

STAP 1

Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's.

STAP 2

Bij belangrijke uitbreidingen van de installatie, laat opnieuw controleren.



STAP 3


Een herkeuring van de installatie is verplicht voor 21/12/2041.

STAP 4


BTV Antwerpen staat tot uw dienst voor de noodzakelijke keuringen.

Schema's

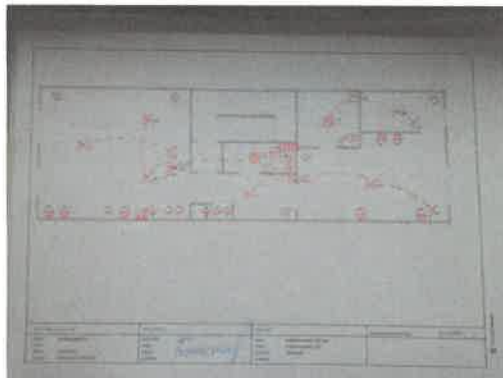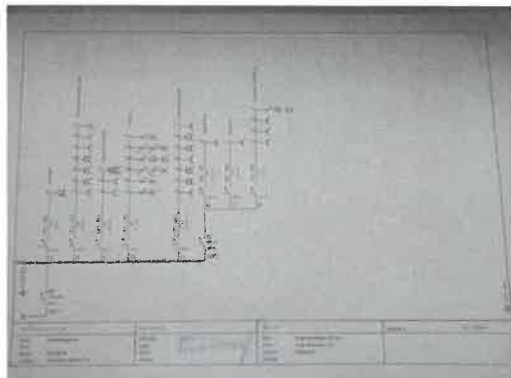

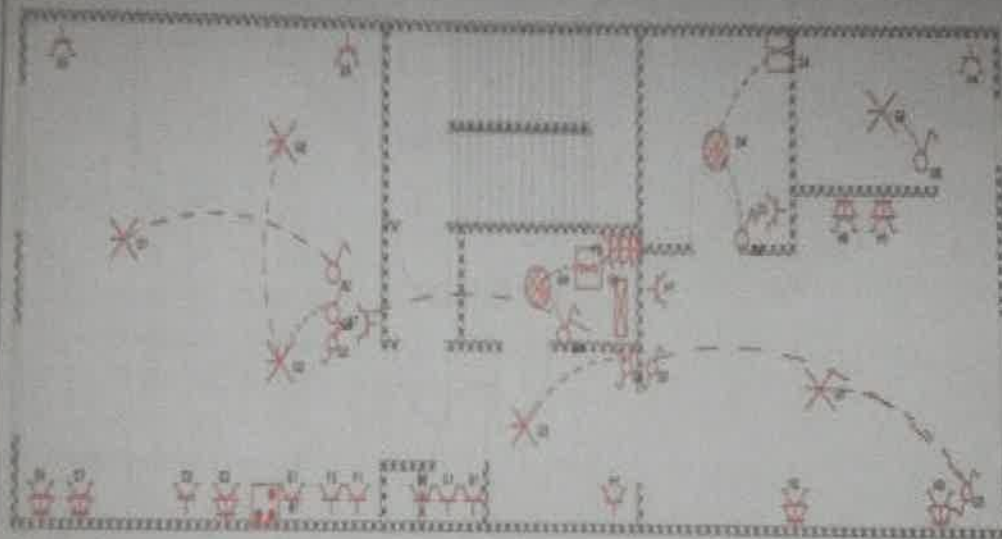

INSTALLASI	REVISI	WIRING	Spesifikasi 200 watt	5 x 220V-
Nama : <i>Indahputri N</i> NPM : <i>1412011</i> Kelas : <i>1412011</i> Jurusan : <i>Elektronika Industri</i>	Revisi : <i>1</i> Revisi : <i>2</i> Revisi : <i>3</i> Revisi : <i>4</i>	Nama : <i>Indahputri N</i> NPM : <i>1412011</i> Kelas : <i>1412011</i> Jurusan : <i>Elektronika Industri</i>		

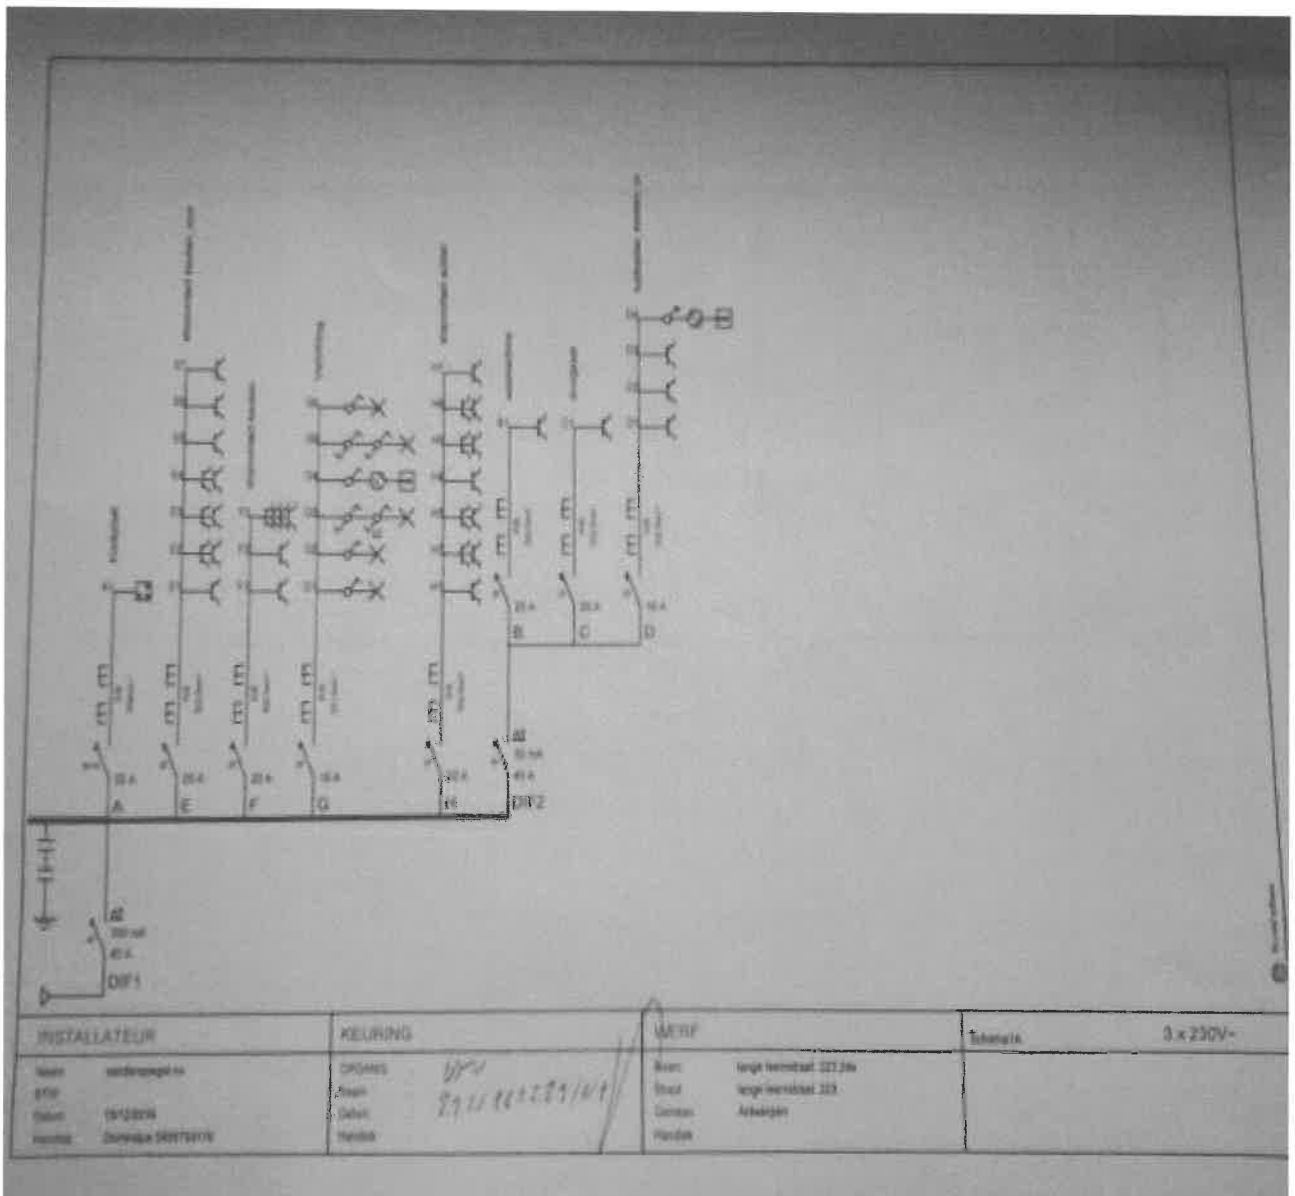

INSTALASI		KELURANG	UUTIF	Teknik	3 x 230V~
Nama	Handayani	OPRASI	Baru	Long kemikal 227.26	
g.10		Asam	Baru	Long kemikal 227.26	
Salah	19/12/2019	Debit	Baru	Arangan	
Salah	Donalax SKRTS/17/19	Handayani	Handayani		
