



Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

Schelle

Nr teller :

N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N° *19/204001/3*

EAN :
code :

Aard onderzoek : AREI ART	86	+95	270	271	276	276bis	TT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr. ☐
Genre de contrôle : RGIE ART		☐	☐	☒	☐	☐		

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

Place de Chasseurs Anversois 16 1030 Bxl

Eigenaar

Propriétaire :

FimBaus

Adres :

Adresse :

20

Installateur :

CRAFTLIGHT

BTW / TVA :

Datum van het onderzoek :

Date du contrôle :

11/9/2016

Ik. / C.I. :

Inspecteur :

B. BERGHMANS

Onderzoek / Contrôle :

☐ Woning / maison ☒ Apart.

20

Spanning : <i>1x230V</i>	Meter / bord verbinding : <i>DMB 2x10m²</i>	Max. beveiliging : <i>40A</i>
Tension :	Liaison compteur-tableau :	Protection max. :

Aardelektrode : <i>Ponts</i>	Isolatie : <i>61,3</i>	Mohm	Aantal verdeelborden : <i>2</i>
Electrode de terre : <i>22,7</i>	Ohm	Isolément :	Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : <i>5</i>		Test ΔI_n		1. ΔI_n		AREI / RGIE		
In (A)	ΔI_n (mA)	type	Nombre de circuits terminaux :		OK	NOK	OK	NOK	270	271	271bis
<i>40</i>	<i>300</i>	<i>A</i>	<i>1 circuit (gara)</i>		☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐
<i>40</i>	<i>30</i>	<i>A</i>	<i>1 ADE</i>		☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐
					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Visueel nazicht : algemeen : ☒ OK ☐ NOK	Indirecte aanraking : ☒ OK ☐ NOK
Contrôle visuel : général : ☒ ☐	Contact indirect : ☒ ☐

Aansluitingen : ☒ OK ☐ NOK	Potentiaalvereffeningen : ☒ OK ☐ NOK
Raccordements :	Liaisons equipotentielle :

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso)	VISUM :
Opmerkingen/Remarques :	Datum/date :

[Handwritten signature]

Besluit / Conclusion : L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. Les bornes de l'interrupteur différentiel général sont rendues inaccessibles par scellage. De ingangsklemmen van de algemene differentieelschakelaar zijn ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Le schéma unifilaire et de position ont été visés et sont conformes avec l'installation. - Het ééndraad- en situatieschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie. Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur (art. 271 R.G.I.E.). - De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn (art. 271 A.R.E.I.) Prochaine visite de contrôle : / Volgende controlebezoek : <i>11/9/2017</i> L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du R.G.I.E. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I. Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme un an au plus tard après la date de ce contrôle. Passé ce délai, le SPF concerné sera averti de l'existence d'infractions. Overeenkomstig art. 274 van het A.R.E.I., de werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd ten laatste één jaar na keuringsdatum. Na deze datum wordt de betrokken FOD verwittigd van de aanwezigheid van inbreuken. La visite de contrôle prévue par l'art. 276 bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après l'acte de vente - Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur : <i>[Signature]</i>			
Niet conform	Conform	N° vorig rapport	
276bis AK <i>18 m</i> → 274 AK	276bis HK 274 HK	 /	
271 AK	271 HK	 /	
276 AK	276 HK	 /	

Herinnering van de reglementaire voorschriften: a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie; b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden; c) de verplichting de F.O.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en rechtsstreeks te wijzen aan de aanwezigheid van elektriciteit; d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Rappel des prescriptions réglementaires: a) l'obligation de conserver le P.V. de la visite de contrôle dans le dossier d'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenant dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et du danger pour les personnes et les biens. Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme un an au plus tard après la date de ce contrôle. Passé ce délai, le SPF concerné sera averti de l'existence d'infractions. Lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions constatées pendant la visite de contrôle. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de la visite de contrôle à la Direction générale de l'énergie préposée à la surveillance des installations électriques domestiques.

INBREUKEN

A. AARDING

1. De spreiding van de aardingsweerstand is hoger dan 30 Ohm.
2. De spreiding van de aardingsweerstand is hoger dan 100 Ohm.
3. De spreiding van de aardingsweerstand is te hoog volgens de gevoeligheid van de differentieelschakelaar.
4. Er is geen aardelektrode/aardingslus aanwezig.
5. De aardgeleider bezit een onvoldoende sectie (min. 16 mm² Cu).
6. De aardingsonderbreker is niet aanwezig.

B. EQUIPOTENTIALE VERBINDINGEN (E.V.)

1. E.V. niet aanwezig.
2. E.V. niet bevestigd volgens de regels van de kunst.
3. De sectie van de hoofd E.V. is onvoldoende (min. 6 mm²).
4. Bijkomende E.V. in badkamer niet geplaatst of onjuist.
5. Bijkomende E.V. bezitten een onvoldoende sectie (beschermd 2,5 mm²).
6. De continuïteit is niet verzekerd.
7. De kleurcode is onjuist.

C. ISOLATIEWEERSTAND

1. Per kring : minder dan 500 kOhm

D. DIFFERENTIEELSCHAKELAARS (D.S.)

1. Er zijn geen D.S. aanwezig.
2. De nominale stroom van de Algemene D.S. (A.D.S.) bedraagt minder dan 40A.
3. De nominale stroom van D.S. is onvoldoende.
4. De verzegelplaatjes van de A.D.S. zijn niet aanwezig.
5. Er is geen D.S. geplaatst voor de beveiliging van de badkamer, wasmachine...
6. Test ΔI_n : N.O.K.
7. Test 2,5 ΔI_n : N.O.K.

E. VERDEELBORD(EN) EN KRINGEN

1. De kringen zijn niet of onjuist gemerkt.
2. Het bord is niet bereikbaar of niet op een hoogte van +/- 1,5 m geplaatst.
3. Rechtstreekse aanraking is mogelijk.
4. Er zijn geen kalibreerelementen geplaatst of deze zijn niet in functie van draadsecties.
5. Er zijn overbrugde veiligheden aanwezig.
6. Er zijn geen 2 kringen minimum aanwezig voor de verlichting.

F. LEIDINGEN

1. Niet gebruikte leidingen zijn niet verwijderd.
2. Er is geen reglementaire kleurcode gebruikt.
3. De aanwezige blauwe geleider wordt gebruikt als fasegeleider en er is een andere kleur beschikbaar.
4. Kabels zijn niet beschermd bij muurdoorvoering.
5. Kabels en PVC buis zijn niet mechanisch beschermd over een afstand van 10 cm boven het vloerniveau.
6. De gebruikte XVB en XFVB kabels verzonken in de muur volgen niet de voorgeschreven trajecten.
7. Installatiedraad niet beschermd of niet reglementair.

G. SCHAKELAARS EN STOPCONTACTEN

1. De stopcontacten zijn niet op voldoende hoogte van het vloerniveau geplaatst (van as tot vloer : 25 cm in vochtige lokalen en 15 cm droge lokalen).
2. Een schakelaar(s) snijdt niet de fasegeleider.
3. Het gebruikte materiaal stemt niet overeen met de vereiste beschermingsgraad.
4. Directe aanraking mogelijk

H. TOESTELLEN

1. De gebruikte toestellen dragen geen gelijkvormigheidslabel van een erkend Europees labo.
2. De toestellen voldoen niet aan de gewenste beschermingsgraad.
3. De isolatieklasse stemt niet overeen met de plaats van het toestel
4. De verwarmingstoestellen zijn nog niet geplaatst.
5. Directe aanraking mogelijk

I. VISUEEL NAZICHT

1. Algemene opmerkingen
2. Directe aanraking mogelijk
3. Indirecte aanraking mogelijk

J. ELEKTRISCH DOSSIER

1. Eëndraadschema niet aanwezig
2. Situatieschema niet aanwezig

INFRACTIONS

A. PRISE DE TERRE

1. La résistance de la prise de terre dépasse 30 Ohms.
2. La résistance de la prise de terre dépasse 100 Ohms.
3. La résistance de la prise de terre est trop élevée en fonction de la sensibilité de l'interrupteur différentiel.
4. Absence d'une électrode de terre (boucle de terre)
5. La section du conducteur de mise à la terre est insuffisante (min 16 mm² Cu).
6. Il n'existe pas de coupe-terre.

B. LIAISONS EQUIPOTENTIELLES (L.E.)

1. L.E. non réalisées.
2. L.E. non fixées d'après les règles de l'art.
3. La section de la L.E. principale est insuffisante (min 6 mm²).
4. L.E. supplément. dans salle de bains non réalisées ou incorrectes.
5. L.E. suppl. ont une section insuffisante (protégées 2,5 mm²).
6. La continuité n'est pas assurée.
7. Le code des couleurs n'est pas correct.

C. RESISTANCE D'ISOLEMENT

1. Par circuit : inférieure à 500 kOhm.

D. INTERRUPTEURS DIFFERENTIELS (I.D.)

1. Absence de différentiels.
2. Le courant nominal de l'I.D. général est inférieur à 40A.
3. Le courant nominal de l'I.D. est insuffisant.
4. Les plaquettes de plombage de l'I.D. général manquent.
5. Absence d'un I.D. pour salle de bains, machine à laver...
6. Teste ΔI_n : P.O.K.
7. Teste 2,5 ΔI_n : P.O.K.

E. TABLEAU(X) DE DISTRIBUTION ET CIRCUITS

1. Les circuits ne sont pas ou incorrectement marqués.
2. Le tableau n'est pas accessible ou n'est pas à une hauteur de +/- 1,5 m.
3. Contact direct est possible.
4. Absence d'éléments de calibrage ou inadaptés en fonction des sections des canalisations.
5. Il y a des fusibles pontés.
6. Il n'y a pas au minimum 2 circuits d'éclairage.

F. CANALISATIONS

1. Les canalisations non utilisées ne sont pas éliminées.
2. Il n'y a pas de code de couleurs réglementaire utilisé.
3. Le conducteur bleu présent est utilisé comme conducteur de phase et une autre couleur est disponible.
4. Les conduct. ne sont pas protégés dans les traversées des murs.
5. Conduct. et tubes PVC ne sont pas protégés mécaniquement à une distance de 10 cm au-dessus du niveau de sol.
6. Les canalisations XVB et XFVB noyées dans le mur, ne suivent pas le parcours privilégié.
7. Conducteur d'installation non protégé ou pas réglementaire.

G. INTERRUPTEURS ET PRISES DE COURANT

1. Les prises de courant ne sont pas placées à une hauteur suffisante vis à vis du niveau de sol (25 cm dans des locaux humides et 15 cm dans des locaux secs).
2. Le conducteur de neutre est coupé au lieu du conduct. de phase.
3. Le matériel utilisé n'est pas conforme au degré de protection exigé.
4. Contact direct possible

H. APPAREILS

1. Les appareils utilisés ne sont pas pourvus d'un label de conformité d'un labo européen agréé.
2. Les appareils ne répondent pas au degré de protection exigé.
3. La classe d'isolation n'est pas en conformité avec l'emplacement de l'appareil.
4. Les appareils de chauffage électrique ne sont pas encore installés.
5. Contact direct possible

I. CONTRÔLE VISUEL

1. Remarques générales
2. Contact direct possible
3. Contact indirect possible

J. DOSSIER ELECTRIQUE

1. Le schéma unifilaire n'est pas présent.
2. Le schéma de position n'est pas présent.

COFFRET ELECTRIQUE : Place des Chasseurs Ardennais 16

2^{ème} étage droit 2 x 220V

1 = Disjoncteur général 40 A

2 = Différentiel 30MA 40A

- A : Eclairage + 1 prise entrée, éclairage salon/salle à manger
- B : Eclairage + 3 prises chambre
- C : 2 prises entrée
- D : 2 doubles prises salon et cuisine, 2 prises simple et éclairage cuisine
- E : 1 double prise salle de bain, éclairage + 1 prise salle de bain



ELECTRO-TEST

M. BERCHMANS

inspecteur

inspecteur@electro-test.be

015 71 11 22

Craftslight Connexion


Rollebaan 59


1640 Rhode - St - Genèse

TVA BE 780 146 848


GSM 0495/522 767

Place des cheneurs Aidermais 16 apportement 2ème etage droit.

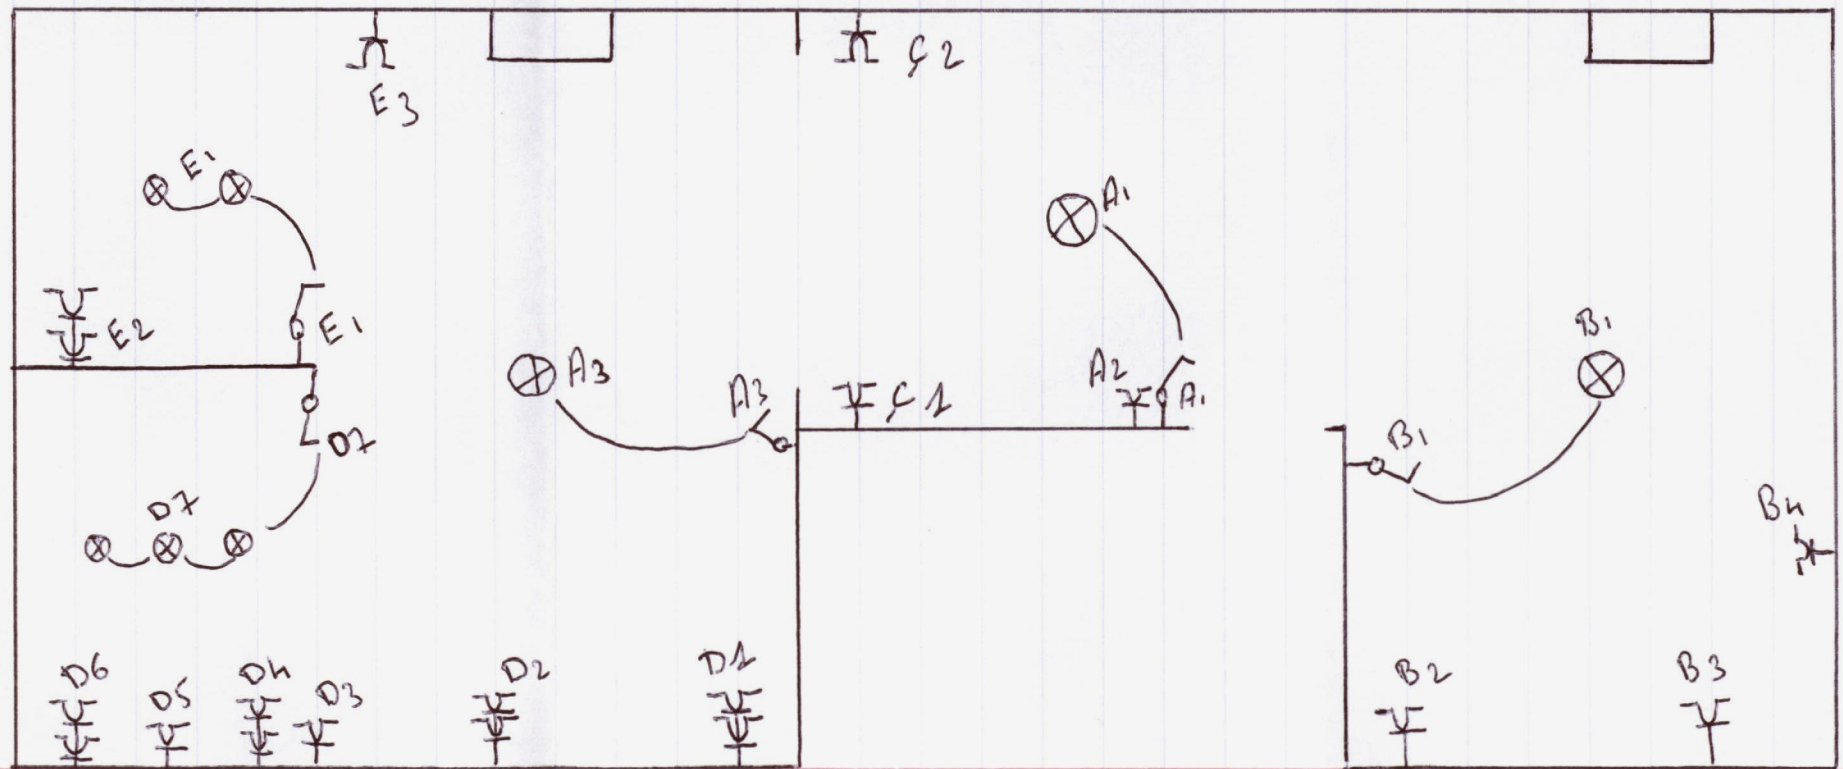

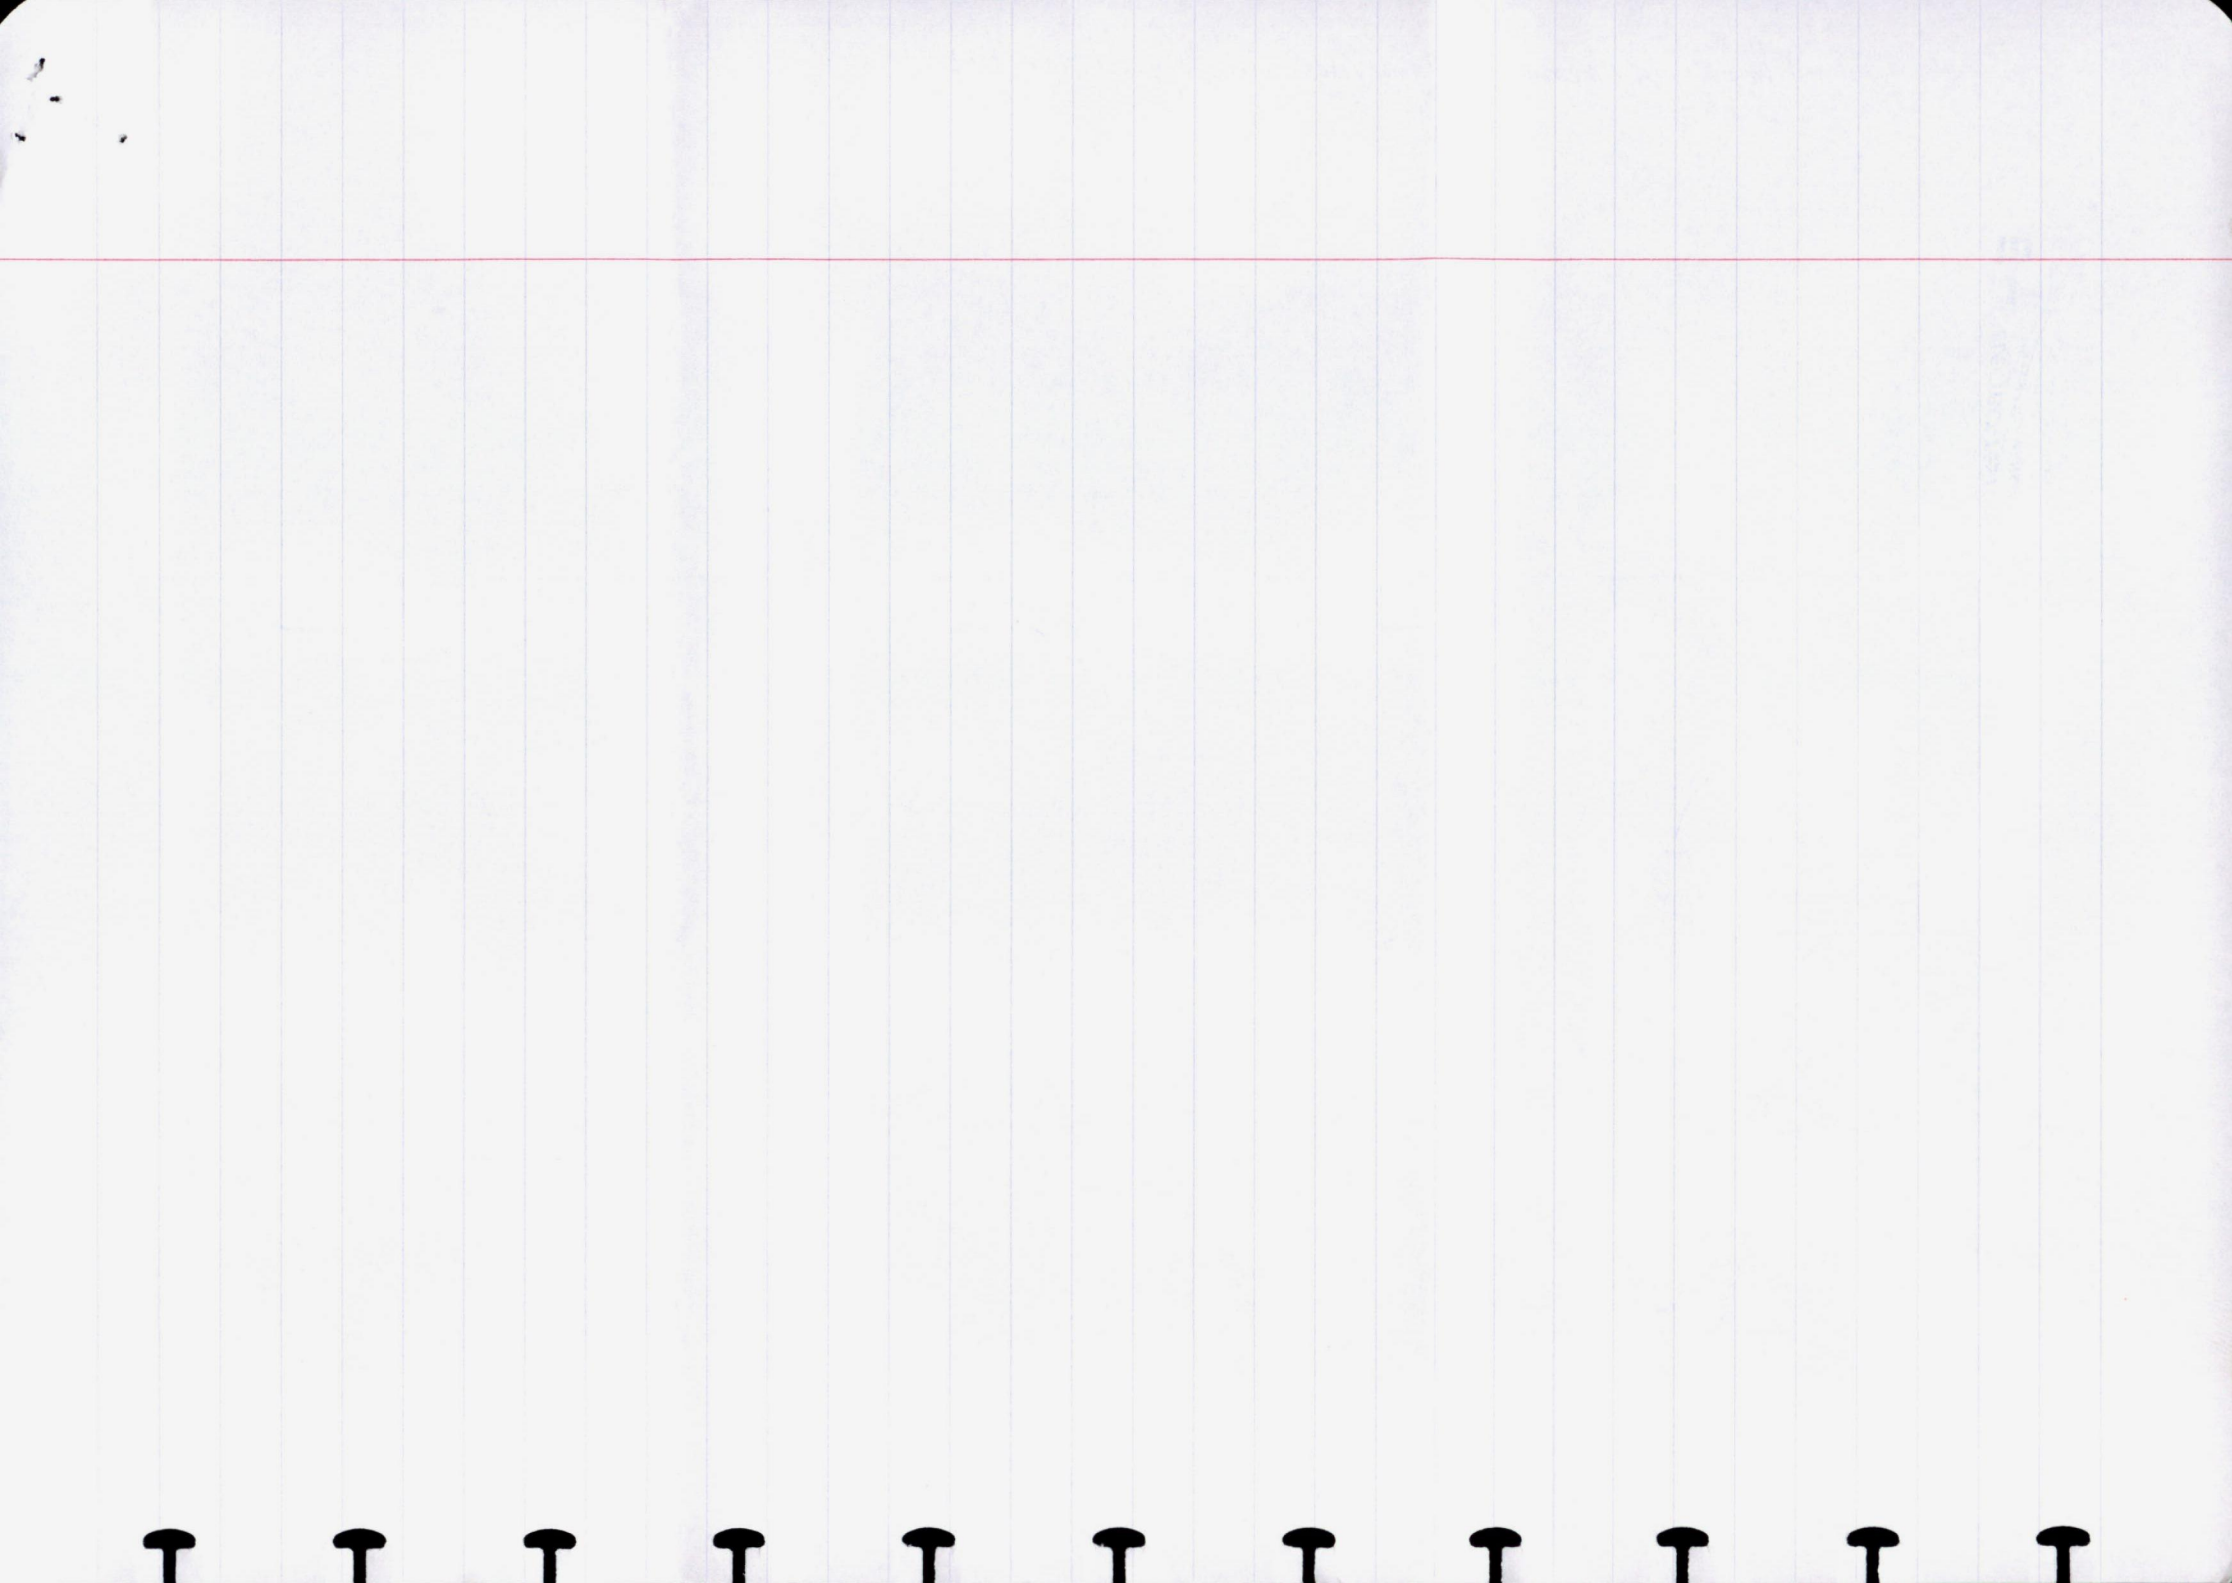

Place des chemins Antennaires 15 appartement 2^{ème} étage droit

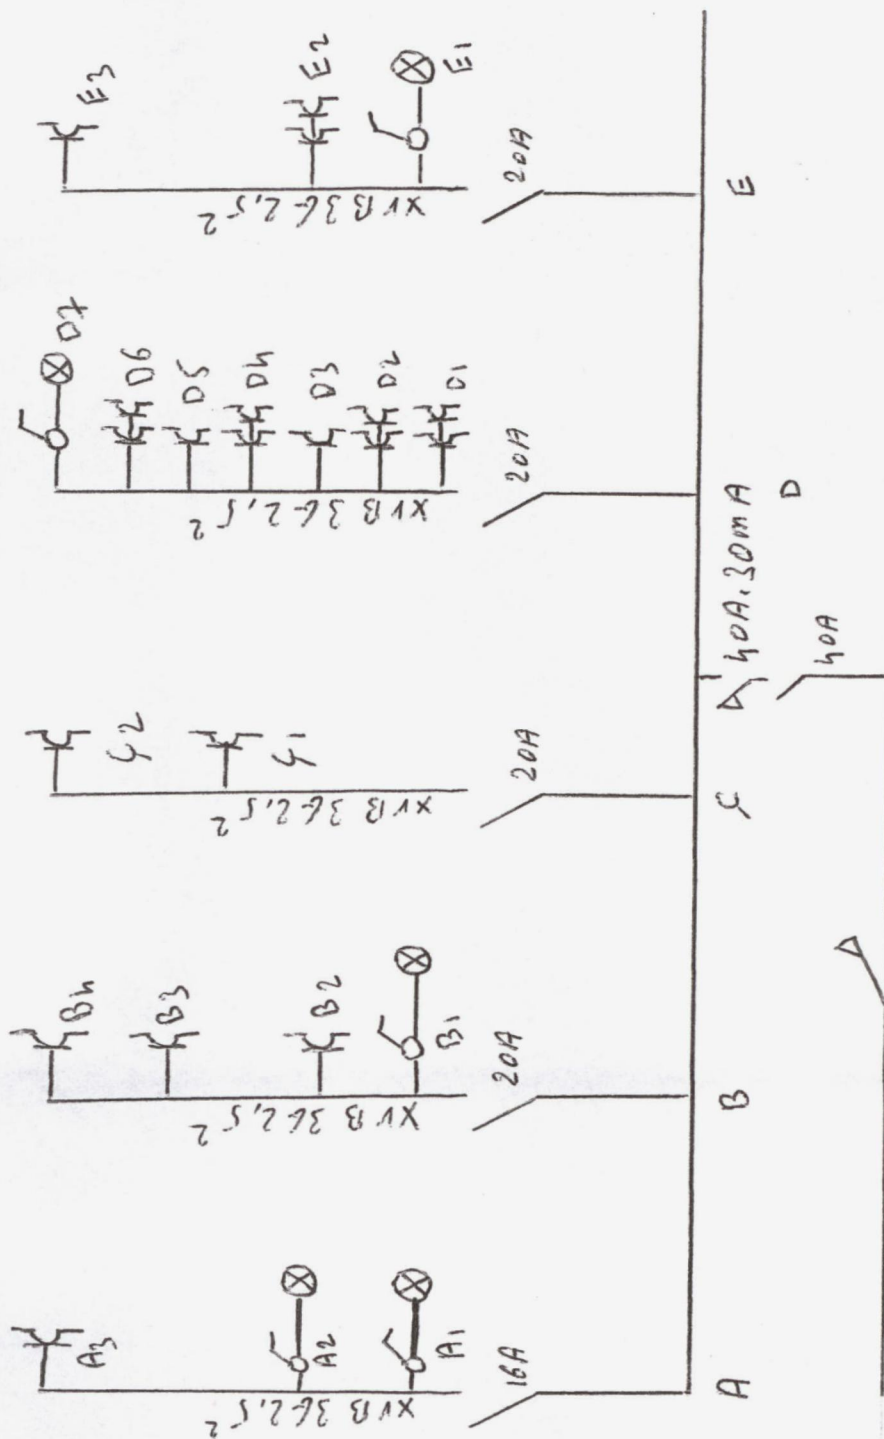

40.300mA

G. Kelen

CRAFTSLIGHT CONNEXION

Pierre ROLAND

FACTURE/FACTUUR 16 4296

IMAYER N.V
Quai aux Pierre de Taille, 35
1000 BRUXELLES

Date /Datum 4/09/2016	N° TVA / BTW nr NON ASSUJETTI
--------------------------	----------------------------------

Quantité Hoeveelheid	Description Omschrijving	Prix unitaire Eenheidsprijs	Prix total Totale prijs
	Concerne : Place des Chasseurs Ardennais 16, réceptions électriques des appartements étage 2, gauche et droit		
4	Main d'oeuvre le 18.08.2016 : repérage complet des circuits et divers pour future réception	40	160.00€
7.5	Main d'oeuvre le 01.09.2016 : Mise au propre des schémas et plans, transformation des coffrets et divers pour réception	40.00 €	300.00 €
	Matériel :		
2	différentiels bipolaires 40A 300MA (cave)	118.85 €	237.70 €
1	coiffe coffret (cave)	23.77 €	23.77 €
1	disjoncteur bipolaire 40A (2ème droit)	20.61 €	20.61 €
1	goulotte + câble éclairage plafond	8.50 €	8.50 €
1	boîte de dérivation	3.87 €	3.87 €
	TVA autoliquidation		
		Base taxable	754.45 €
		% TVA / % BTW	6%
		montant TVA	45.27 €
		Total TVAC	799.72 €

Échéance / Vervaldatum : fin de chantier, dès réception de la facture

Conditions générales de vente au verso - algemene verkoopsvoorwaarden op de keerzijde

CRAFTSLIGHT Connexion - Rollebaan 59 - 1640 RHODE-SAINT-GENESE
Tel 02/381 09 17 - GSM 0495 522 767 -Belfius Banque BE60 0682 1777 9070
RCB/HRB 580325 - TVA/BTW BE 780.146.848 - Enreg/registr. 032600
