



VINÇOTTE vzw

Erkend Controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
BTW: BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB1

Verslag nr.:

2020194730/ANT

- ☐ Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent
☒ Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde
☒ Noordersingel 23, 2140 Antwerpen
☐ Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux

Tel: +32 9 244 77 11
Tel: +32 2 674 57 11
Tel: +32 3 221 86 11
Tel: +32 81 432 611

gent@vincotte.be
brussels@vincotte.be
antwerpen@vincotte.be
gembloux@vincotte.be



N 140516

Resi code: 11

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken:

Installatie:

Eigenaar of beheerder:

Naam, voornaam: <u>Dei Doda</u>	Naam, voornaam: <u>Appartement 2e 32</u>	
<u>Boedapeststraat 10</u>	Adres: <u>Friedlandstraat 3</u>	
Ident. Kaart nr.: <u>266 Hoboken</u>	Post nr. + Stad: <u>B-266 Hoboken</u>	
BTW nr.: BE <u>040213153</u>	Tel.: <u>1</u>	

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

☒ Art 270 ☐ ingebruikname ☐ wijziging ☐ uitbreiding ☐ mobiel ☐ tijdelijk	☒ Art 86 ☐ Art 87 ☐ Art 88 ☐ Art ...	☒ Art 271 bis ☒ Art 278 ☐ Art ... ☐ Art ...	☒ 1 Wooneenheid ☐ 2 Huishoudelijke werkeenheid ☐ 3 Gemeenschappelijke delen ☐ 4 Werkeenheid
☐ Art 271 ☐ periodiek ☐ controle ☐ ...			
☐ Art 276: verzwarend	☐ Art 276bis: verkoop van een wooneenheid		

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdelers	EAN: <u>17686894</u>	☐ EAN niet meegedeeld	☐ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.: <u>17686894</u>	meterstand dag: <u>79349</u>	nacht: <u>79349</u>
	Bescherming aansluiting (A): ☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☐ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100		☐ kWh excl. nacht meter: nr.: <u>1</u> meterstand: <u>1</u>
Gegevens installatie	Ontworpen voor U _N : ☐ 230 V ☒ 3x230 V ☐ 3N400 V		Type aardelektrode: ☐ aardingslus ☐ pen / baar
	Maximale nominale stroom (A): ☐ 020 ☐ 025 ☒ 032 ☐ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100		☐ ...
	Voedingsleiding hoofdbord: <u>3</u> X <u>16</u> mm ² - Type: <u>003</u>		
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting: <u>40</u> A / <u>300</u> mA	Aantal borden: <u>1</u>	Aantal eindstroombanen: <u>8</u>
☒ Zie bijlage(n)			

Metingen - testen - controles - verzegeling:

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	☐ Toestellen	☒ Materieel	☒ >/doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand: <u>4</u> Ω	☒ Algemeen isolatieniveau: <u>15</u> MΩ	☐ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☒ Test diff.		
Differentieelstroominrichting: ☐ was verzegeld ☒ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	☒ Nihil
Inbreuken Bestaande installatie	☒ Nihil
Opmerkingen	☒ Nihil
	Visum DNB of aangestelde:

Besluit(en):

- ☒ De nieuwe installatie voldoet ☒ De bestaande installatie voldoet
- ☒ De nieuwe installatie voldoet niet aan het AREI ☒ De bestaande installatie voldoet niet aan het AREI

Agent bezoeker:

Naam: Slangen Agent nr.: 2009 Datum: 14/10/2016

Bijlage(n): ☒ Situatieschema(s): 1 ☒ Eindraadsschema(s): 1

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden voor

14/10/2016


☐ door hetzelfde erkend organisme (*)

Voor de directeur generaal: Handtekening



VINÇOTTE vzw
Geert Slangen

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
- Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
- (*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

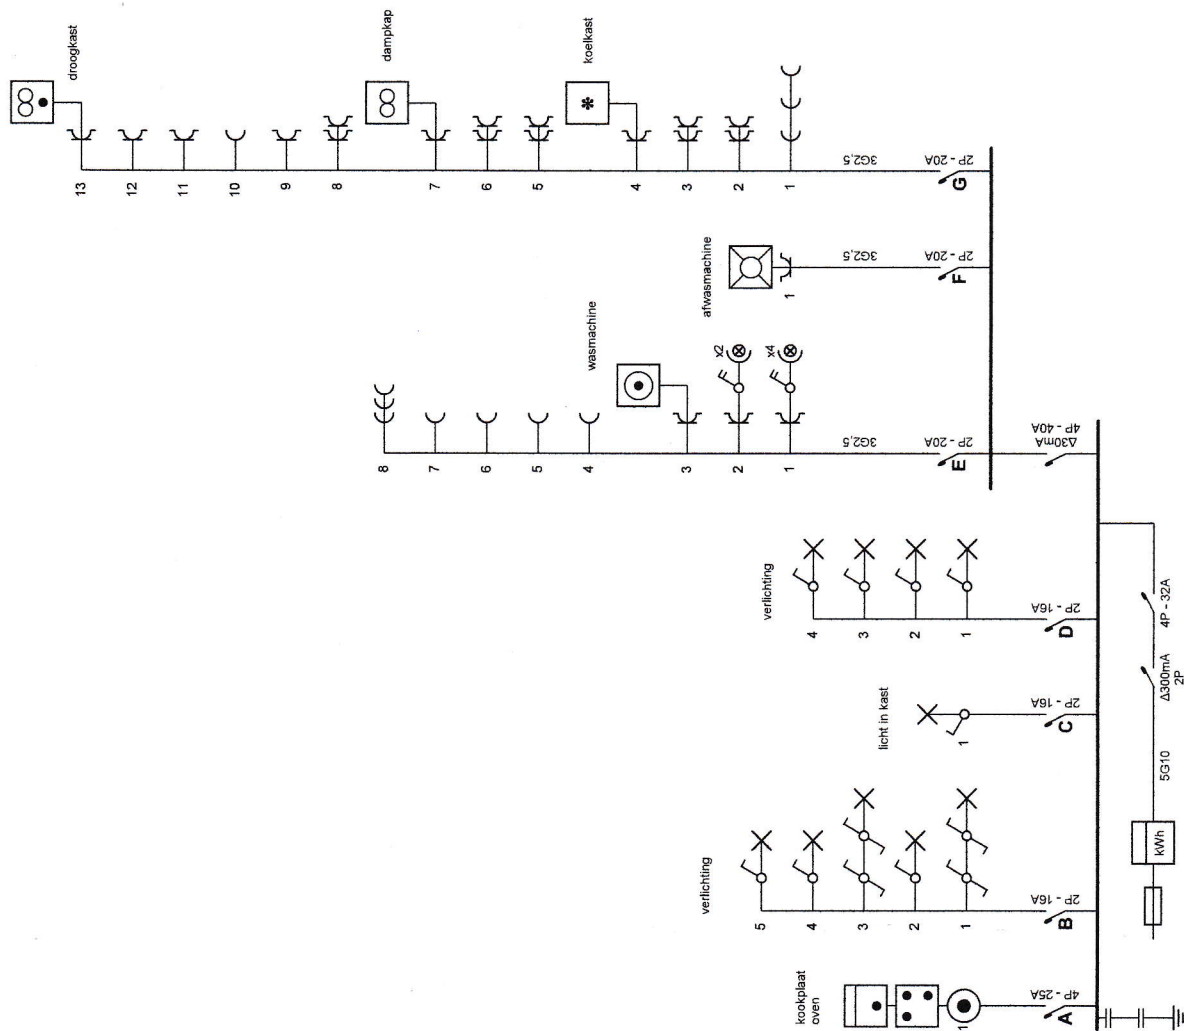

Erkend Organisme

AlB-Vincotte
Noordersingel 23
2140 Antwerpen
Tel.: 03 221 86 11
Fax: 03 221 86 12
e-mail: antwerpen-limburg@vincotte.be

Plaats van de elektrische installatie


Kenens - Herygers
Frieslandstraat 4 app J2 bus 67
2660 Hoboken
GSM: 0497 08 30 70

Installateur

Data Cable Install B.V.B.A.
Boedapeststraat 10
2660 Hoboken
Tel.: 03 825 24 94 GSM: 0495 25 56 53
Fax: 03 825 24 42
e-mail: data.cable.install.bvba@telenet.be
BTW BE 0442.023.753

p. 1/2
Eendraadschema

3 x 230V ~ 50Hz

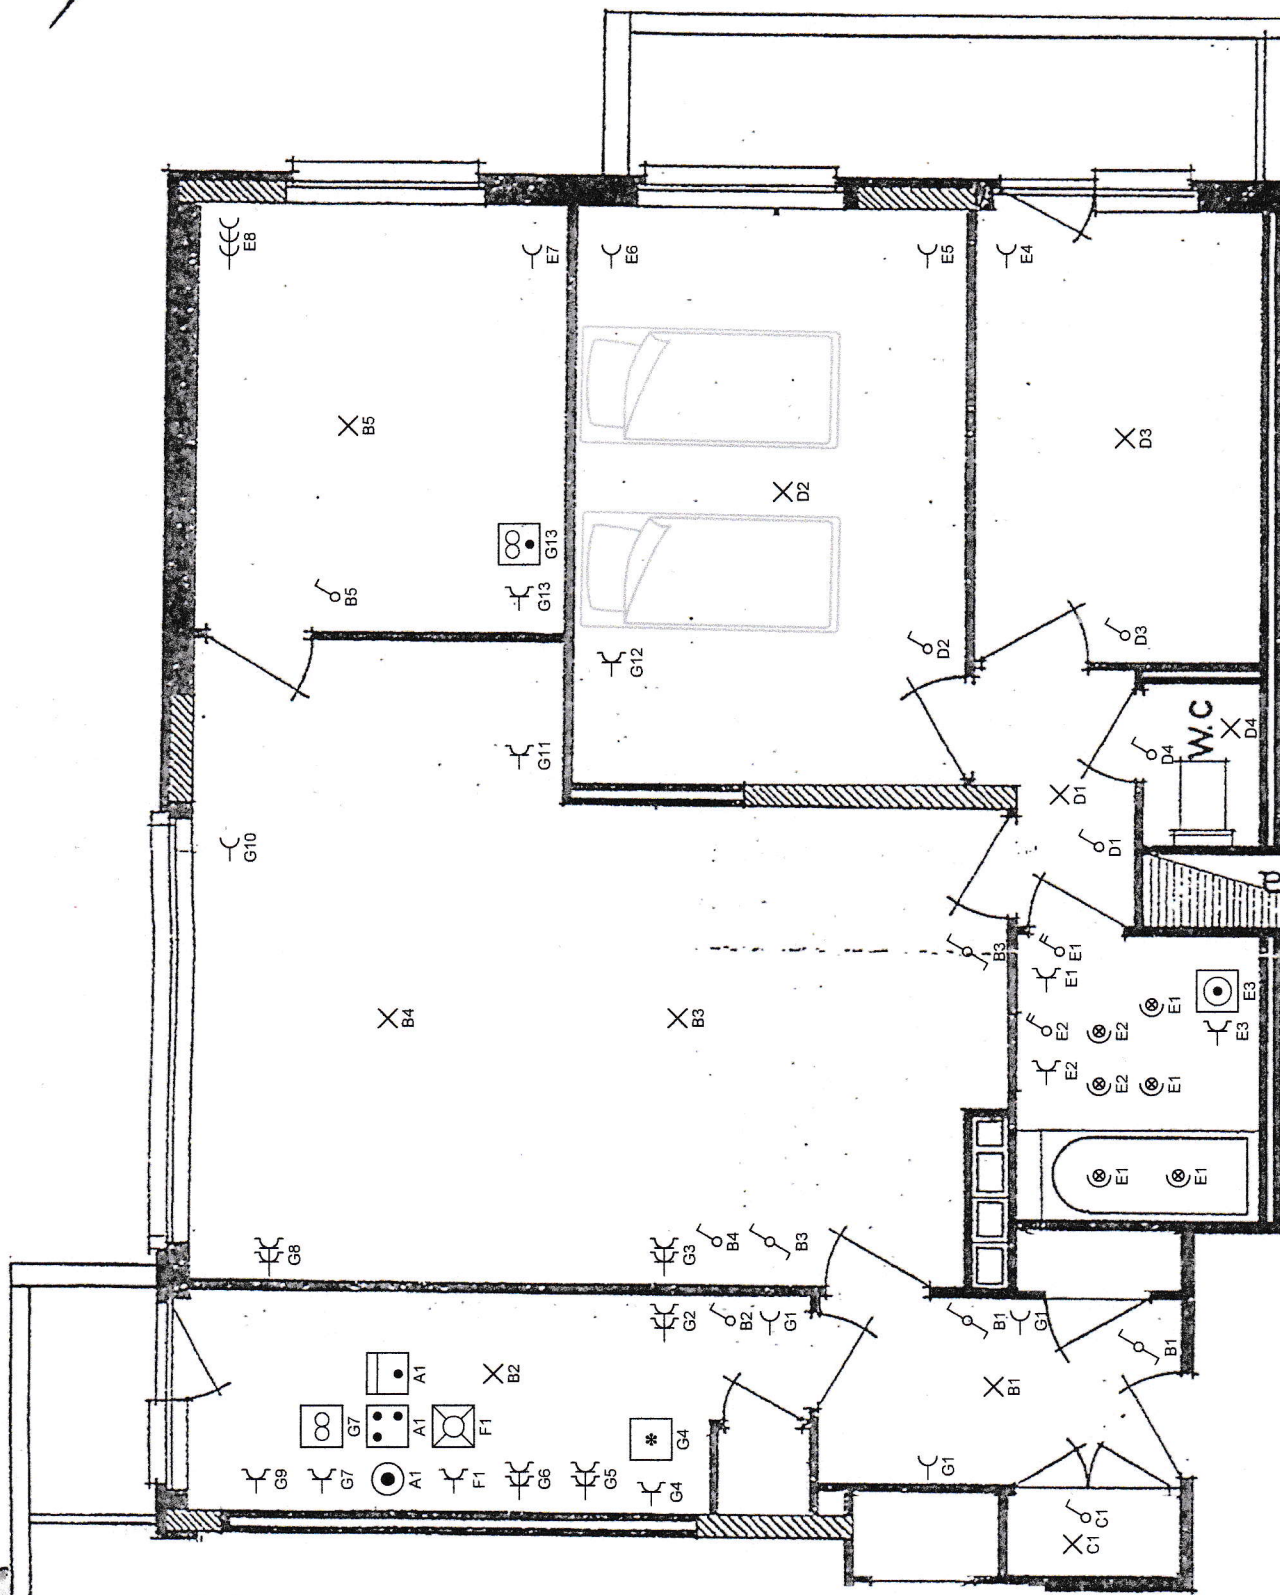

Erkend Organisme
 AIB-Vinçotte
 Noordersingel 23
 2140 Antwerpen
 Tel.: 03 221 86 11
 Fax: 03 221 86 12
 e-mail: antwerpen-limburg@vincotte.be

Plaats van de elektrische installatie
 Kenens - Herygers
 Frieslandstraat 4 app J2 bus 67
 2660 Hoboken
 GSM: 0497 08 30 70

Installateur
 Data Cable Install B.V.B.A.
 Boedapeststraat 10
 2660 Hoboken
 Tel.: 03 825 24 94 GSM: 0495 25 56 53
 Fax: 03 825 24 42
 e-mail: data.cable.install.bvba@telenet.be
 BTW BE 0442.023.753

p. 2/2
Situatieschema
 3 x 230V ~ 50Hz
