

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 22/06/2023

Inspecteur: Jurgen Goethals

Mentor:

Installateur: Elektro Schoonaert

ID-label: 0301

B.T.W. nr.: BE 0458 187 121

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Metrel Eurotest ET61557

Serienummer: 18460134

Datum verslag: 22/06/2023

Dit rapport vervangt rapport met rapportnummer 1169612

Plaats van het onderzoek

Straatnaam: Albert I Laan
Huisnummer: 22
Busnummer: 0301
Postcode: 8620
Gemeente: Nieuwpoort
Land: België

Eigenaar

Naam: -
Straatnaam: Albert I Laan
Huisnummer: 22
Busnummer: 0301
Postcode: 8620
Gemeente: Nieuwpoort
Land: België

Installateur

Naam: Elektro Schoonaert
BTW nr.: BE 0458 187 121
Telefoonnummer: +32 58 31 40 69
E-mail: elektro@schoonaert.be

Type : appartement

EAN : 54

Teller Nr.: -

☒ Niet meegedeeld

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS

Aantal borden: 1

Aardelektrode: Aardingslus

Gelijkvormigheidscontrole van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1 - 6.4. en 4.2.4.3.

Spanning: 3N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal kringen: 12

Ri algemeen: >0.5 MΩ

RE: 10 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _{st}	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	12	NVT	NVT
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	5	NVT	NVT
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	14	NVT	NVT

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Zie schema	C	20		2	2,5
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

nota/note 27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.

nota/note 12: De elektrische installatie staat niet onder spanning. De goede werking van de differentieels kon niet getest worden.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 22/6/2048
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

De installatie is aangevat voor 01/06/2023, hierdoor is rekening gehouden met de afwijkende beschikkingen vermeld in 6.5.8. van Boek I.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Jurgen Goethals

Goethals Jurgen

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtevreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit


- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 22/6/2048	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

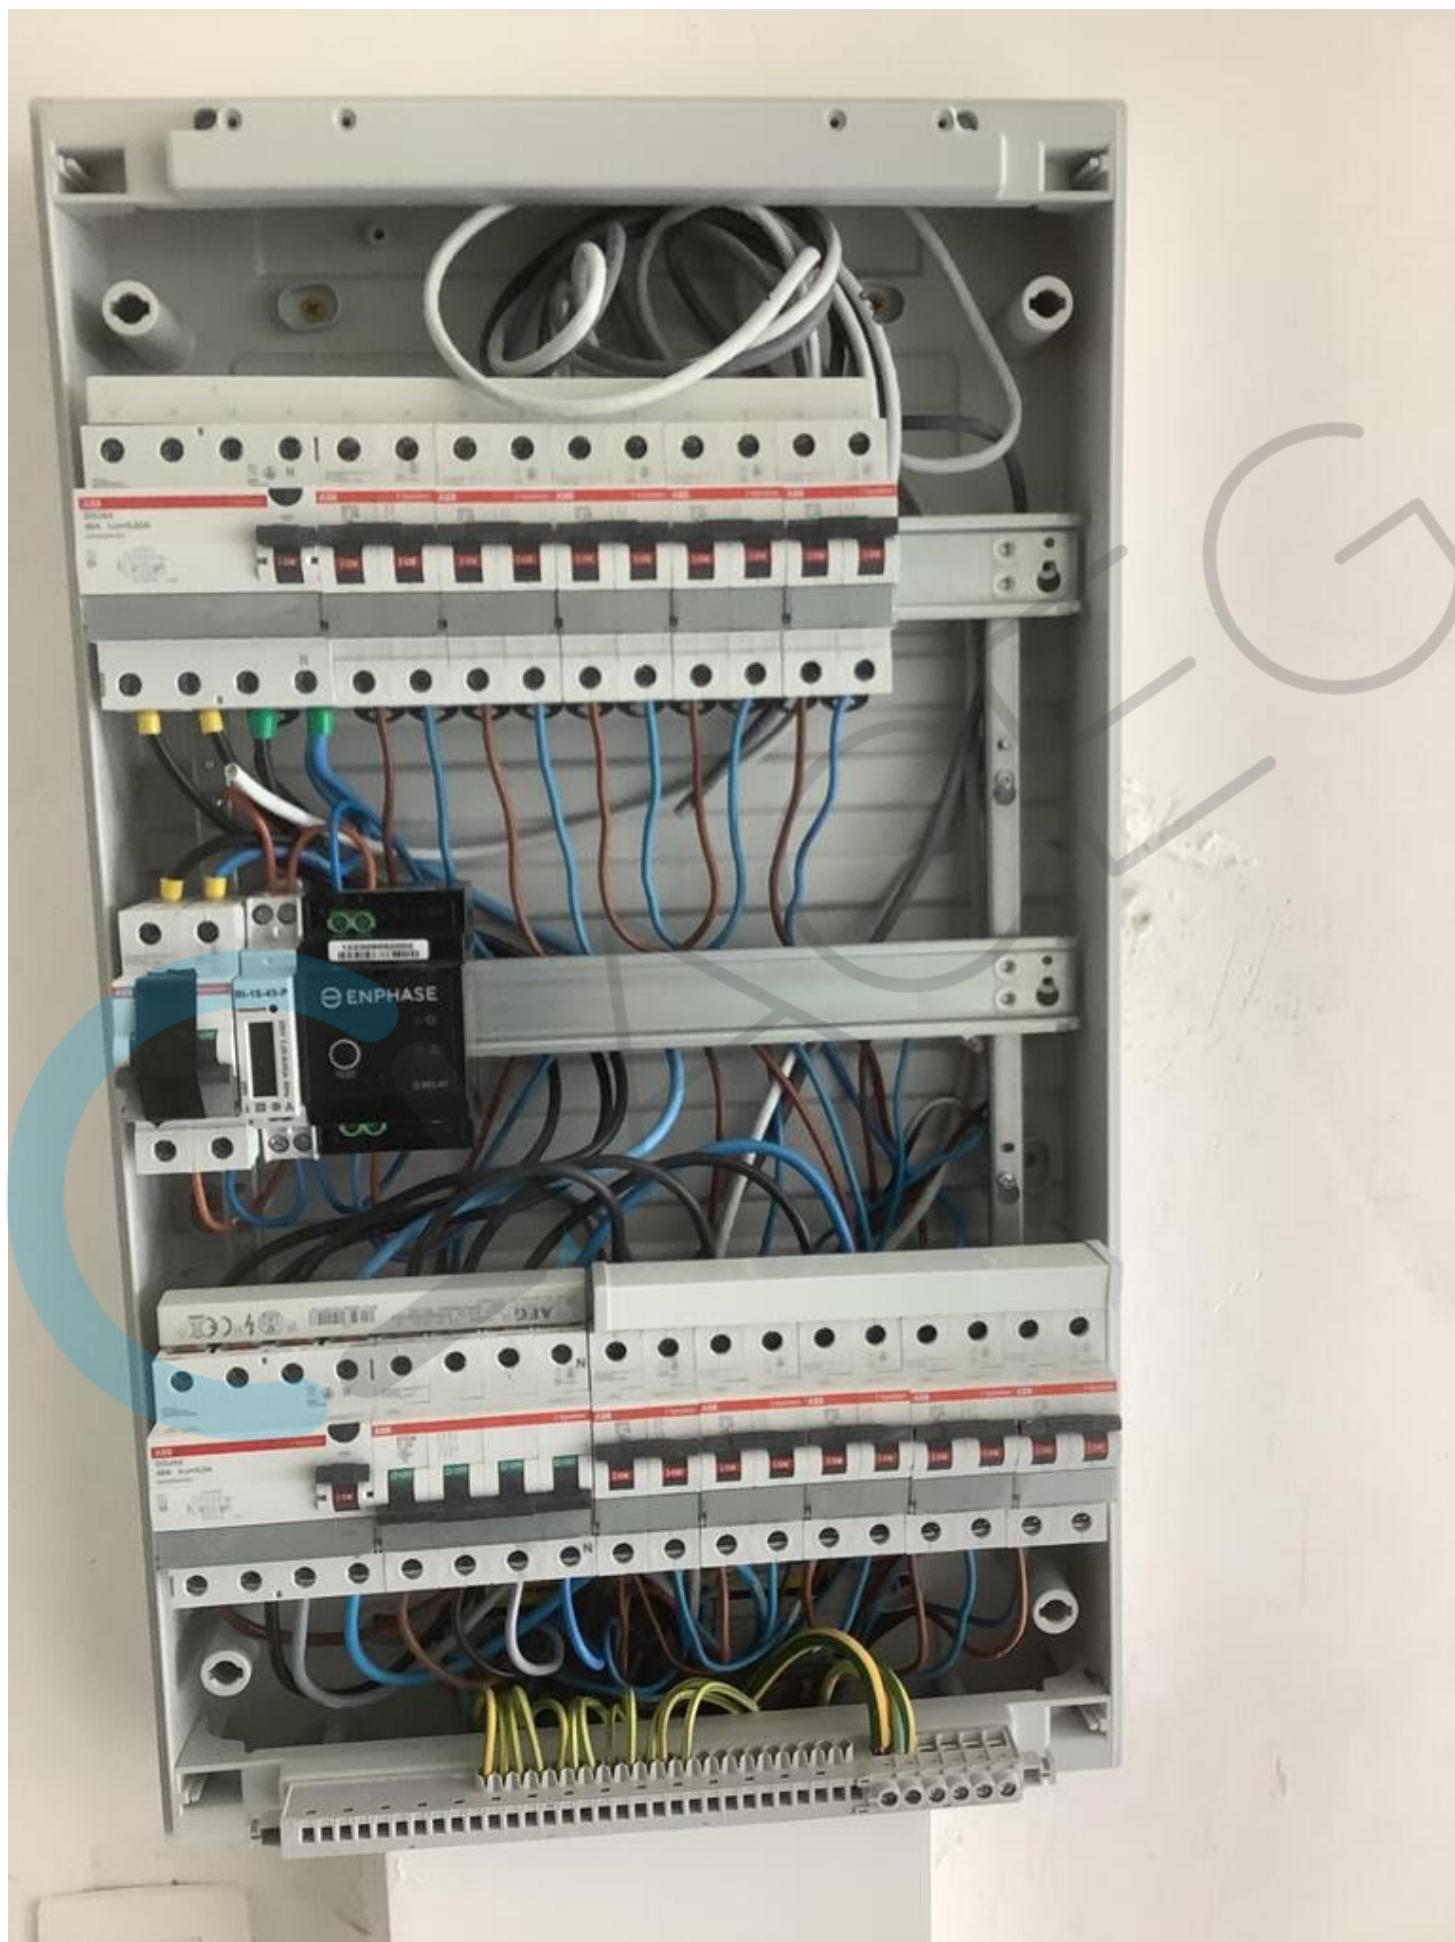







- Dubbel stopcontact
- Enkel stopcontact
- Schakelaar met verklipper
- Schakelaar enkele directie
- Schakelaar dubbele directie
- Schakelaar drie dubbele directie
- Lichtpunt
- Lichtpunt wand
- T.V. Coax aansluiting
- Data Internet aansluiting
- Verdeelbord
- bewegingsmelder
- RM Rookmelder

BORD 1

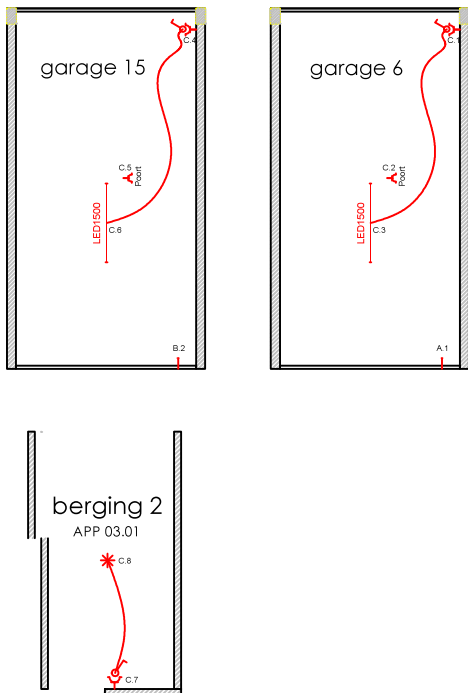

BORD 2

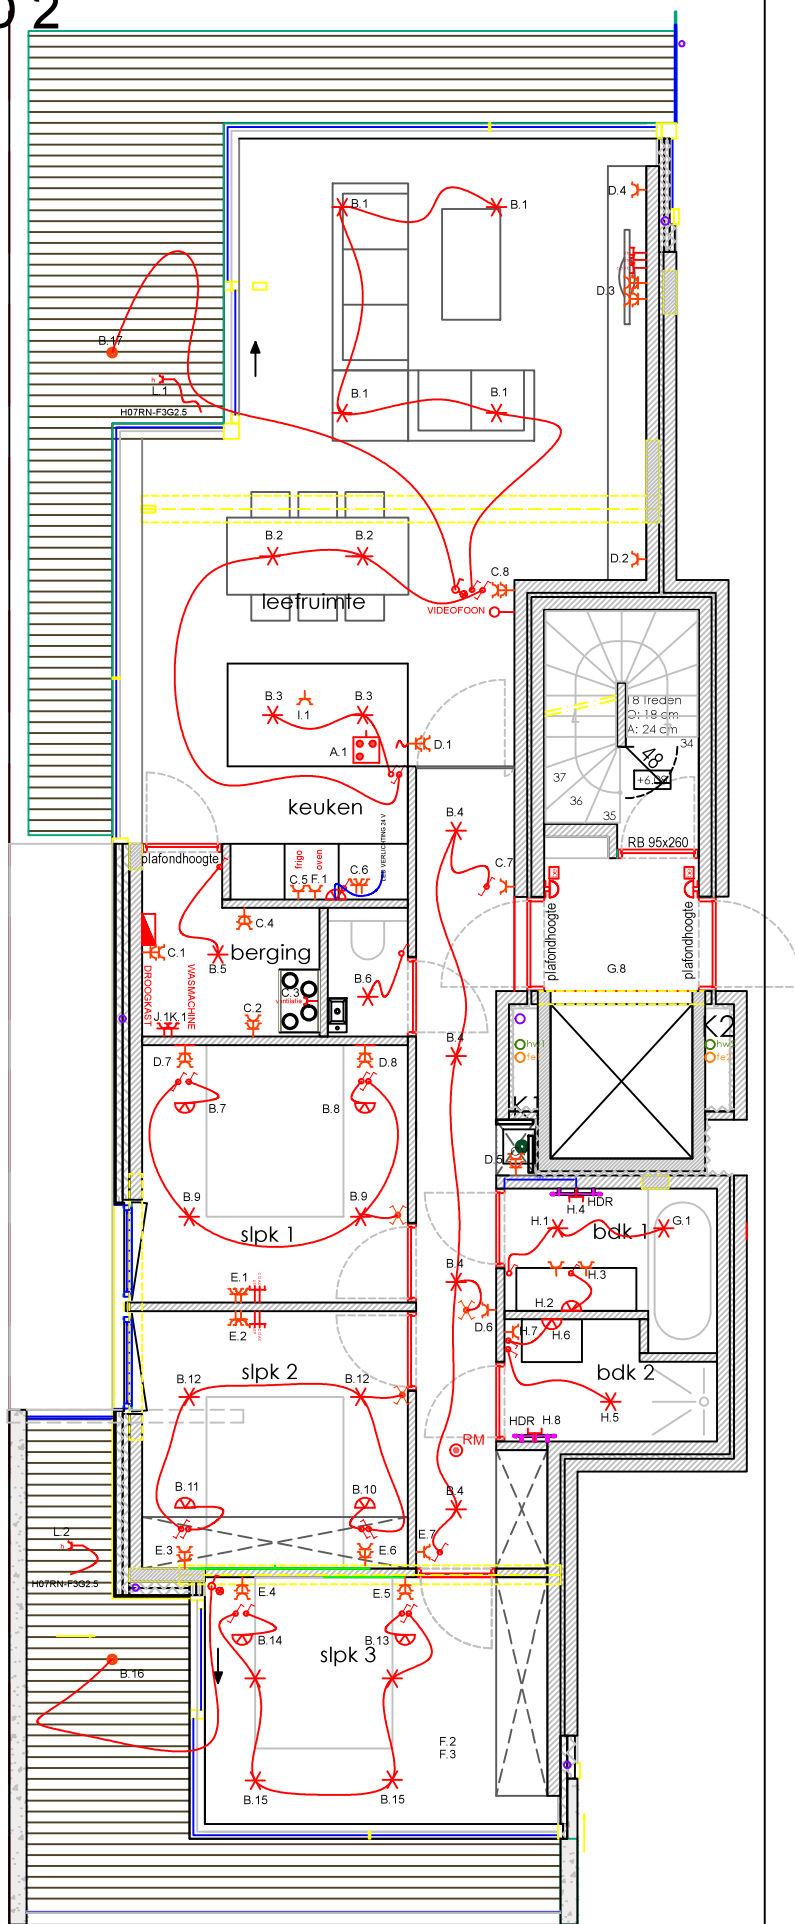

22-03.01

Project	Bouwheer	Keuringsorganisme:	Plan:	Vijzigingen:	ELEKTRO SCHOONAERT
Portino Albert I Laan 22 8620 Nieuwpoort	NV Capri Invest Joos de ter Beerstaen 64 8740 Pitten		Blad:		REYGAERDIJKSTRAAT 18 8630 VEURNE Tel 058 31 40 69 Fax 058 31 55 42 elektro@schoonaert.be www.elektro-schoonaert.be
			Schaal:		
			Datum:		




BORD 1

Reserve Garage G6

Reserve Garage G15

Garage 6+15 + Berg 2

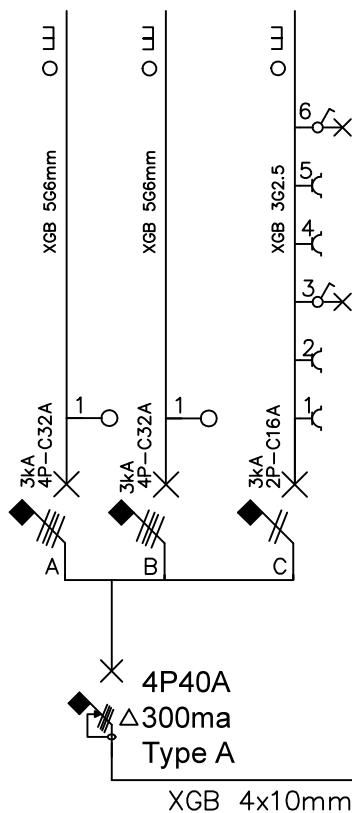

BORD 2

Kookplaat

Verlichting


Stopkontakten

Stopkontakten

Stopkontakten

Oven 1

Zonnepanelen

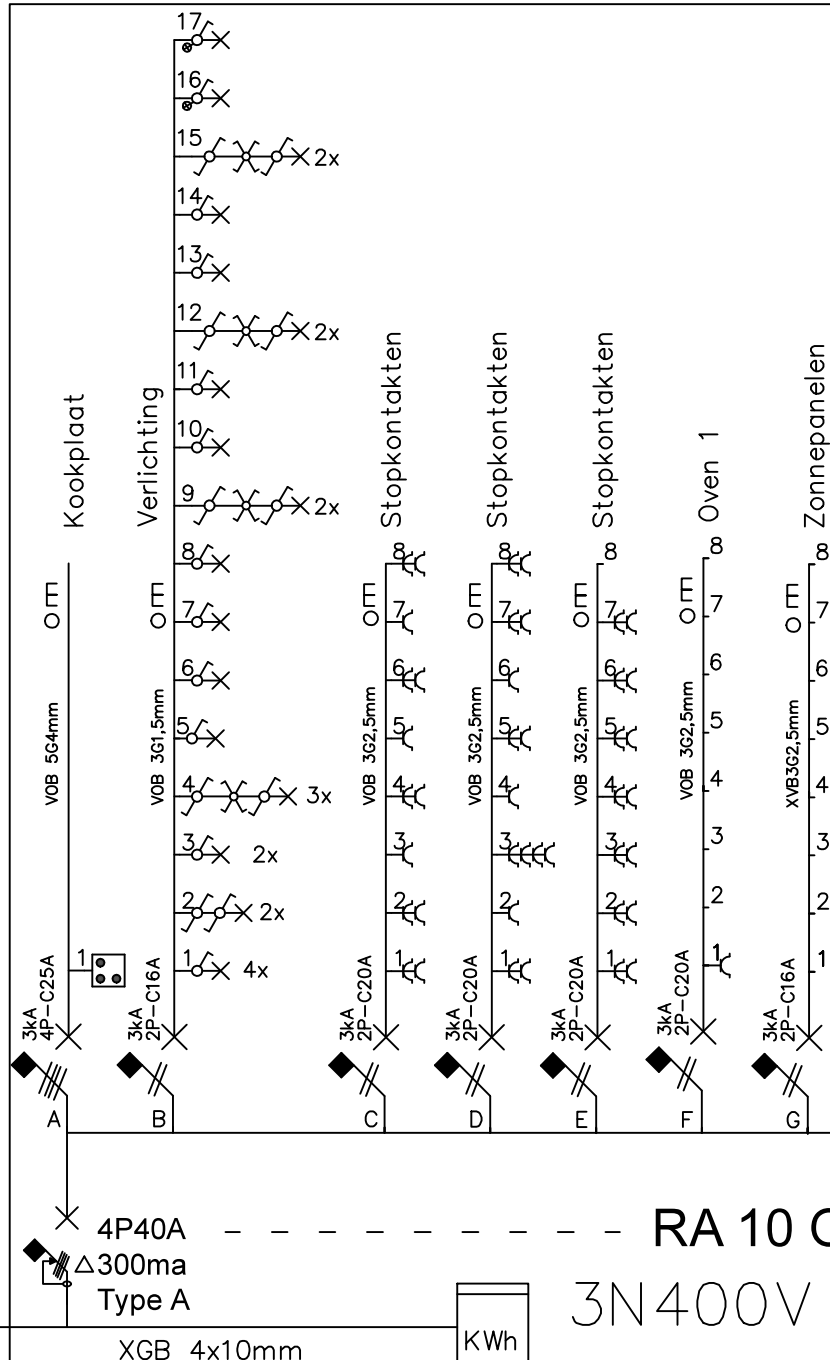


Badkamer

Vaatwas

Wasmachine

Droogkast

Stopcontacten

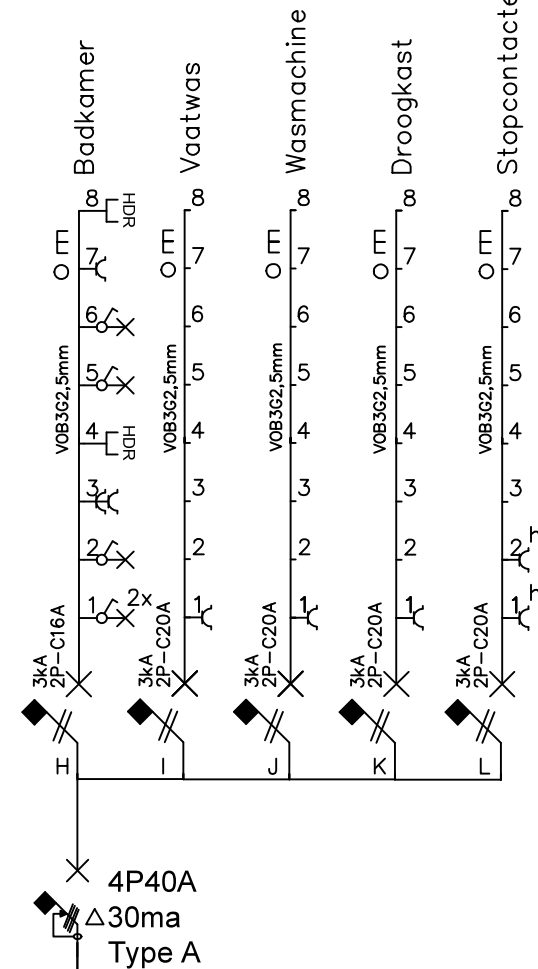

RA 10 Ohm tellerlokaal 22

3N400V

EAN 541448860022427520

22.03-01

Project	Bouwheer	Keuringsorganisme	Plan	Wijzigingen	ELEKTRO SCHOONAERT REYGAERDIJKSTRAAT 18 8630 VEURNE Tel 058 31 40 69 Fax 058 31 55 42 elektro@schoonaert.be www.elektro-schoonaert.be
Portino Albert I Laan 22 8620 Nieuwpoort	NV Capri Invest Joos de ter Beerstaan 64 8740 Pitten		Blad		
			Schaal		
			Datum		

