

## Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

### CONFORM

**Datum keuring:** 02/07/2025

**Inspecteur:** Jason Landsvreugt

**Mentor:** -

**Installateur:** Nova Elektro

**ID-label:** Ringlaan 76/10

B.T.W. nr.: BE 1003 992 263

**Klantreferentie:** -

Merk en type meettoestel: Metrel MI 3102  
BT

Serienummer: 23120863

**Datum verslag:** 02/07/2025

#### Plaats van het onderzoek

Straatnaam Ringlaan  
Huisnummer 76  
Busnummer 10  
Postcode 2610  
Gemeente Wilrijk  
Land België

#### Eigenaar

Naam Gils  
Straatnaam Ringlaan  
Huisnummer 76  
Busnummer 10  
Postcode 2610  
Gemeente Wilrijk  
Land België

#### Installateur

Naam Nova Elektro  
BTW nr. BE 1003 992 263  
Telefoonnummer +32 484 90 14 19  
E-mail nova-reno@live.be

**Type :** appartement

**EAN :** 541448820049749531

**Teller Nr. :** 1SAG1100729170

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



#### Aard onderzoek:

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 1N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 12


Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 77,1 MΩ

RE: 7,29 Ω

OK

OK



#### DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

| Δ (mA) | In (A) | In - andere (A) | I <sub>t</sub>   | Type | Beveiligde kringen | Test | x 2,5 |
|--------|--------|-----------------|------------------|------|--------------------|------|-------|
| 300    | 40     |                 | 22,5kA2s (3000A) | A    | 12                 | OK   | OK    |
| 30     | 40     |                 | 22,5kA2s (3000A) | A    | 8                  | OK   | OK    |

#### BESCHRIJVING INSTALLATIE

| Aantal kringen              | Curve | Bescherming IN (A)              | (andere) | P                   | Sectie (mm²) |
|-----------------------------|-------|---------------------------------|----------|---------------------|--------------|
| Zie schema's                | -     | -                               | -        | -                   | -            |
| Visueel nazicht (algemeen)  | OK    | Directe aanraking               | OK       | Indirecte aanraking | OK           |
| Aansluitingen               | OK    | schema in bijlage door Aceg vzw | NA       |                     |              |
| Equipotentiale verbindingen | OK    | Doorsnede geleiders             | OK       |                     |              |
| Continuïteit                | OK    | Verlichting / toestellen        | OK       |                     |              |

#### OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

N2 Geen inbreuken vastgesteld.

N5 De verlichting is nog niet definitief geplaatst.

#### BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 2/7/2050
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

#### VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 14:33 tot 15:09

De inspecteur Jason Landsvreugt

Jason Landsvreugt  
ACEG VZW - #316

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.

Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.

Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

#### Kwaliteit

De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.


De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar [www.aceg.be](http://www.aceg.be)

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

| Stappenplan voor een installatie die conform is:                               |                                                                                                       |                                                          |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Stap 1                                                                         | Stap 2                                                                                                | Stap 3                                                   | Stap 4                                                      |
| Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's | Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren. | De volgende periodieke keuring is voorzien voor 2/7/2050 | ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen. |



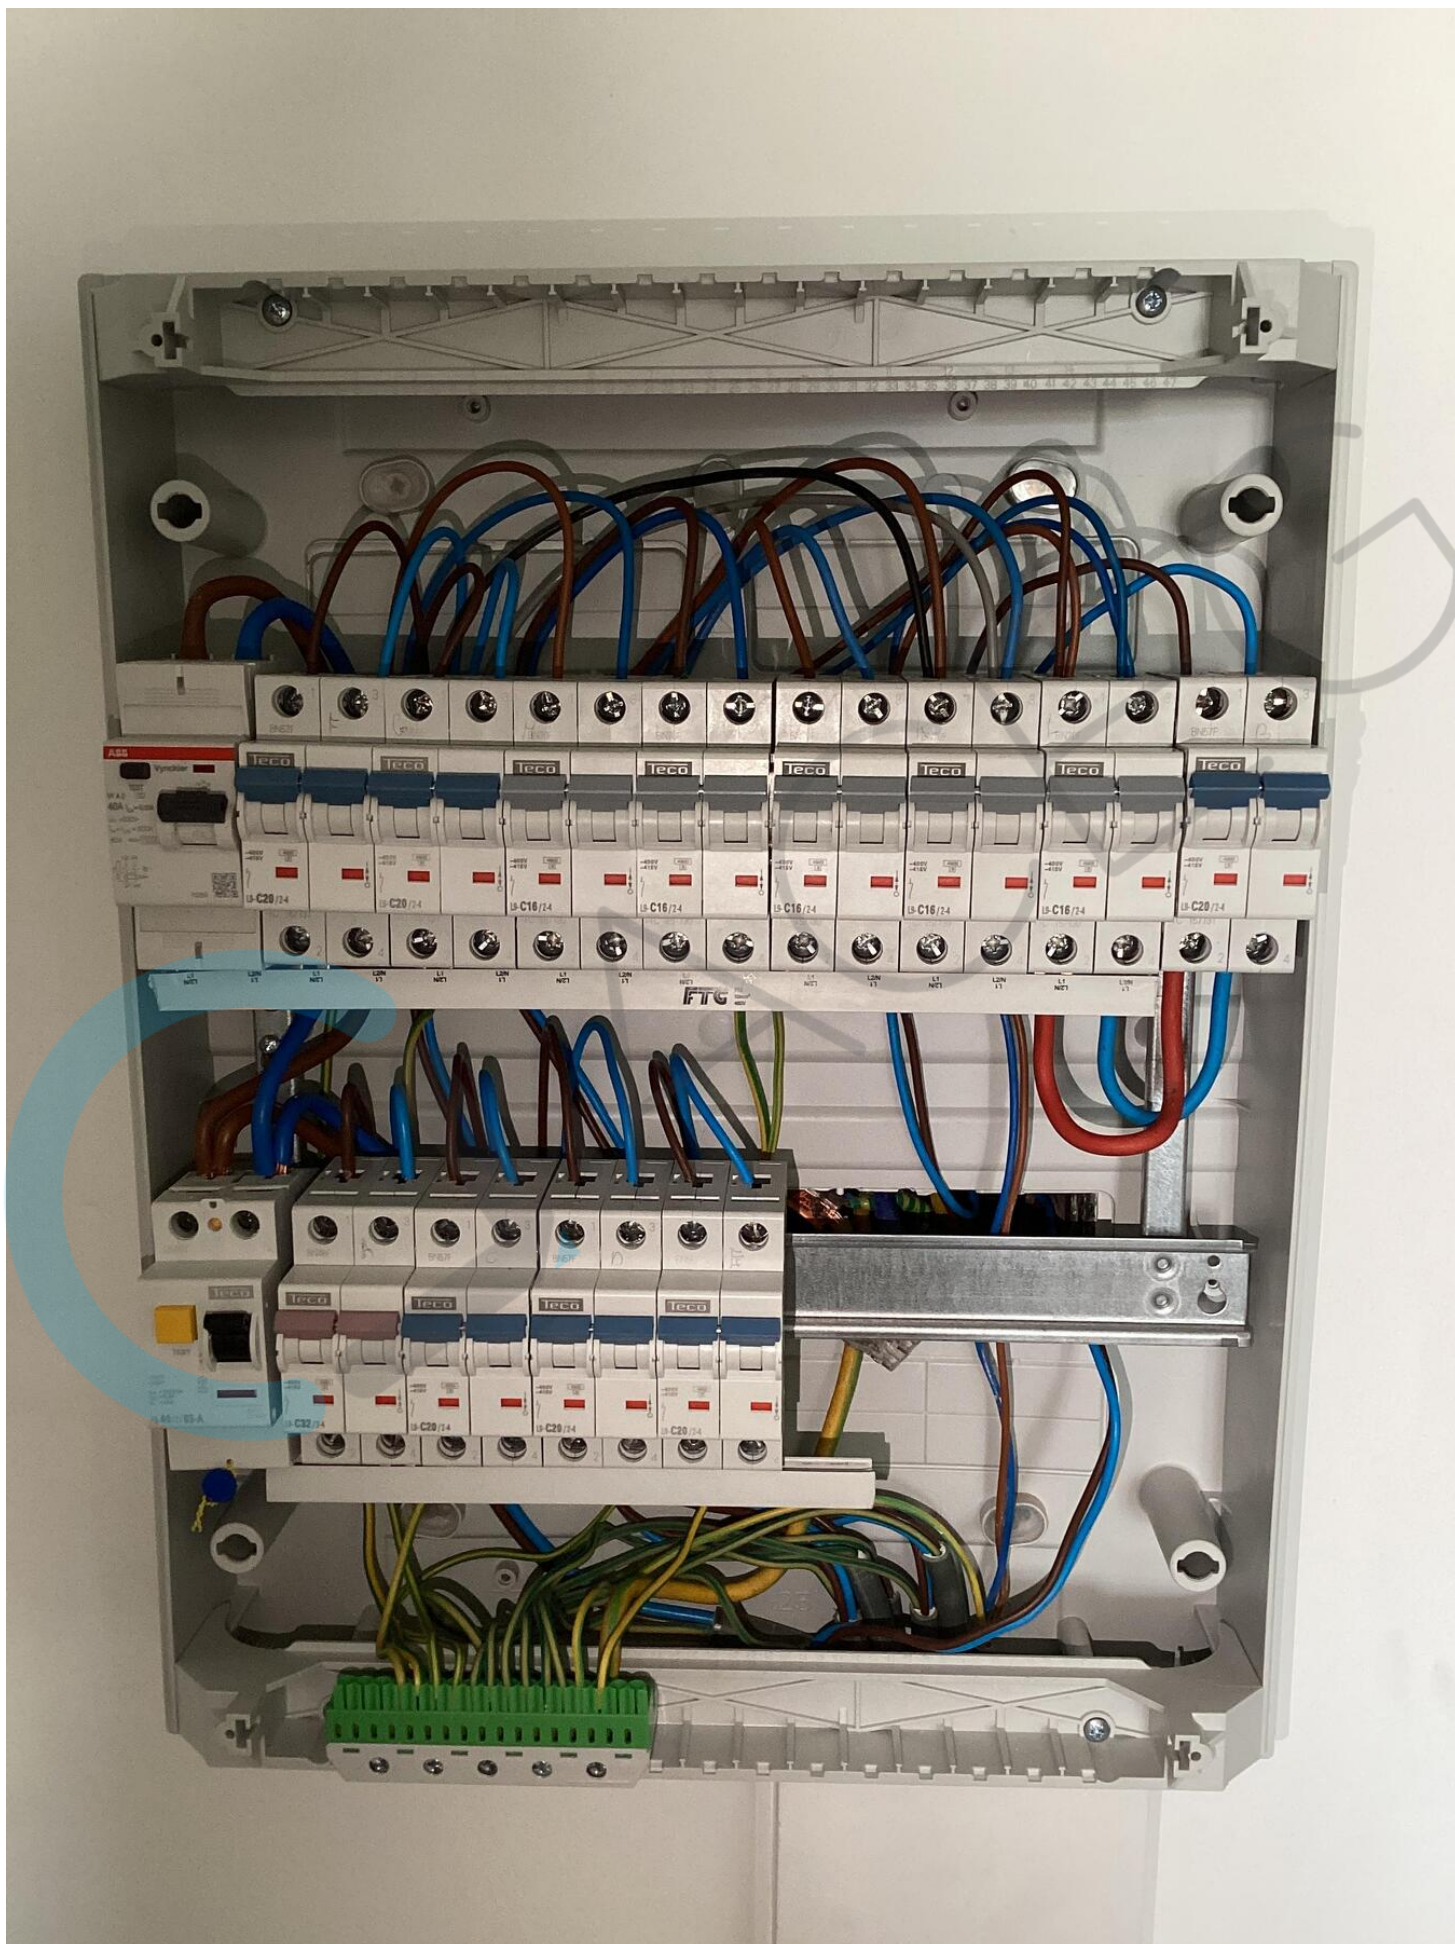













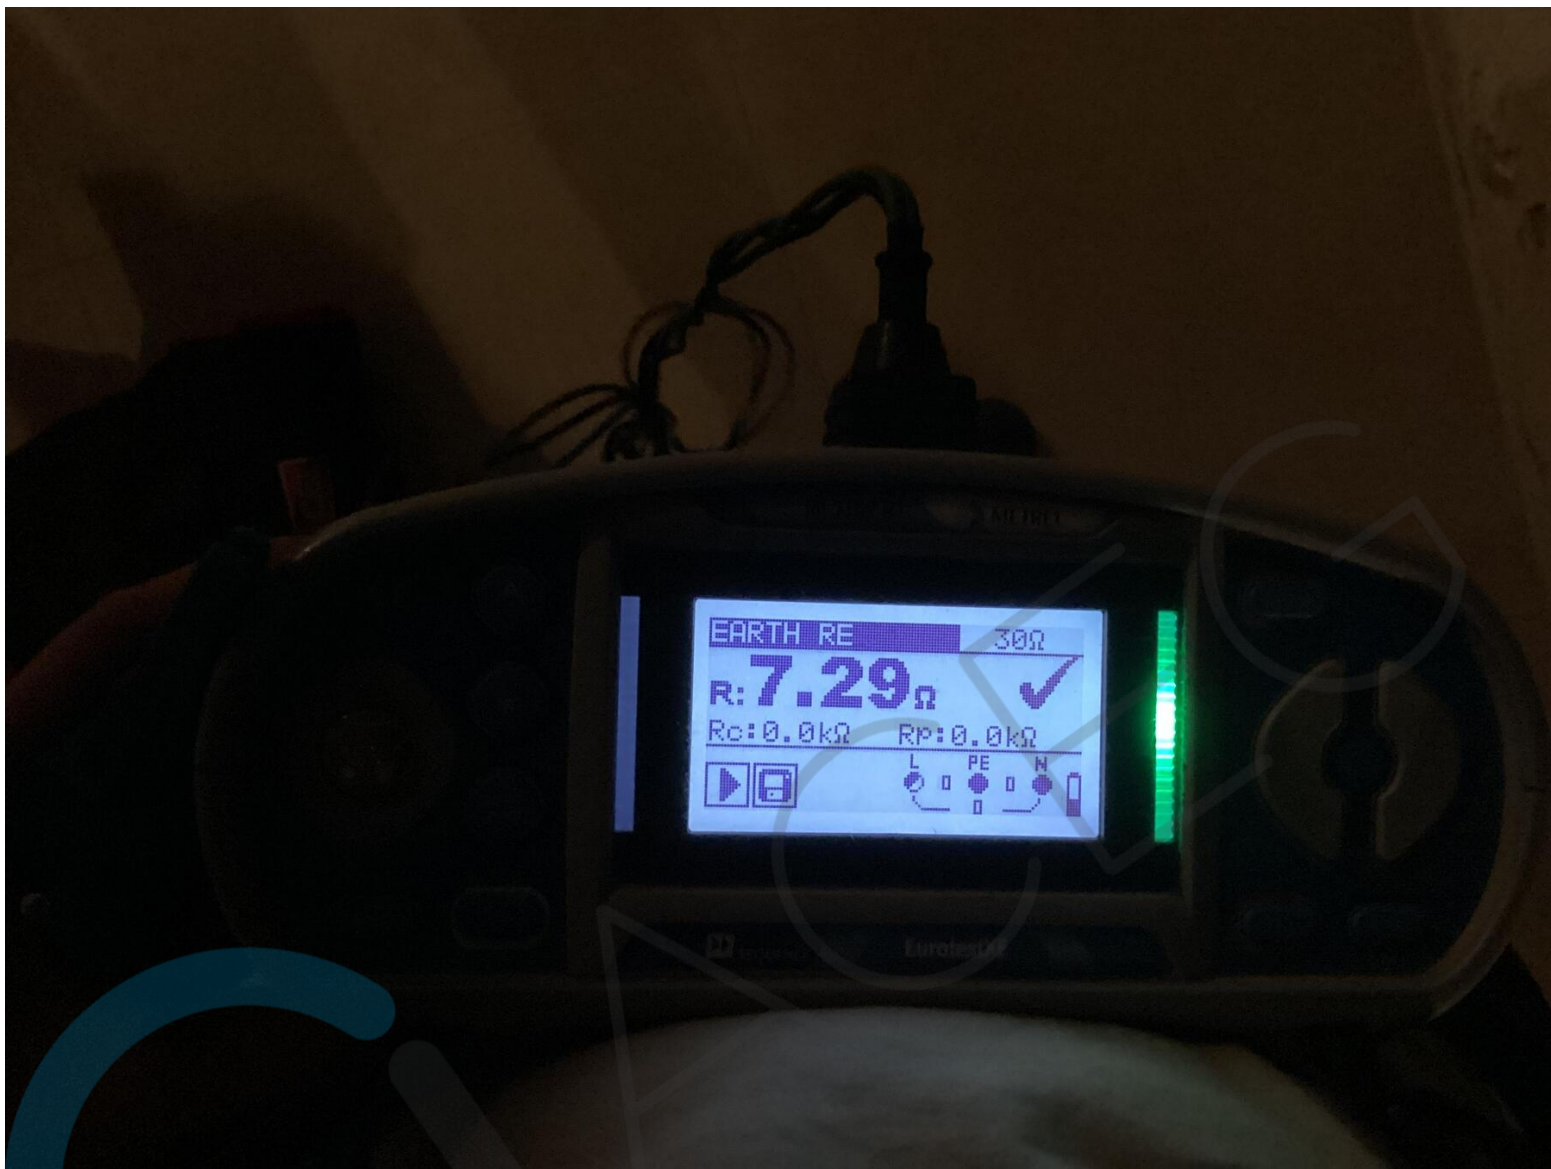





2 x 230V - 50Hz

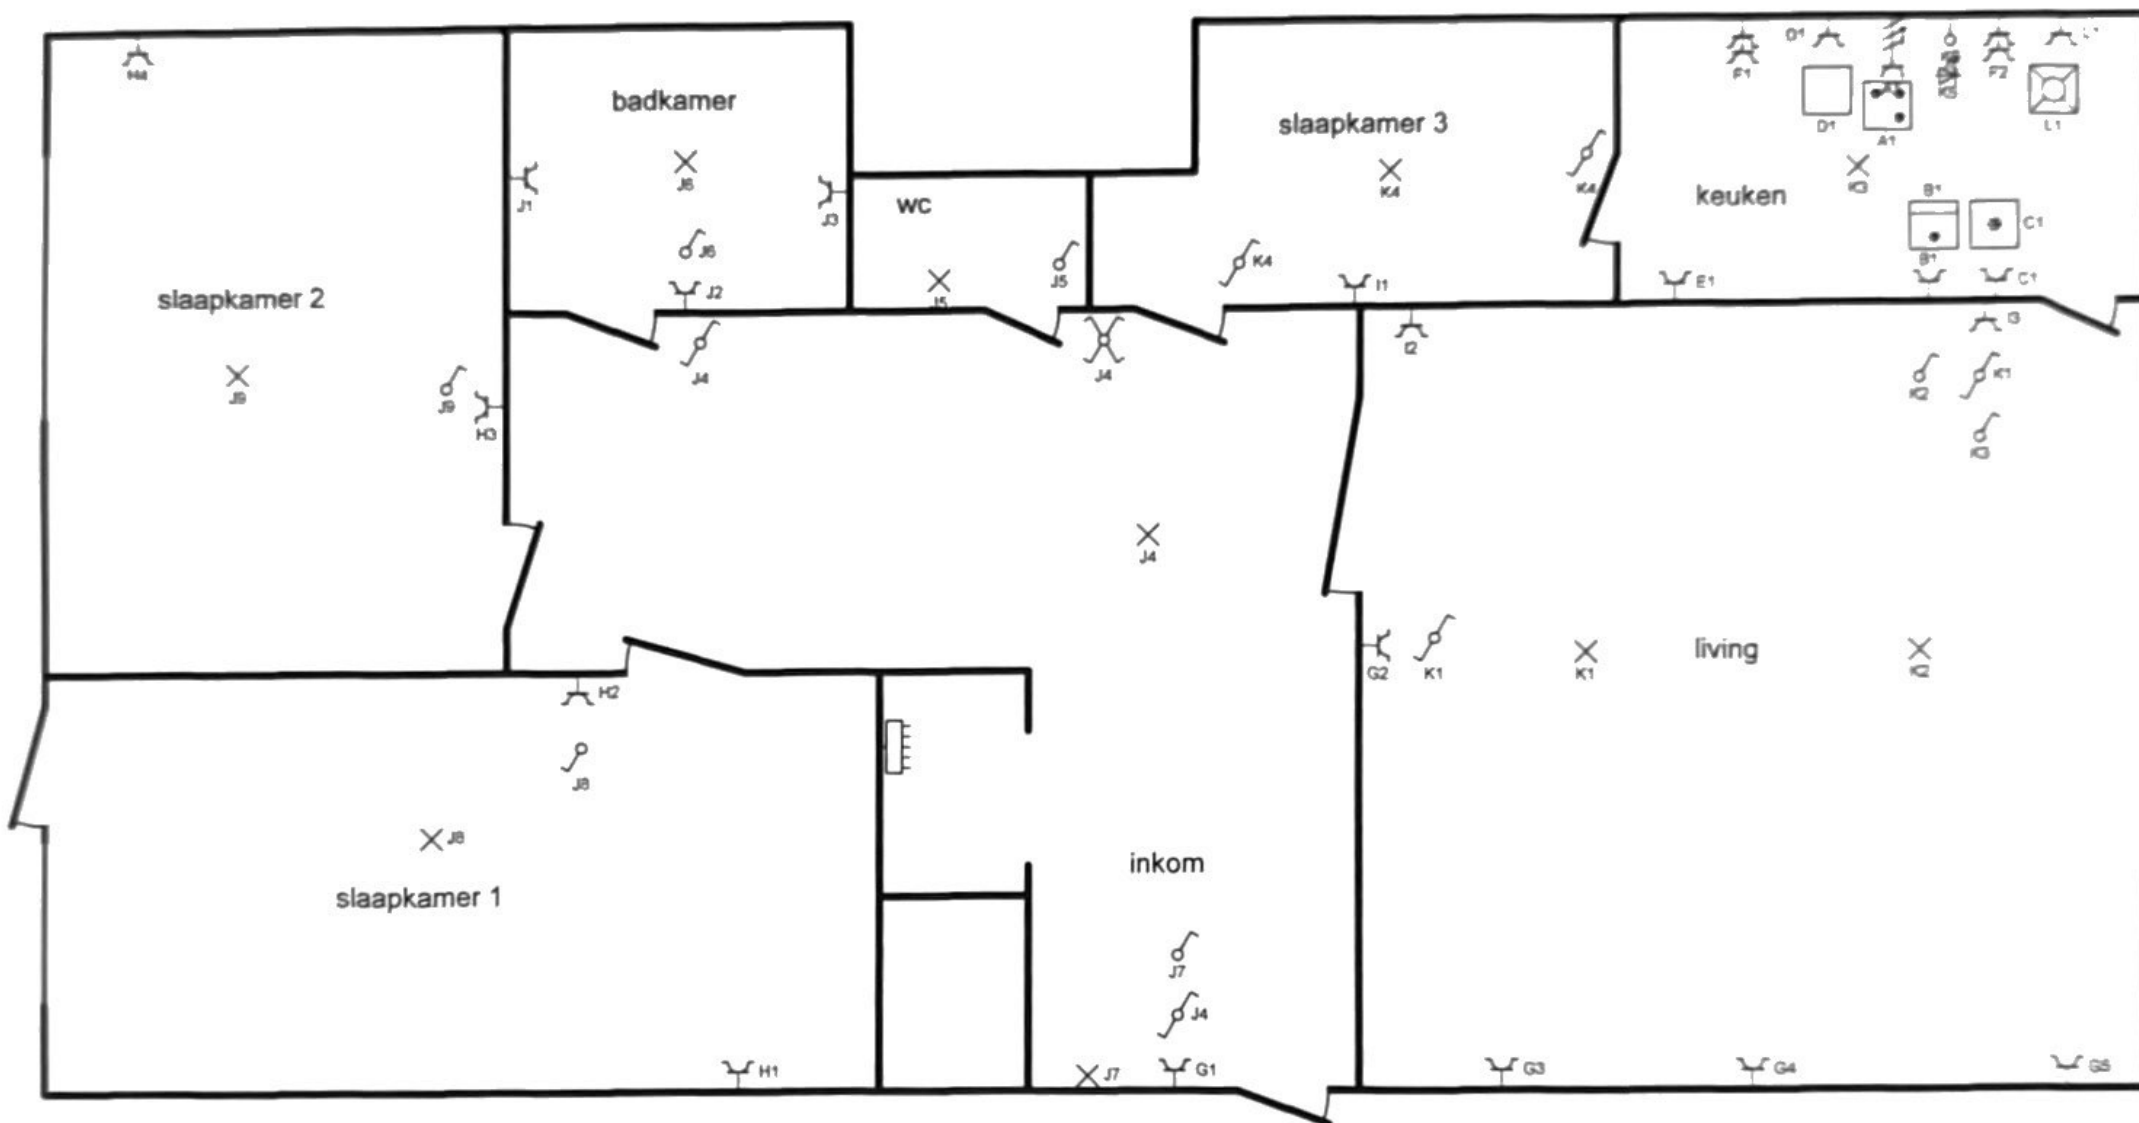

Plaats van de elektrische installatie

Gils  
ringlaan 76  
2610 wilrijk

Installateur

Nova Renovatiewerken  
Antwerpsesteenweg 296  
2660 Hoboken  
GSM: 0484 90 14 19  
e-mail: nova-reno@live.be  
BTW BE 0845.203.164

p. 2/3

Situatieschema

2 x 230V - 50Hz

**ACEG**  
Erkend leveringspunt voor Originele  
**Jasen Landsvreugt**

02/07/2025
