

Mission: 20190613002688
Client / Entreprise: TSPO Sprl rue Zénobe Gramme 11 4890 Thimister
ProKo.: ELEC-07
Num. rapport: **201900003288-V.0**

N° Client: 201900001786
11 4890 Thimister
Réf.PV précédent:

Contact: Belfius SMDI Arlon
TVA: BE 0473 807 683
Date d'émission: 12/06/2019

EXEMPLAIRE ORIGINAL

PROCES-VERBAL D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BT DE RACCORDEMENT DÉFINITIF ou RÉSIDENTIEL

GÉNÉRALITÉ

Type d'installation: Nouvelle
Lieu d'inspection: Rue de Bitburg 14 6700-ARLON
Type d'inspection: examen de conformité
Date d'inspection: 12/06/2019 **Contrôle suivant dans - mois, ou avant 12/06/2044**
Propriété de: Belfius SMDI Arlon
Installateur: TSPO Sprl
NRN:
Type de locaux: Maison
Suivant AREI: Art86/Art270/
Inspecteur: KOLUKISA OGLU, Alein
T.V.A.: BE 0473 807 683
Déjà livré à:
Date:

DESCRIPTION

Numéro EAN: **Compteur:** Absent **Index I:** Absent **Index II:** Absent
Raccordement: Réseau souterrain
Tension de serv.: 2x230V **I max. instal.:** 63A **Protection principale:** -
Liaison comptage-coffre de repart.: **Type de câble:** EXVB **Nombre de cond.:** 2 **Section :** 16 mm2
Électrode de terre: type: boucle **Section:** 35 mm2 **Résistance de dispersion:** =<16 Ohm
Inter.Diff.Général: 2p 63A/300mA **est plombé par scelles:** p.a **Diff. supplém.:** 2p 63A/30mA
Fonctionn. bouton d'essai: en ordre **Contrôle Boucle de défaut:** en ordre **Résist. d'isolement général:** >1 MOhm
Installation exécutée conformément aux schéma's: en ordre **Etat du matériel électrique:** en ordre
Inventaire des influences externes présent et signé: p.a
Protection contre les chocs électriques: **Contact direct:** en ordre **Contact indirect:** en ordre
Continuité PE et liaison équipotentielle: en ordre **Matériel fixe ou mobile:** en ordre
Description Installation: voir les schémas en annexe schéma unifilaire et schéma de position ont été signés pour approbation
Pas encore placés: cuisine salle de bain C.C. compt.gaz compt.d'eau liaison équip. principale équip.-supp.
Nombre de tableaux: 1 Nombre de circuits terminaux: 15 :

CONSTATATIONS

Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) - les numéros réfèrent aux infractions standardisées

N11 -Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe, ne font pas partie de l'inspection..

N12 -Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.

N13 -Sauf stipulation contraire, l'examen porte exclusivement sur l'état et le bon fonctionnement de l'installation. Sa conception sort du cadre de la mission.

N01 (03.06) -

CONCLUSION

L'INSTALLATION EST CONFORME AU RGIE

L'installation peut rester/ être mise en service. L'installation doit être contrôlée au plus tard a la date mentionnée ici dessus, telle que prévu par Art. 271 du RGIE, ainsi qu'avant toute mise en service d'une modification importante ou d'une extension notable, exécutées avant cette date.

Pour le Directeur Technique,



L'Inspecteur,



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Le propriétaire de l'installation électrique en présence ou son gérant est tenu par les prescriptions réglementaires suivantes, conformément à AM du 06.12.2006 Art273-7

1. l'obligation de conserver le rapport de conformité dans le dossier de l'installation électrique.
2. l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation et l'obligation de faire procéder à un contrôle de conformité de toute modification ou extension importante de l'installation électrique soit par un organisme agréé soit par l'autorité habilitée ou chargée de le faire selon les prescriptions de l'article 275.
3. l'obligation d'aviser immédiatement le Service Public Fédéral ayant la Sécurité du Travail dans ses attributions et le Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et du, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.

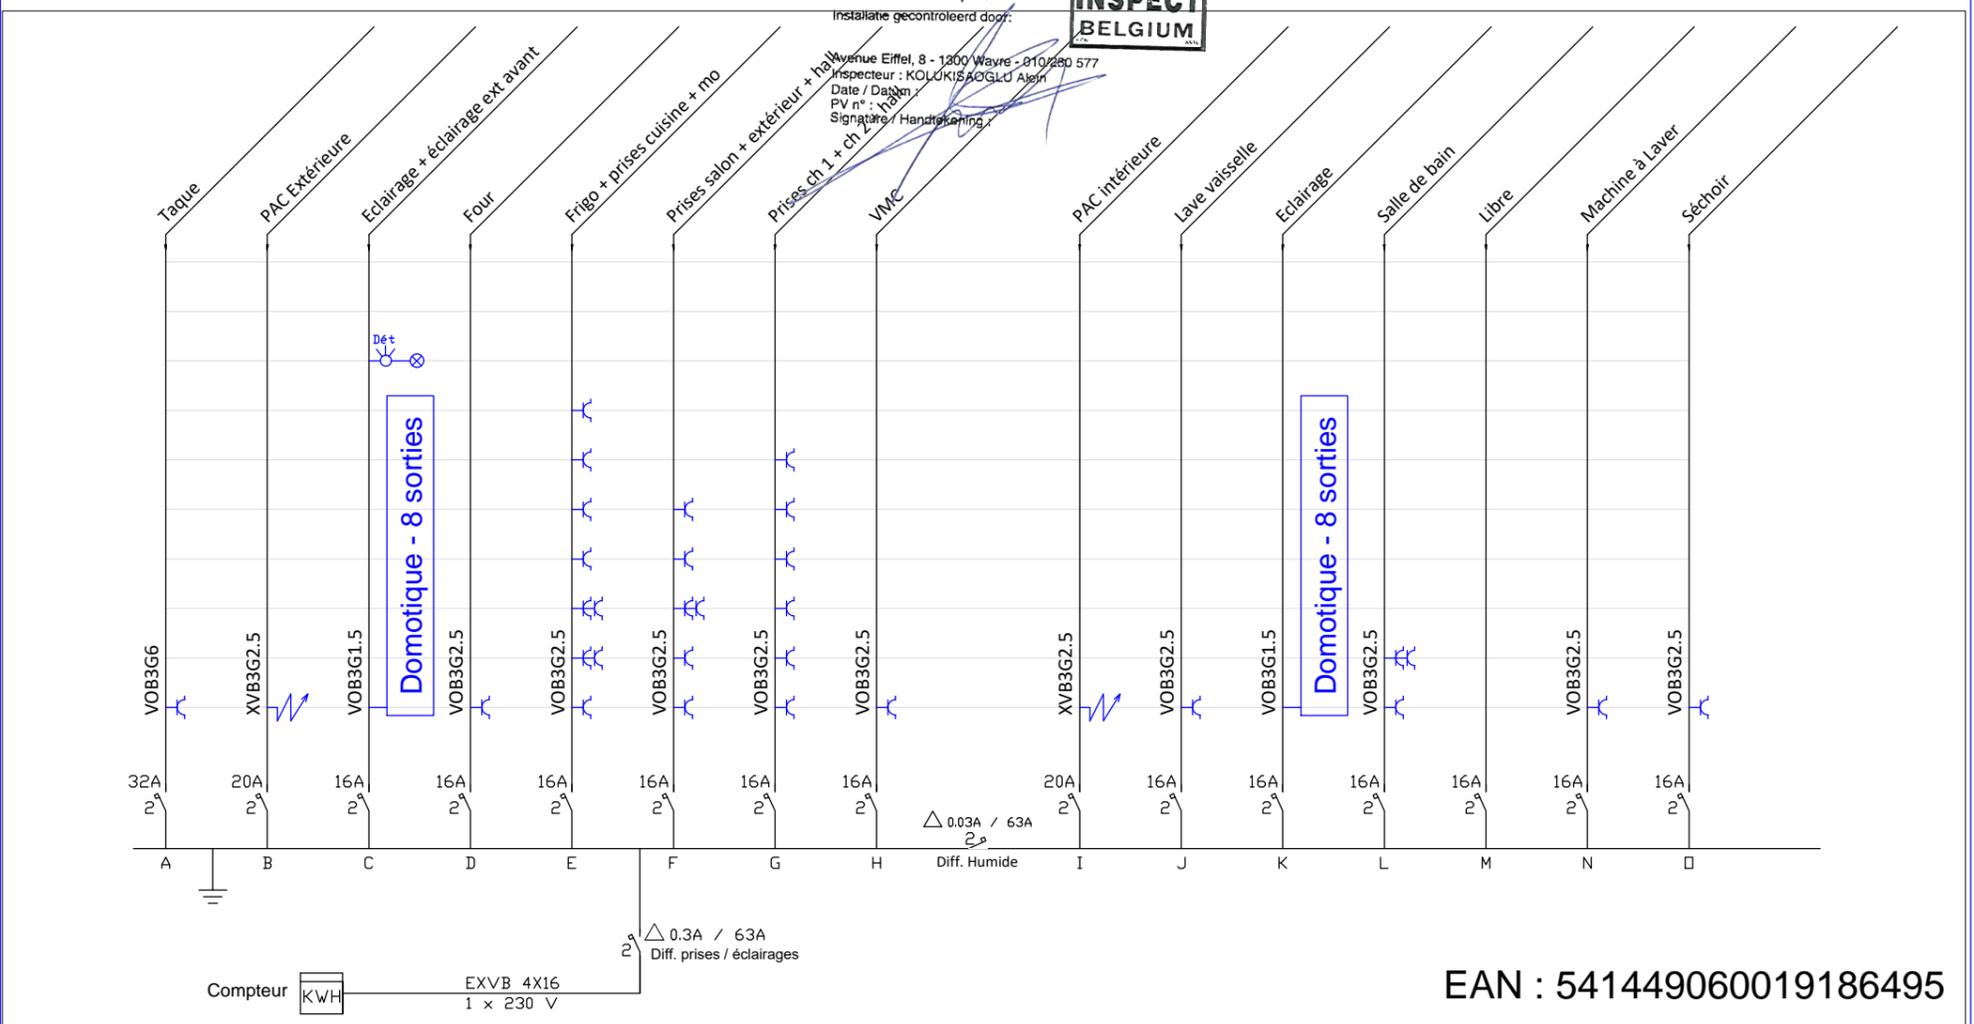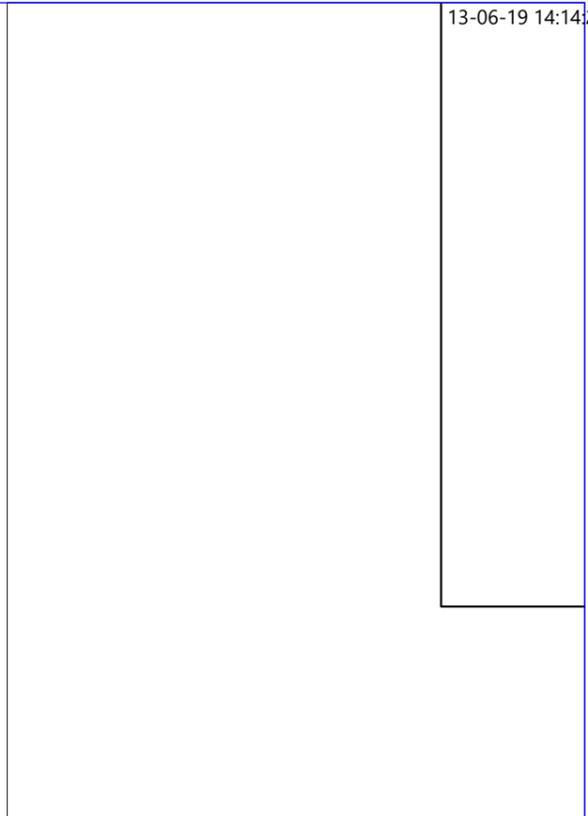

Installation contrôlée par :
 Installatie gecontroleerd door:
INSPECT BELGIUM
 Avenue Eiffel, 8 - 1300 Wavre - 010 280 577
 Inspecteur : KOLUKISA OGLU Akem
 Date / Datum :
 PV n° :
 Signature / Handtekening :

EAN : 541449060019186495

Rue de Bitburg, 14
 6700 Arlon

Bon pour exécution; Signature MO :		SMAR ARLON 03.06		Indice		Date		Commentaire		Electricité générale	
Date :		ELECTRICITE		Feuille 1 de 1		12/06/2019		Réception organisme agréé		Rue Zénobe Gramme 11 4890 THIMISTER 087/445109 www.tsपो.be	
						17/08/2018		Ajout prise + déplacement pl sdb			
						09/03/2018		Plan de base suivant contrat			
