

**ATECON vzw**  
**Prins Boudewijnlaan 41 bus 8**  
**2650 Edegem**  
**Tel: 03/770 75 14**  
**www.atecon.be / info@atecon.be**



N°618-INSP

## KEURINGSVERSLAG ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN ZEER LAGE SPANNING

### Algemene gegevens :

|                          |                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Datum verslag:           | 21/08/2025                                                      |
| Verslag N°:              | 803955                                                          |
| Datum keuring:           | 21/08/2025                                                      |
| Inspecteur:              | Dewin Jeroen                                                    |
| Keuring N°:              | 202511502                                                       |
| Controle volgens Boek 1: | 8.4.2.                                                          |
| Aanwezigen:              | /                                                               |
| Type keuring:            | Verkoop wooneenheid oude huishoudelijke elektrische installatie |

### Adres- en onderzoeksgegevens :

|                           |                                            |                      |                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| Plaats van het onderzoek: | Posthoevestraat 24 , 2150 BORSBEEK (ANTW.) |                      |                                          |
| Teller n°:                | 6240753                                    | Index teller:        | Dag: 88588,00 Nacht:                     |
| Datum installatie:        | Voor 01/10/1981                            |                      |                                          |
| EAN-code:                 | /                                          |                      |                                          |
| Naam opdrachtgever:       | KARIN BAEKELMANS                           | Adres opdrachtgever: | Steenwinkelstraat 530, 2627 SCHELLE      |
| Naam eigenaar:            | BAEKELMANS                                 | Adres eigenaar:      | Posthoevestraat 24 2150 BORSBEEK (ANTW.) |
| Installateur:             | Bestaande installatie                      | Adres installateur:  | /                                        |
| BTW-n° of ID:             | /                                          |                      |                                          |
| Type lokaal:              | Woning                                     |                      |                                          |

### Algemene gegevens elektrische installatie:

|                    |                     |                       |              |                          |                            |
|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|----------------------------|
| Nominale spanning: | 1 x 400V + N (230V) | Max. beveiliging:     | 2 x 40 A     | Meter – bord verbinding: | VVB 4 x 10 mm <sup>2</sup> |
| Type electrode:    | Piket               | # verdeelborden:      | 1            | # stroombanen:           | 2                          |
| Netsysteem:        | TT                  | Type alg. schakelaar: | Lastscheider |                          |                            |

### Differentieelschakelaars:

|     |     |     |       |      |       |       |
|-----|-----|-----|-------|------|-------|-------|
| In: | IA: | #p: | Type: | Icu: | Test: | X2,5: |
|-----|-----|-----|-------|------|-------|-------|

### Beschrijving van de installatie:

|                          |                                  |         |
|--------------------------|----------------------------------|---------|
| Beveiligde en # kringen: | Bescherming:                     | Sectie: |
| Geen DSI aanwezig # 2    | 1xsmeltz.6A 2P, 1xpenaut. 10A 2P |         |

### Metingen, proeven en visuele controles:

|                    |                              |      |      |                        |     |
|--------------------|------------------------------|------|------|------------------------|-----|
| Ra:                | Alg. isolatieweerstand:      | 0,05 | MOhm | Aardingscontinuïteit:  | NOK |
| Directe aanraking: | Indirecte aanraking:         | NOK  |      | Alg. visuele controle: | NOK |
| Correcte schema's: | Equipotentiale verbindingen: | NVT  |      | Vaste toestellen:      | NVT |

### Vaststellingen (Inbreuken, opmerkingen en nota's):

**Besluit:** De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van Boek 1 van het KB van 8.09.2019 betreffende de installaties van laagspanning en zeer lage spanning.  
 De koper moet een nieuw controlebezoek, om het in orde brengen van de installatie na te gaan, binnen een termijn van 18 maanden te rekenen vanaf de dag van de verkoopakte laten uitvoeren.

### Aantal bijlagen:

Ééndraadschema's: NEE

Situatieplannen: NEE

Andere: /

### De inspecteur,

Dewin Jeroen



**ATECON vzw**  
 Prins Boudewijnlaan 43 bus 10  
 2650 Edegem  
 BTW BE0408.677.925  
 info@atecon.be

Visum DNB (art. 270)

**ATECON vzw**  
**Prins Boudewijnlaan 41 bus 8**  
**2650 Edegem**  
**Tel: 03/770 75 14**  
**www.atecon.be / info@atecon.be**



### **VASTSTELLINGEN: Inbreuken**

#### Inbreuken aarding :

- 1.07. : De aardingsonderbreker is niet aanwezig en/of kon niet worden getoond.

#### Inbreuken PE-geleider :

- 2.05. : De continuïteit van het stopcontact / verlichting is niet gewaarborgd.

#### Inbreuken brand :

- 3.02. : De isolatieweerstand van meerdere kringen is onvoldoende < 500 kOhm.

#### Inbreuken differentieels :

- 4.01. : Er zijn geen D.S.I. aanwezig.

#### Inbreuken elektrisch dossier :

- 5.01. : Het ééndraadschema is niet aanwezig. ☐
- 5.02. : Het situatieplan is niet aanwezig.

#### Inbreuken leidingen :

- 7.18. : De vast aangesloten soepele leidingen vervangen door leidingen van het rigide type. ☐
- 7.21. : De VOB/CRVB- geleiders zijn niet geplaatst in een buis/ holle plint of lijst.

#### Inbreuken overstroom :

- 8.02. : De houder van de beveiliging is niet voorzien van aangepaste kalibreerelementen. ☐
- 8.05. : Vermindering sectie van de leiding maar geen aangepaste overstroombeveiliging geplaatst.

#### Inbreuken schakelaars en stopcontacten :

- 9.03. : Elektrische installaties binnen de volumes voldoen niet aan de gestelde eisen. ☐
- 9.07. : Er zijn stopcontacten met aardingspen waarvan de continuïteit niet is verzekerd.

#### Inbreuken verdeelbord en kringen :

- 11.03. : Rechtstreekse aanraking is mogelijk, geen IPXX-D gerespecteerd. ☐
- 11.04. : Er zijn overbrugde veiligheidsaanvoeren aanwezig. ☐
- 11.09. : Het bord is niet voorzien van een achterwand en/of deur. ☐
- 11.13. : De dienstspanning is niet vermeld. ☐
- 11.16. : Het schakelbord dient te worden vervangen, de beschermingsgraad tegen rechtstreekse aanraking is onvoldoende. ☐
- 11.19. : Alle verbindingen dienen gemaakt te worden in een onbrandbaar omhulsel (vb. aftakdozen).

#### Extra inbreuken

- Er zijn stopcontacten aanwezig zonder kinderbeveiliging: te vervangen door stopcontacten met kinderbeveiliging: doorheen de gehele woning. ☐
- Stopcontacten welke open zijn achteraan werden geplaatst op brandbaar materiaal: slaapkamers.

### **VASTSTELLINGEN: Opmerkingen**

Geen opmerkingen

### **VASTSTELLINGEN: Nota's**

#### Nota's algemeen :

- 1.05. : De afwezigheid van de schema's laat niet toe een grondige controle uit te voeren. ☐
- 1.06. : De afwezigheid van een legende in het bord met individuele aanduidingen, waardoor de identificatie van de stroombanen mogelijk wordt, laat niet toe een grondige controle uit te voeren. ☐
- 1.07. : De staat van de installatie heeft tot gevolg dat een grondige vernieuwing zich opdringt. ☐
- 1.10. : Enkel de zichtbare en bereikbare gedeelten van de installatie werden gecontroleerd. ☐
- 1.11. : Tijdens het onderzoek werden geen schakelaars, plinten, contactdozen, ... geopend.

#### Extra nota's:

Verdeelbord is niet te openen zonder demontage. Achterzijde niet te inspecteren. ☐

☐

Extra informatie mbt gemaakte inbreuken: ☐

- Geen meting spreidingsweerstand: meetklem aarding niet teruggevonden. ☐

**ATECON vzw**  
**Prins Boudewijnlaan 41 bus 8**  
**2650 Edegem**  
**Tel: 03/770 75 14**  
**www.atecon.be / info@atecon.be**



- Stopcontacten zonder continuïteit vd aardingspen: wasruimte gelijkvloers. ☐
- Soepele leidingen + vermindering draadsectie: wasruimte gelijkvloers, slaapkamer. ☐
- Blote VOB niet aanwezig in buis: achteraan verdeelbord. ☐
- Schakelaar aanwezig in volume 2 thv douche gelijkvloers.

### Raadgevingen

De eigenaar, de beheerder of de uitbater van de elektrische installatie is ertoe gehouden:

- a) voor het onderhoud ervan of voor het laten uitvoeren van dit onderhoud;
  - b) de nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 te allen tijde worden nageleefd;
  - c) de documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren, ter beschikking het te houden van iedere persoon die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van elke eventuele huurder te stellen;
  - d) het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;
  - e) onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties;
  - f) de verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden;
  - g) een gelijkvormigheidscontrole op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.
- In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt gesteld ter beschikking van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie op de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.

#### De verkoper is er toe gehouden:

- a) het verslag van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie;
- b) het dossier van de installatie aan de koper bij eigendomsoverdracht over te maken;

#### De koper is er toe gehouden:

- a) zijn identiteit en de datum van de verkoopakte mee te delen aan het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd;
  - b) elke volledige renovatie of elke afbraak van het gebouw met of zonder hergebouw mee te delen aan de Algemene Directie Energie « Hoog Toezicht energieinfrastructuur en -producten ». In dit geval, maakt de Algemene Directie Energie een dossiernummer over en ze nodig hem uit om een kopie van het verslag van controle van de elektrische installatie over te maken, zodra de nieuwe elektrische installatie in gebruik wordt genomen;
  - c) de werken, nodig om de tijdens het nieuwe controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, uit te voeren. Ze worden zonder vertraging uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen. Indien tijdens het aanvullende controlebezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven of indien geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de installatie, wordt de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het erkend organisme ingelicht.
- De verkoper en de koper zijn er toe gehouden, onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties.

**ATECON vzw**  
**Prins Boudewijnlaan 41 bus 8**  
**2650 Edegem**  
**Tel: 03/770 75 14**  
**www.atecon.be / info@atecon.be**

**Algemene gegevens :**

Verslag N°: 803955  
Inspecteur: Dewin Jeroen  
Controle volgens Boek 1: 8.4.2.  
Type keuring: Verkoop wooneenheid oude huishoudelijke

Datum keuring: 21/08/2025  
Keuring N°: 202511502  
Aanwezigen: /

**SITUATIESCHEMA**

Handtekening aanvrager:

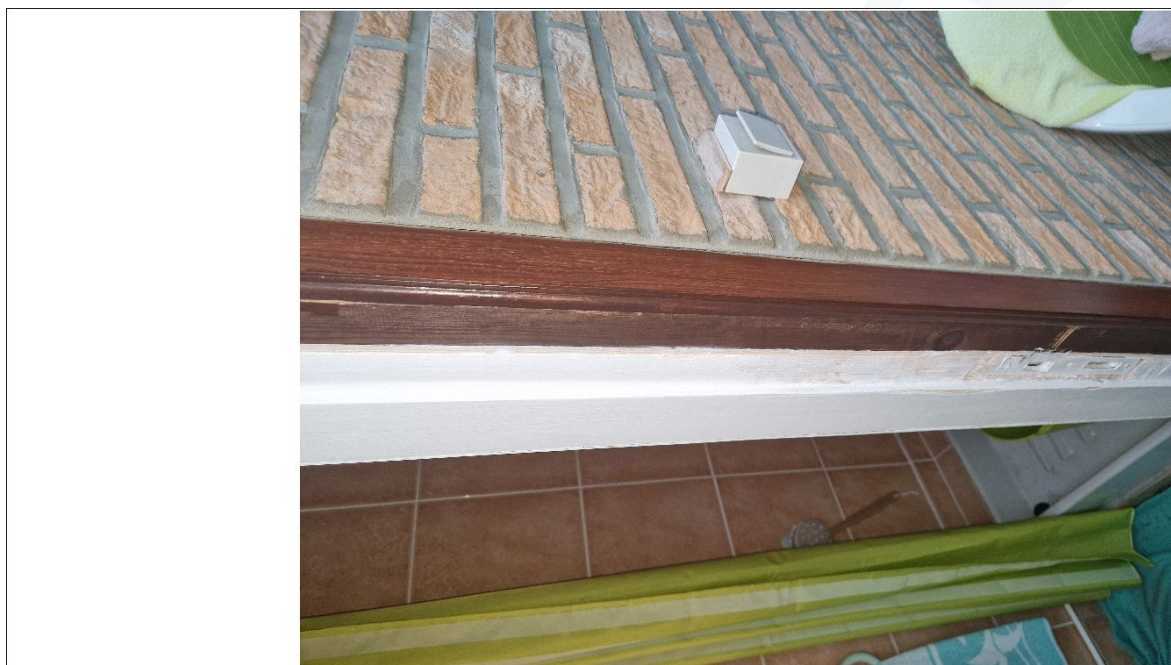
Handtekening inspecteur:

**ATECON vzw**  
**Prins Boudewijnlaan 41 bus 8**  
**2650 Edegem**  
**Tel: 03/770 75 14**  
**www.atecon.be / info@atecon.be**

**Algemene gegevens :**

Verslag N°: 803955  
Inspecteur: Dewin Jeroen  
Controle volgens Boek 1: 8.4.2.  
Type keuring: Verkoop wooneenheid oude huishoudelijke

Datum keuring: 21/08/2025  
Keuring N°: 202511502  
Aanwezigen: /

**SITUATIESCHEMA**

Handtekening aanvrager:

Handtekening inspecteur:

**ATECON vzw**  
**Prins Boudewijnlaan 41 bus 8**  
**2650 Edegem**  
**Tel: 03/770 75 14**  
**www.atecon.be / info@atecon.be**

**Algemene gegevens :**

Verslag N°: 803955  
Inspecteur: Dewin Jeroen  
Controle volgens Boek 1: 8.4.2.  
Type keuring: Verkoop wooneenheid oude huishoudelijke

Datum keuring: 21/08/2025  
Keuring N°: 202511502  
Aanwezigen: /

**SITUATIESCHEMA**

Handtekening aanvrager:

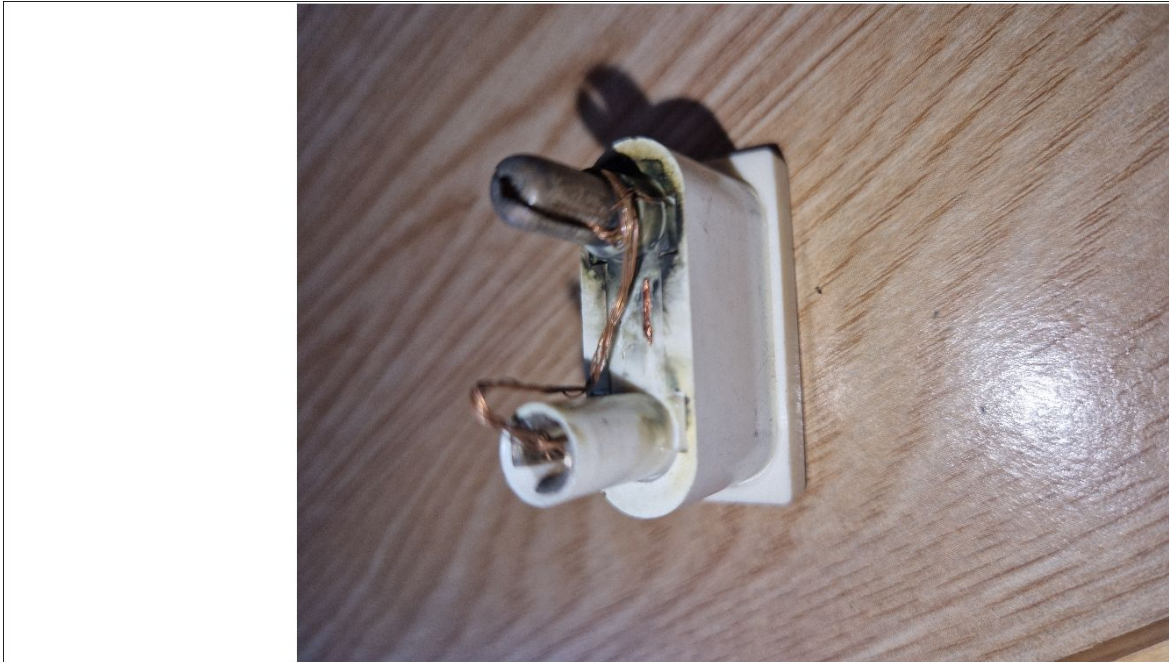
Handtekening inspecteur:

**ATECON vzw**  
**Prins Boudewijnlaan 41 bus 8**  
**2650 Edegem**  
**Tel: 03/770 75 14**  
**www.atecon.be / info@atecon.be**

**Algemene gegevens :**

Verslag N°: 803955  
Inspecteur: Dewin Jeroen  
Controle volgens Boek 1: 8.4.2.  
Type keuring: Verkoop wooneenheid oude huishoudelijke

Datum keuring: 21/08/2025  
Keuring N°: 202511502  
Aanwezigen: /

**SITUATIESCHEMA**

Handtekening aanvrager:

Handtekening inspecteur:

**ATECON vzw**  
**Prins Boudewijnlaan 41 bus 8**  
**2650 Edegem**  
**Tel: 03/770 75 14**  
**www.atecon.be / info@atecon.be**

**Algemene gegevens :**

Verslag N°: 803955  
Inspecteur: Dewin Jeroen  
Controle volgens Boek 1: 8.4.2.  
Type keuring: Verkoop wooneenheid oude huishoudelijke

Datum keuring: 21/08/2025  
Keuring N°: 202511502  
Aanwezigen: /

**SITUATIESCHEMA**

Handtekening aanvrager:

Handtekening inspecteur:
