

Atlas Controle
Boulevard Lambermont 127
1030 Bruxelles

VERSLAG VAN ONDERZOEK: HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Verslag Nr:

41.201

Datum van bezoek:

26-03-2024

Plaats van het onderzoek:

Eduard arsenstraat 154 2640 Mortsel België

Inspecteur:

Hasan Ozdemir

Aard onderzoek:Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname
(Livre 1 6.4)**De datum van opstelling:**

09-05-2024 10:34:04

Volgend controlebezoek:

26-03-2049

Testeur d'installation:

TI-037/6278044

Opdrachtgever

Naam

PEB Certi

Adres

Blaisantvest 105 -, 9000 Gent

Telefoon

+32 2 466 45 66 +32 489 22 26 97

Email

epc.certi@gmail.com

Wetgeving



663 - INSP

AREI. Algemeen Reglement op de elektrische installaties.

Algemene gegevens

Adres van de installatie

Eduard arsenstraat 154 2640 Mortsel België

Appartement aanduiding

2de verdieping (Bus 201)

Gebouw

Appartement 2de verdieping (bus201)

Eigenaar

BOUWDOKTER bvba

Adres van de eigenaar

Eduard arsenstraat 154 2640 Mortsel België

Installateur

BOUWDOKTER bvba

Gegevens verdeler

DNB

Fluvius

Nummer teller

1SAG1200033573

EAN code

541448820046752268

Meter/bord verbinding

XVB 4X10

Net spanning

3 x 400 V + N

Maximum beveiliging

40 A 4P

Atlas Contrôle
Boulevard Lambermont 127
1030 Bruxelles

Onderzoek

Schema's	Equipotentiale verbindingen	Fundamenten	Elektrische installatie
OK	OK	vóór 81	vóór 1981

Beschrijving van de installatie ZIE SCHEMA'S

Aantal verdeelborden	1
Hoofd differentieelschakelaar	300mA - 40A - type A
DK Test van DSR	OK
ΔI_n	OK
Controle van de staat	OK
Opgesteld materieel	OK
Beschermingsinrichtingen tegen directe aanraking	OK
Beschermingsinrichtingen tegen indirecte aanraking	OK
Beschermingsinrichtingen tegen overstroom	OK
Type aardelektrode	Baar
Weerstand aardelektrode (Ω)	15
Isolatiemeting ($M\Omega$)	153,5

Opmerkingen

Enkel de keuken behoort tot nieuw installatie (KRING A EN H)

Afwijkende beschikkingen voor bestaande huishoudelijke elektrische installaties oud AREI waren toegepast (Boek 1 8.2.2)

Besluit

BESLUIT : CONFORM

De door Atlas Contrôle uitgevoerde inspectie was gericht op de zichtbare delen van de installatie die normaal toegankelijk zijn. De elektrische installatie voldoet aan de : eisen van Boek 1 van de AREI (Koninklijk Besluit van 5/03/2023: C-2023/41114) betreffende elektrische installaties met lage en zeer lage spanning. Atlas Contrôle verklaart dat de inspecteur het differentiële stroombeveiligingsapparaat, dat aan het begin van de elektrische installatie is geplaatst, heeft verzegeld en dat hij het (de) ééndraadschema('s) en de plaatsingstekening(en) heeft goedgekeurd. Het volgende controlebezoek moet uiterlijk in 25 jaren worden afgelegd.


Handtekening van de inspecteur



Atlas Controle

Boulevard Lambermont 127

1030 Bruxelles

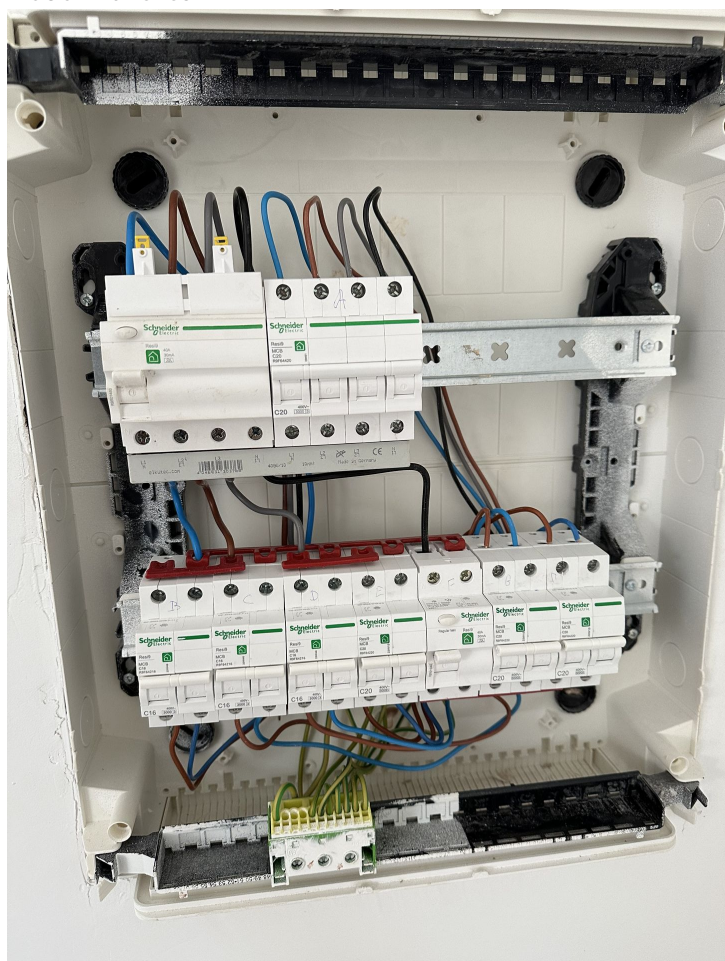

Verdeelbord 1

Opmerkingen lijst

Bewoordingen	Referentie
De schema's van de elektrische installatie moeten in het elektrische installatiedossier bewaard worden. Het wordt ook ten zeerste aanbevolen een kopie van de schema's in de buurt van het hoofdverdeelbord te bewaren.	RDE2
De schema's van de elektrische installatie zijn op het tijdstip van de inspectie aanwezig en werden ter plaatse gecontroleerd. Deze moeten opnieuw worden getoond bij de volgende (her)inspectie.	RDE3
Deze controle is beperkt tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie. Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.	RDE4
Deze inspectie is enkel beperkt tot de delen van de elektrische installatie die op de overeenkomstige (en ondertekende) delen van de schema's aangegeven zijn.	RDE5
De uitgevoerde controle is een onmiddellijke controle op basis van het tijdstip van doorgang. Dit rapport is slechts een weergave van de elektrische installatie op het moment van de controle.	RDE6
De verlichting is nog niet permanent geïnstalleerd.	RDE7
De badkamer is nog niet klaar: bad en/of douche zijn nog niet geïnstalleerd. Bij de definitieve plaatsing van het bad en/of de douche moet rekening worden gehouden met de volumes in de badkamer of de doucheruimte.	RDE8
De keuken (en de toestellen) zijn nog niet geplaatst.	RDE9

Atlas Controle

Boulevard Lambermont 127

1030 Bruxelles

Bewoordingen	Referentie
Niet alle apparaten van klasse I (b.v. wasmachines, droogtrommels, ...) zijn geïnstalleerd ten tijde van de inspectie.	RDE11
De equipotentiaalverbindingen zijn gepland, maar kunnen nog niet worden aangesloten omdat de desbetreffende installaties ontbreken.	RDE37
Verf en/of pleisterwerk op de aardcontacten van wandcontactdozen moeten worden verwijderd voordat de (nieuwe) installatie in gebruik wordt genomen.	RDE43

Bewoordingen	Foto
--------------	------
