

Gewestelijk kantoor
VLAAMS BRABANT
Slabbaertstraat, 18
3210 LUBBEK
Tel: 016 / 63.47.45
Fax: 016 / 63.12.21

GEUKENS ELEKTRO
BEVRIJDINGSSTRAAT 18
3945 HAM

O/Ref. :
U/Ref. : HHlgeukens206
Tel. : 011 / 34.33.27.
Fax. :
Verslagnr. : 4603102123

Handwritten signature and date: 31/10/03

VERSLAG VAN HET ONDERZOEK VAN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIES

Gelijkvormigheidonderzoek A.R.E.I. art.270

- Datum van het onderzoek : 21/10/2003
- Plaats van het onderzoek : Englebert Adanglaan lot 1-7, 3970 Leopoldsburg
- Opdrachtgever : Bouwgroep Concept NV, Heppensesteenweg 12 A, 3945 Ham
- Eigenaar van het gebouw : idem
- Gebruiker v.d. installatie :
- Installateur : Geukens Elektro, Ham
- Stroomleverende maatschappij : Interelektra
- Aanwezige personen : Mr. Geukens

1.- ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN

- Aard van de lokalen : HHI : appartement *AA*
- Aantal verdeelborden : 1
- Aantal eindstroombanen : 16
- Type van de aardelectrode : lus
- Fundering voor na 01.10.1981 : na
- Spanning : 220 V
- Stroom : 40 A max.
- Differentieel : 40A/300mA
- Voeding : 4 x 10 mm²

- Reglementen en voorschriften van toepassing: A

A.- Algemeen Reglement voor Elektrische Installaties A.R.E.I.

B.- Algemeen Reglement v.d. Arbeidsbescherming A.R.A.B.

C.- Technisch Reglement T.R.

D.- Voorschriften van de stroomleverende maatschappij

E.- Bijzondere voorschriften voor :

2.- HET ONDERZOEK HEEFT ONDER ANDERE BETREKKING OP :

- Algemene toestand van de elektrische installatie;
- Conformiteit met de onder punt 2 vermelde reglementen ;
- Bescherming tegen rechtstreekse aanraking ;
- Bescherming tegen onrechtstreekse aanraking ;
- Bescherming tegen kortsluiting en overstroom.



Verslag nummer: 4603102123

2./..2

3.- MEETRESULTATEN

- a.- Verspreidingsweerstand van de aardinrichting : 6.5 Ohm
- b.- Algemeen isolatie niveau van de installatie : 100 MOhm
- c.- Isolatie niveau per stroombaan : /
- d.- Werking van de differentieelstroomschakelaars : o.k.

4.- VASTSTELLINGEN EN NOTA'S

4.1.- Vaststellingen:

Geen

4.2.- Nota's

De badkamer, de c.v., de sanitaire installatie, de keuken en de verlichting zijn nog niet geplaatst en aangesloten.

5.- BESLUIT. Alleen de hierna vermelde tekst van punt A is geldig


- A.- De installatie is conform de onder punt 2 vermelde voorschriften en mag in dienst gesteld worden -blijven. De ADS werd verzegeld en de ééndraad - en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 21/10/2028 conform de voorschriften van artikel 271 van het A.R.E.I. alsook voor de in gebruik name van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding voor deze datum.
- B.- Nadat er gevolg gegeven is aan de onder punt 4 vermelde opmerkingen mag de installatie in dienst blijven. De wijzigingen dienen zonder vertraging uitgevoerd.
- C.- De installatie is niet conform en mag niet in dienst blijven of in dienst gesteld worden.

6.- MEDEDELINGEN

- 1.- Betekenis van de nota's: betreffen gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader van het onderzoek vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens.
- 2.- Kopieën: Dit verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden.
- 3.- Uitbesteding: Uitbestede objecten / keuringsmethoden, gekenmerkt met (*), zijn uitgevoerd:
(naam van de onderaannemers)

De agentonderzoeker
nr.46
VAES PETER

vr. De Directeur
E Verheyden

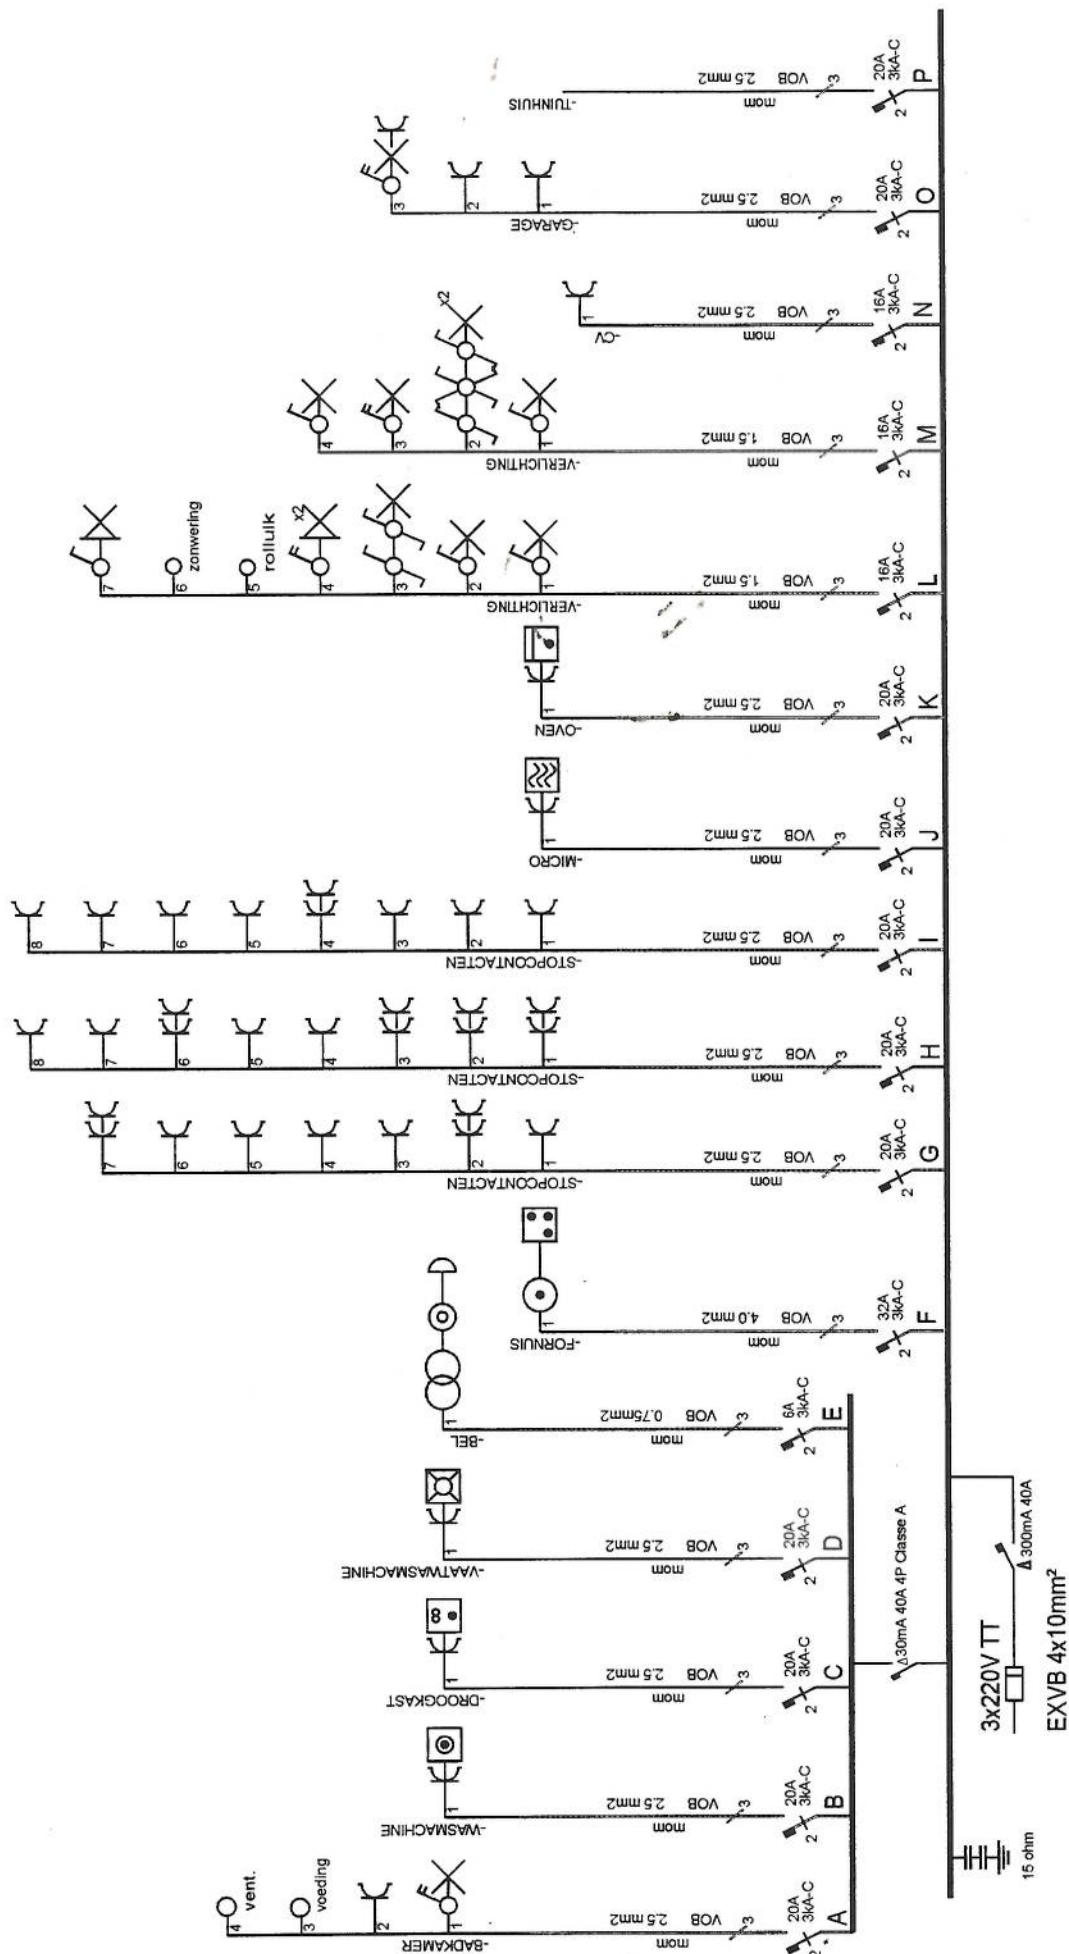

Afgev. erkend organisme

.. / .. / 2004

Klant

BOONS
E. ADANGLAAN
LEOPOLDSBURG

Verantw. uitvoering

.. / .. / 2004

De installateur

ELECTRO GEUKENS N.V.

BEVRIJDSSTRAAT 18

3945 HAM

Tel. 011 34 33 27

Fax 011 34 73 45

BTW 422 483 302

