

**VINÇOTTE vzw**

Erkend Controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW: BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Verslag nr.: P01592930/2

☒ Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent
☐ Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde
☐ Noordersingel 23, 2140 Antwerpen
☐ Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux

Tel: +32 9 244 77 11
Tel: +32 2 674 57 11
Tel: +32 3 221 86 11
Tel: +32 81 432 611

gent@vincotte.be
brussels@vincotte.be
antwerpen@vincotte.be
gembloux@vincotte.be

N **204481**Resi code: 71R**PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

Verantwoordelijke voor de werken :	Installatie :	Eigenaar of beheerder :
Naam, voornaam : <u>WEYERS ELEKTRO</u>	Naam, voornaam : <u>WELLEN</u>	Naam, voornaam : <u>WELLEN</u>
Ident. Kaart nr. : <u>526 948 045</u>	Adres : <u>KAPHAANLEI 117</u>	Adres : <u>ZELFDE ADRES</u>
BTW nr.: BE <u>526 948 045</u>	Post nr. + Stad : <u>2640 MORTSEL</u>	Post nr. + Stad : <u>2640 MORTSEL</u>
	Tel. : <u>1</u>	Tel. : <u>1</u>

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)			
☒ Art 270	☐ ingebruikname ☒ wijziging ☐ uitbreiding	☒ Art 86	☒ Art 271 bis
☐ Art 271	☐ mobiel ☐ tijdelijk	☐ Art 87	☒ Art 278
☒ Art 276	☐ periodiek ☒ controle ☐	☐ Art 88	☐ Art
☐ Art 276 bis	☐ verkoop van een wooneenheid	☐ Art ...	☐ Art
		☒ Wooneenheid	☒ Huishoudelijke werkeenheid
		☒ Gemeenschappelijke delen	☒ Werkeenheid

Algemene gegevens elektrische installatie :	
Gegevens verdeler	EAN ☐ EAN niet meegedeeld ☒ kWh meter niet geplaatst ☐
Gegevens installatie	kWh meter nr.: <u>40314 962</u> meterstand dag : <u>81925</u> nacht : <u>62565</u> Bescherming aansluiting (A) : ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐
Beschrijving installatie	Ontworpen voor U _N : ☐ 230 V ☒ 3x230 V ☐ 3N400 V ☐
	Maximale nominale stroom (A) : ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐
	Voedingsleiding hoofdbord : ☐ X ☐ mm ² - Type : <u>bestaand</u>
	Algemene differentieelstroominrichting : <u>40</u> A / <u>300</u> mA Aantal borden : <u>2</u> Aantal eindstroombanen : <u>12+1</u>
☒ zie bijlage(n)	


Metingen - testen - controles - verzegeling :	
☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking
☒ Montage	☐ Toestellen
☒ Materieel	☒ I-/doorsnede
☒ Schema's	☒ Aardingsweerstand : <u>2.9</u> Ω
☒ Algemeen isolatieniveau : <u>0.1</u> MΩ	☒ Controle foutlus
☒ Aardingscontinuïteit	☒ Test diff.
Differentieelstroominrichting : ☐ was verzegeld ☒ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden	

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)	
Inbreuken Nieuwe installatie	<u>Geen</u>
☐ Nihil	
Inbreuken Bestaande installatie	<u>Geen</u>
☐ Nihil	
Opmerkingen	<u>Geen</u>
☐ Nihil	
Visum DNB of aangestelde :	


Besluit(en) :	
☒ De nieuwe installatie	☒ voldoet ☐ voldoet niet ☐ aan het AREI.
☐ De bestaande installatie	☒ voldoet ☐ voldoet niet ☐ aan het AREI.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór <u>21.2.2018</u>	
☐ door hetzelfde erkend organisme (*).	

Agent bezoeker :	
Naam : <u>VAN EYNDE K.</u>	Agent nr. : <u>1519</u> Datum : <u>2 / 2 / 2018</u>
Bijlage(n) : ☒ Situatieschema(s) : <u>2</u>	☒ Eéndraadsschema(s) : <u>2</u> ☐


- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
- Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
- (*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

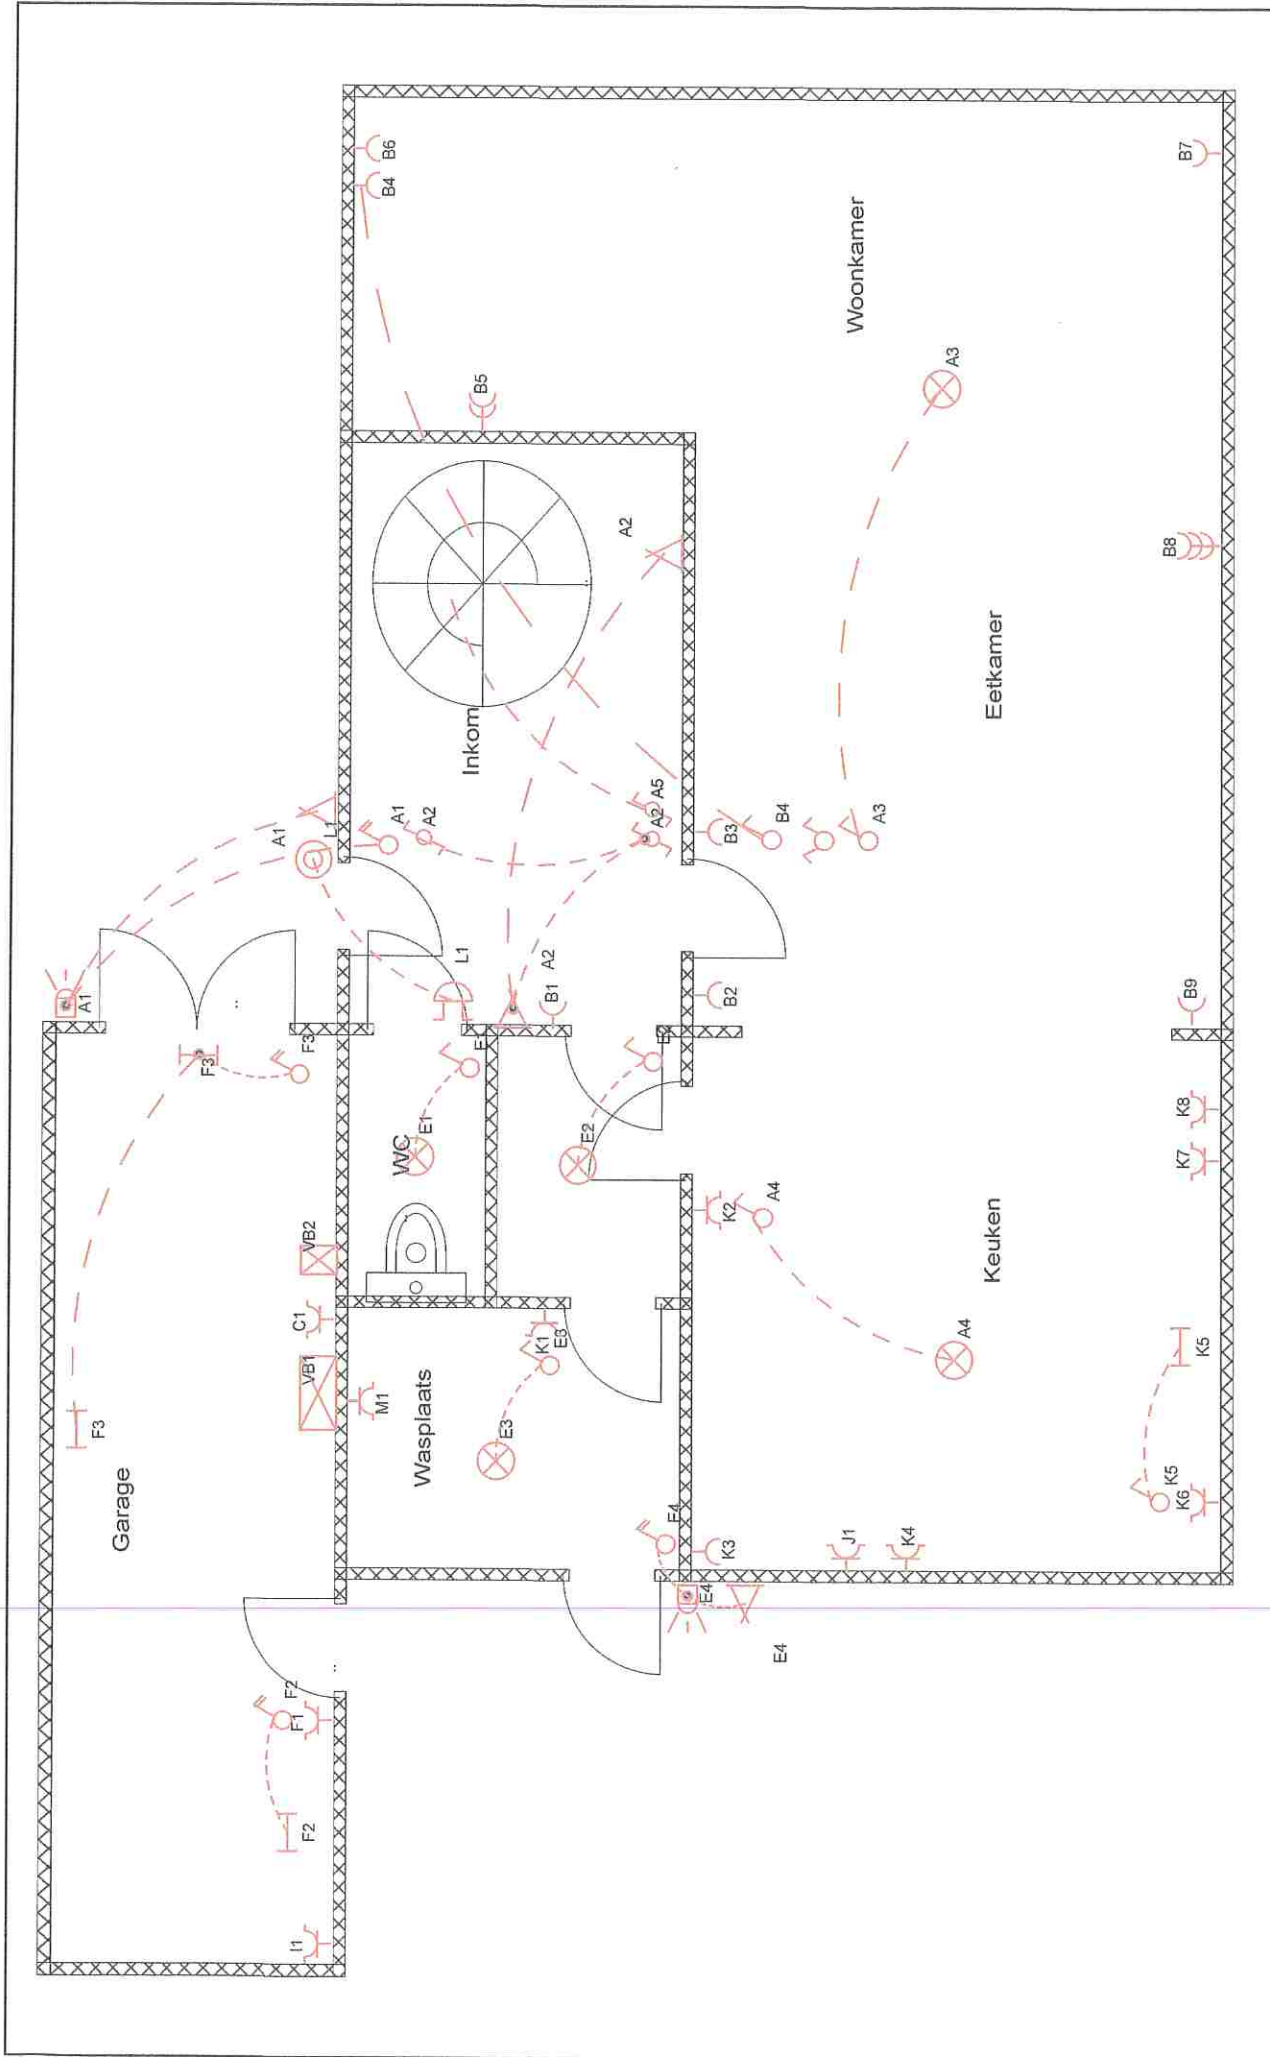

INSTALLATEUR		KEURING		WERF		Gelijkvloers	3N, 400V/230V~
Naam	Weyers Elektro	ORGANIS.	Vincotte	 VINÇOTTE vzw Koen Vanevnde 02/02/2018	 VINÇOTTE 1519	Wellens Kaphaandei 117 2640 Mortsel	 0473 46 31 42 Algemeen elektriciteitswerken Algemeen elektriciteitswerken Videofoon en parafonnie
BTW	BE0526.948.045	Naam	Vanevnde Koen				
Datum	30/01/2018	Datum	02/02/2018				
Handtek		Handtek		Handtek	Handtek		

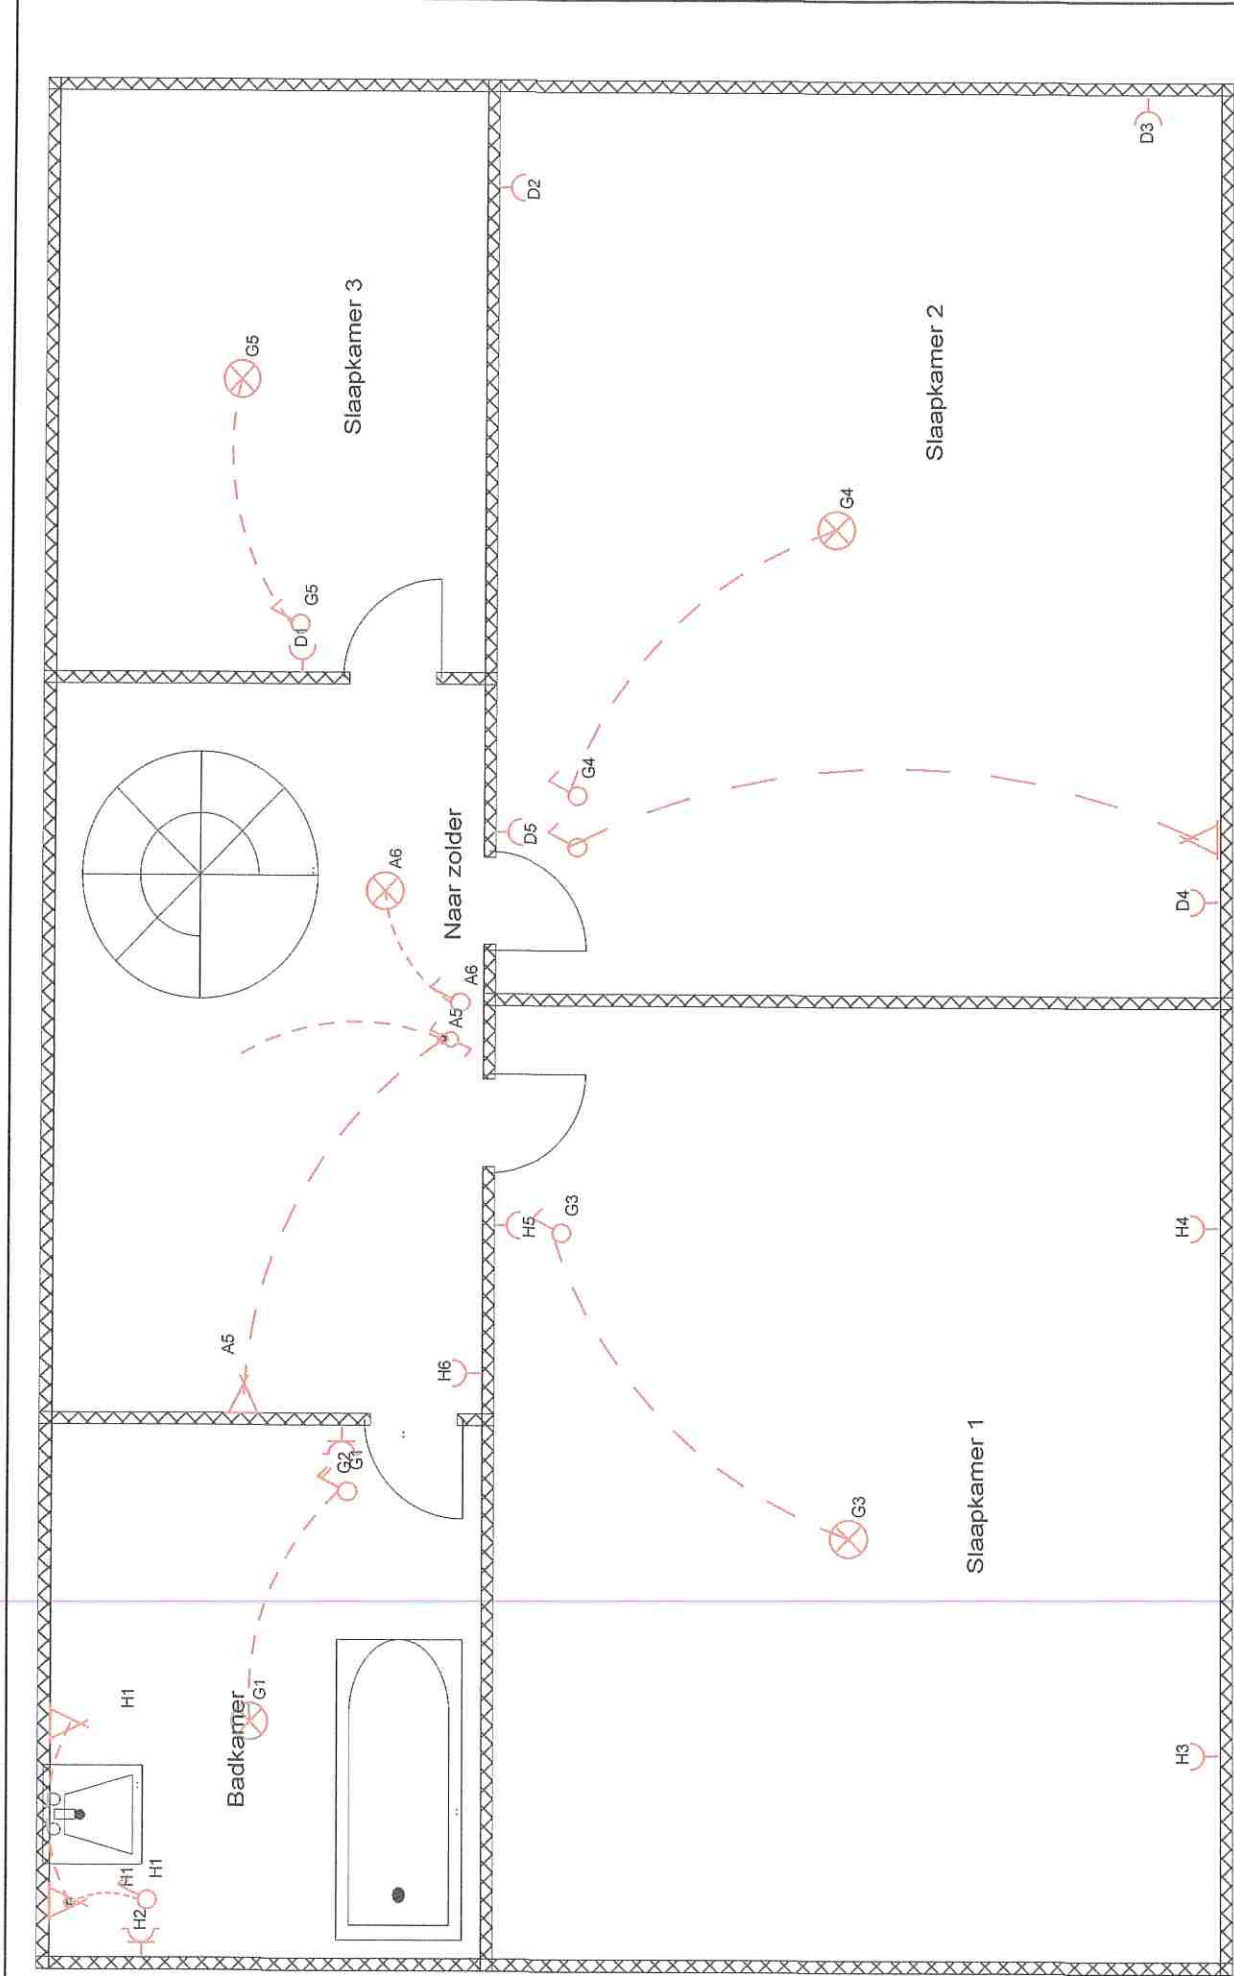

INSTALLATEUR		KEURING		WERF		Verdieping	3N, 400V/230V~	
Naam	Weyers Elektro	ORGANIS	Vincotte	Naam	Wellens		WEYERS ELEKTRO	0473 46 31 42 Algemene elektriciteitswerken Vereniging a.d. Borden Videofoon en portafone
BTW	BE0526.948.045	Naam	Vancotte Koen	Straat	Kaphaantlei 117			
Datum	30/01/2018	Datum	02/02/2018	Gemeen	2640 Mortsel			
Handtek		Handtek	..	Handtek	..			



Bevestigingspunt

INSTALLATEUR		KEURING		WERF		Verdeelbord Uitsluitend Naacht	
Naam	Weyers Elektro	ORGANIS.	Vincotte	Naam	Wellens	3N, 400V/230V~	
BTW	BE0526 945 045	Naam	Vincotte Koen	Straat	Kaplaanlei 117	 0473 46 31 42 Algemene elektriciteitswerken Verlichting - Domotica Videofoon en parkeerfiche	
Datum	30/01/2018	Datum	02/02/2018	Genoemd	2640 Molsel		
Handtekening		Handtekening		Handtekening			
