

Klantverantw.:  
Opdrachtnr.:  
Klantnr.: 26535  
Cont.pers.:  
Tel.: -  
Fax: -  
GSM: -  
e-mail: ocb@monolith.be

ProKo.: LS01  
Verslagnr.: 6187953  
Voorl. verslagnr.:  
Datum: 03/04/2024



OCB vzw  
Member of OCB Group

Klant / Opdrachtgever:

MONOLITH TECHNOLOGIES  
HULSHOUTSESTEENWEG 35  
2220 HEIST OP DEN BERG

Afdeling: ELE

**VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS**  
**(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie**  
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

**IDENTIFICATIE**

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 Agent-bezoeker: 617 VANDEGHINSTE WOUTER  
Eigenaar/beheerder/uitbater: Naam: GEUKENS Adres: EDEGEMSESTRAAT 185/1 2640 MORTSEL  
Installateur/verantw. werk: Naam: MONOLITH TECHNOLOGIES Adres: HULSHOUTSESTEENWEG 35 2220 HEIST OP DEN BERG B.T.W.: BE0474253091  
Adres installatie: EDEGEMSESTRAAT 185/1 MORTSEL 2640 Private HS-cabine: NEE  
Type installatie: appartement Toestel/Install. ID: EDEGEMSESTRAAT 185/1 LS01 20240403  
EAN nr.: NIET GEKEND Netbeheerder: Fluvius Teller nr.: 3677752 Nachtteller nr.: /

**CONTROLE**

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.  
Type: gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname nieuwe installatie (hfst.6.4)

Installatiedatum: ☐ vóór 01/10/1981 ☐ tussen 01/10/1981 en 01/06/2020 ☐ tussen 01/06/2020 en 01/06/2023 ☒ vanaf 01/06/2023

Afwijkingen: deel 8 Boek 1 : nvt en punt 1 van onderafdeling 6.5.8.1: niet toegepast

Datum: 03/04/2024

Volgende controle binnen 300 maand of uiterlijk vóór 30/04/2049

Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.  
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

**INSTALLATIE**

Spanning: aanwezig Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: geplaatst Isolatieplaat: aanwezig  
Nom. spanning: 1 x 240V Max. beveiliging: 63A Hoofdbeveiliging: aut. 2p 20A Alg. scheidingsschak.: alg.diff.schakelaar  
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm<sup>2</sup>  
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm<sup>2</sup>  
Aardverbinding: aard: gemeenschappelijk bereikbaarheid: in orde - gemeenschap. aardonderbreker is bereikbaar  
Aardelektrode: type: pen sectie: 16 mm<sup>2</sup>  
Diff. schakelaar: algemene: 2p 63A/30mA bijkomende: 3 x 2p 63A/30mA  
Eéndraadschema en situatieplan: zie bijlage referentie:  
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: in orde Staat vast of - opgesteld materieel: in orde  
Aanwezige bijzondere installaties: ☐ PV ☐ zwembad ☐ sauna ☐ voeding elektrisch voertuig ☐ -  
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ verlichting ☐ -  
☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding  
Aantal borden: 2 Aantal eindstroombanen, incl reserve: 4 + 13

**RESULTATEN**

Algemene isolatieweerstand: 0,56 MOhm Spreidingsweerstand: 15,35 Ohm  
Testknop diff.schak.: in orde Controle foutlus: in orde Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde  
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde  
Bescherming tegen overschroom: in orde Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I: in orde

**FASTSTELLINGEN** - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N | geen

I | geen

**BESLUIT**

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.

De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle.

De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.


Voor de Technisch Directeur,




Ir. G. Croes

**RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN**


Lees de reglementaire voorschriften via deze link: [https://www.ocb.be/documenten/2020/informatienota\\_reglementaire\\_voorschriften.pdf](https://www.ocb.be/documenten/2020/informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf)

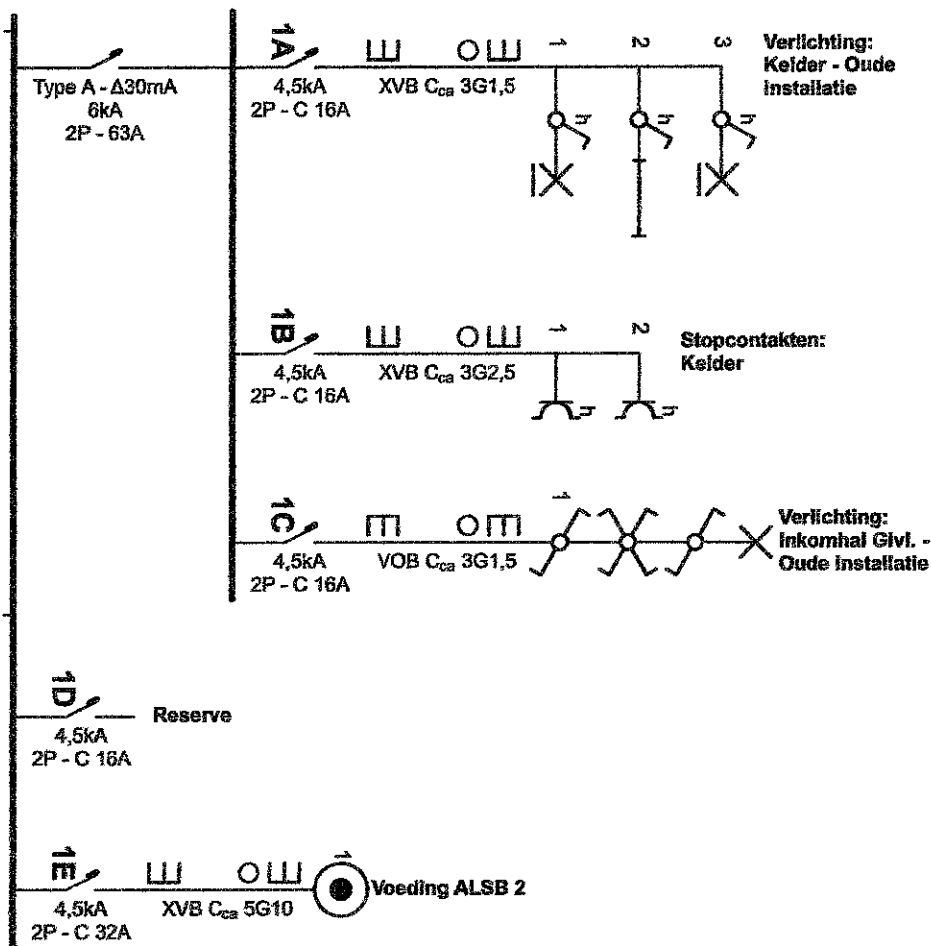

ALSB 1

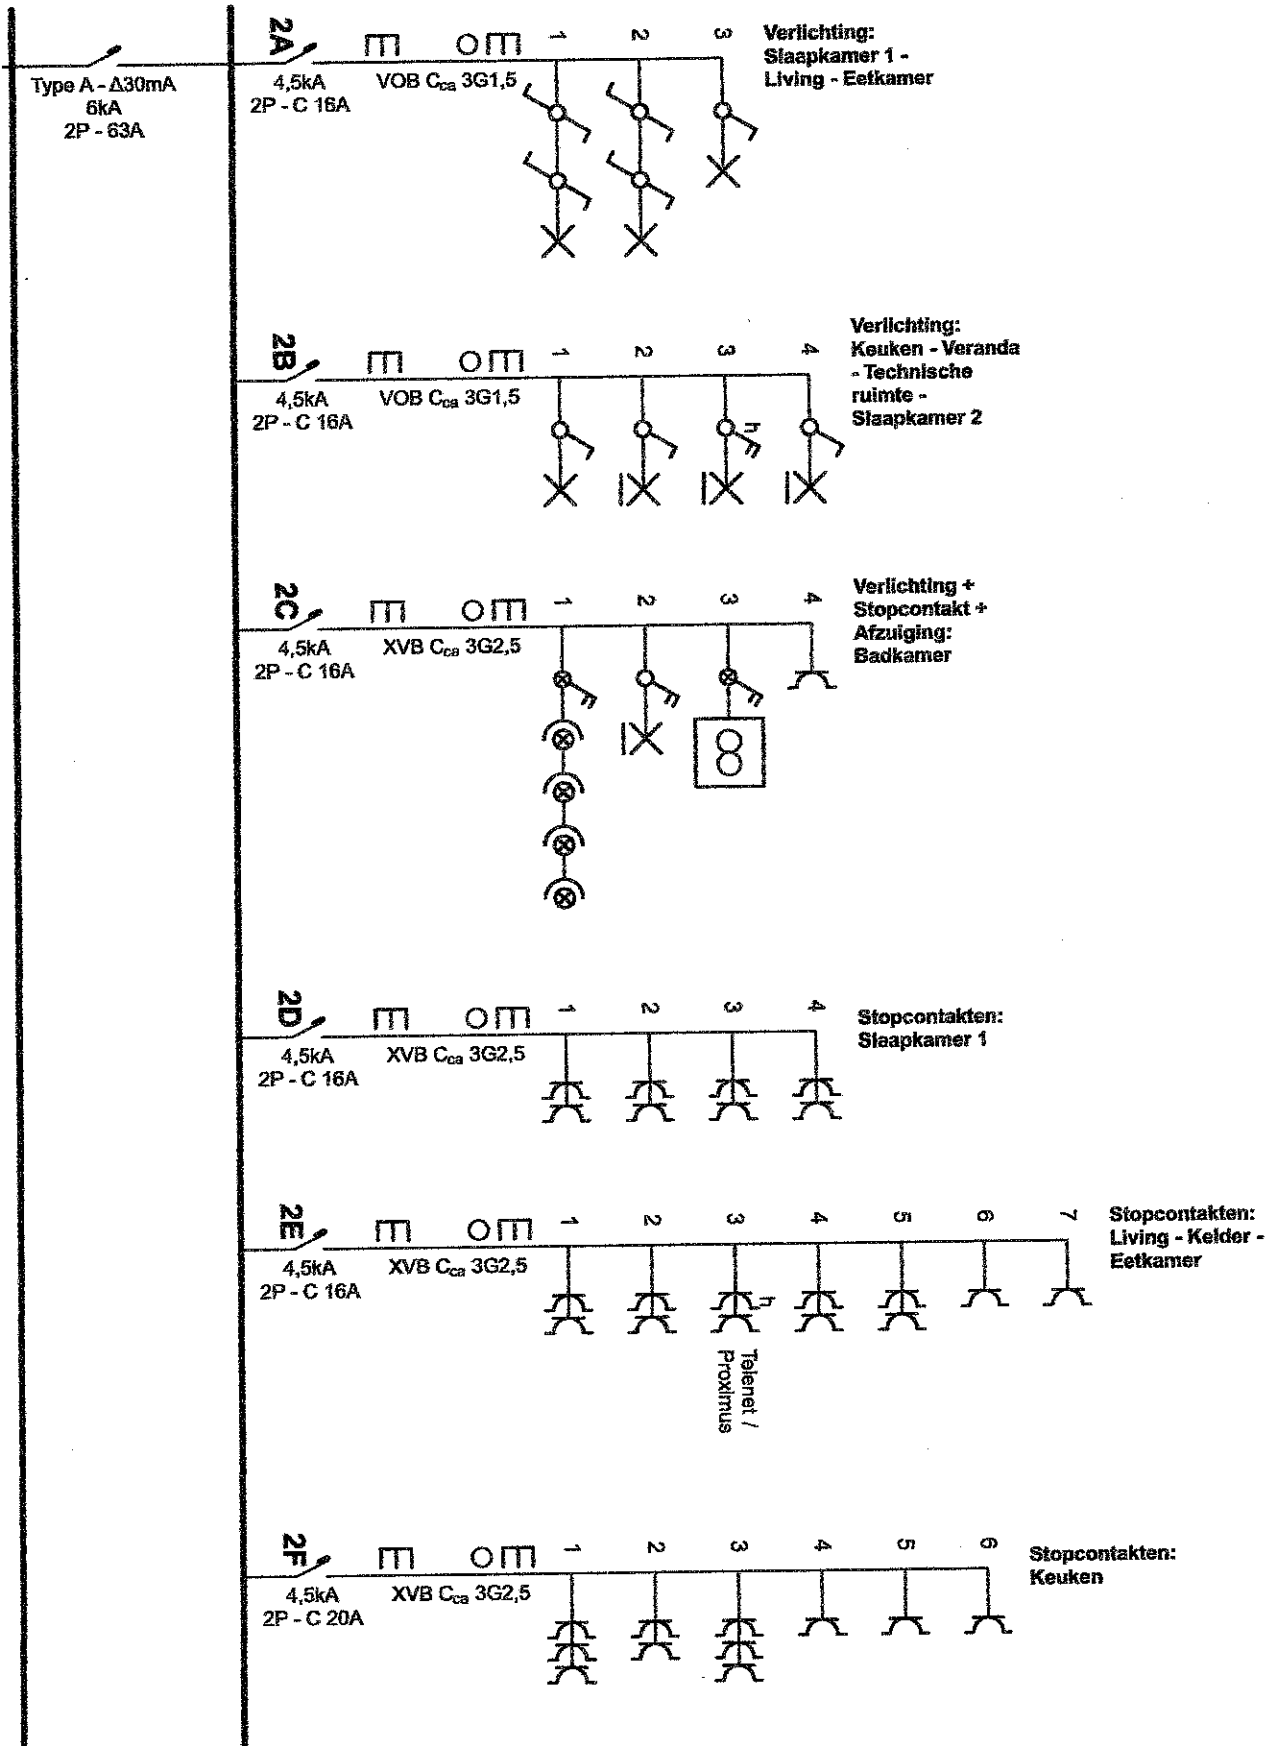


# Gelijkvloers

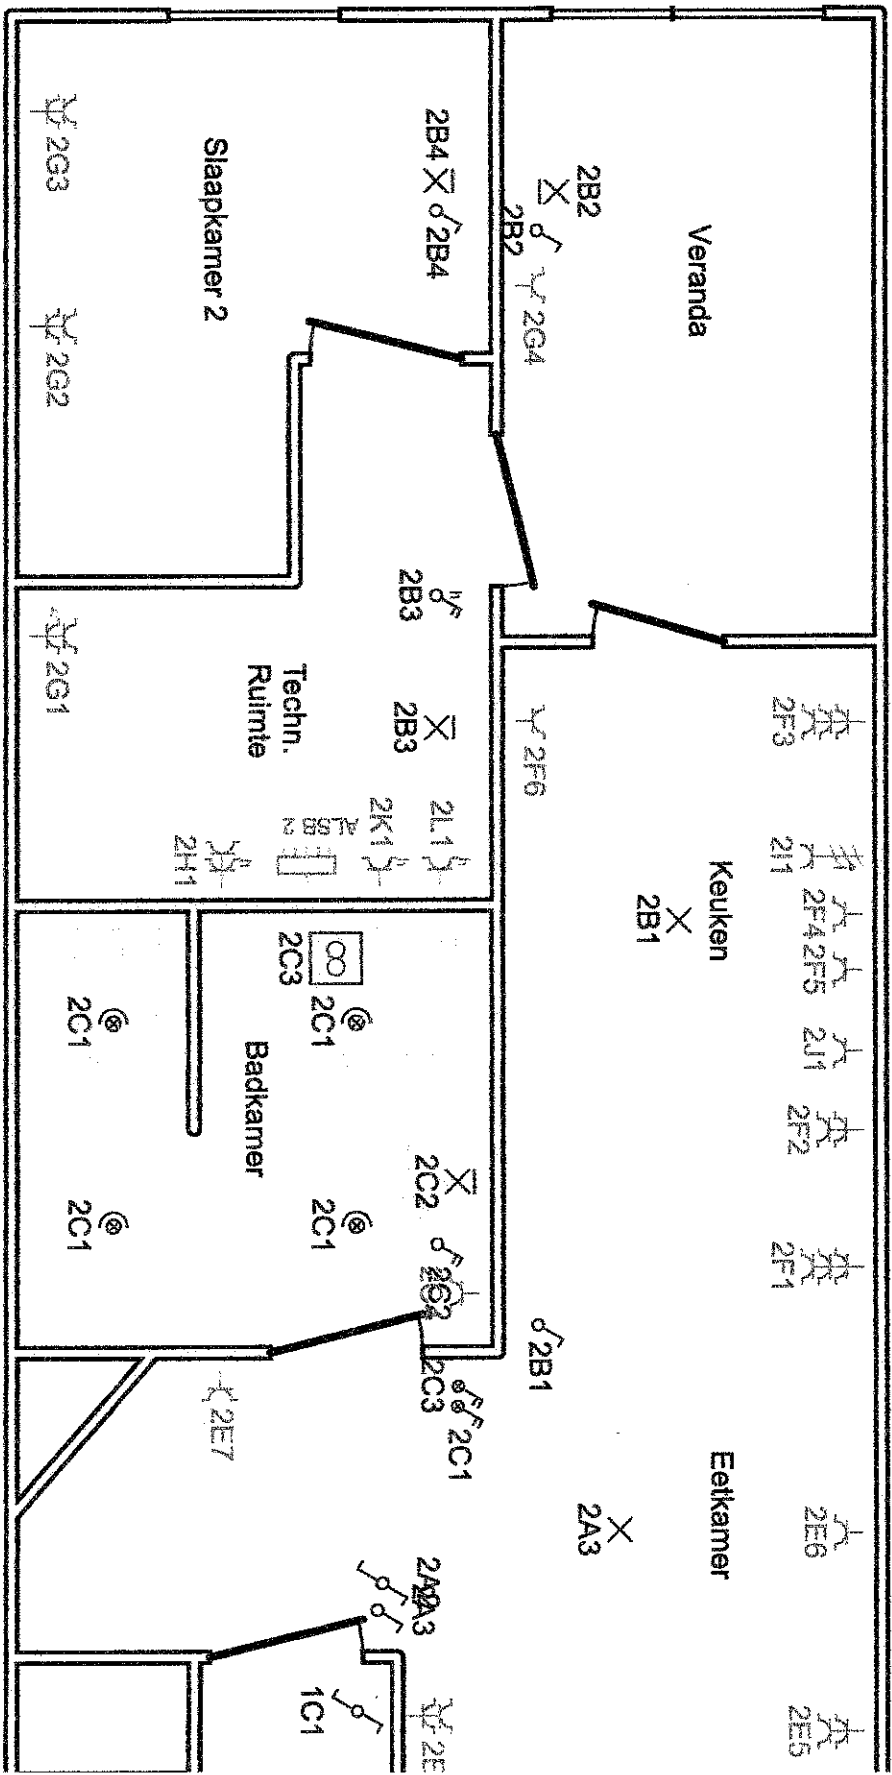


Tuin :



2M1

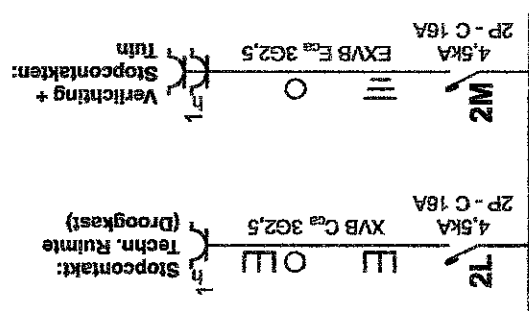

# Kelder

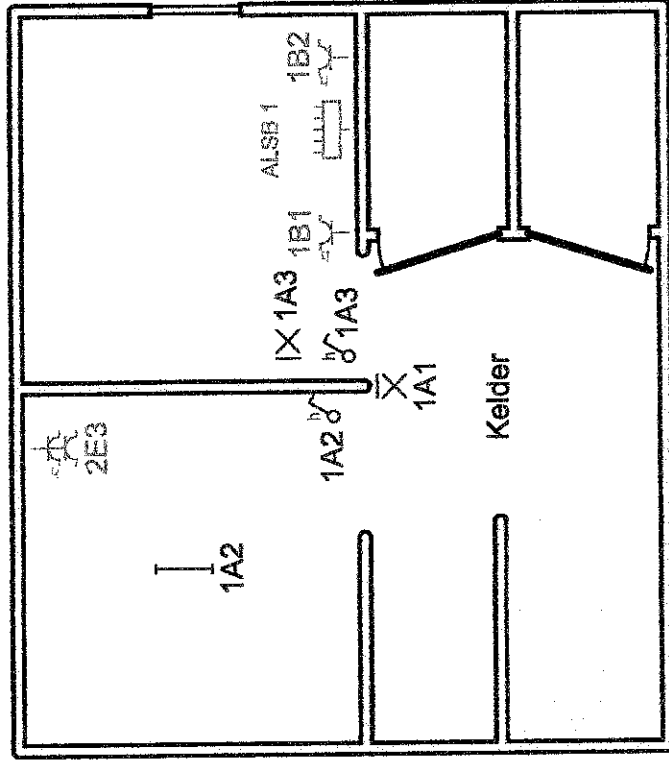

- 1A** Verlichting: Kelder - Oude installatie
- 1B** Stopcontacten: Kelder
- 1C** Verlichting: Inkonhal Gvl. - Oude installatie
- 1D** Reserve
- 1E** Voeding ALSB 2
- 2A** Verlichting: Slaapkamer 1 - Living - Eetkamer
- 2B** Verlichting: Keuken - Veranda - Technische ruimte - Slaapkamer 2
- 2C** Verlichting + Stopcontact + Afzuiging: Badkamer
- 2D** Stopcontacten: Slaapkamer 1
- 2E** Stopcontacten: Living - Kelder - Eetkamer
- 2F** Stopcontacten: Keuken
- 2G** Stopcontacten: Technische ruimte - Slaapkamer 2 - Veranda
- 2H** Stopcontacten: Technische ruimte (C.V.)
- 2I** Keuken - Kookvuur
- 2J** Stopcontact: Keuken (vaatwasser)
- 2K** Stopcontact: Techn. Ruimte (Wasmachine)
- 2L** Stopcontact: Techn. Ruimte (Droogkast)
- 2M** Verlichting + Stopcontacten: Tuin
